
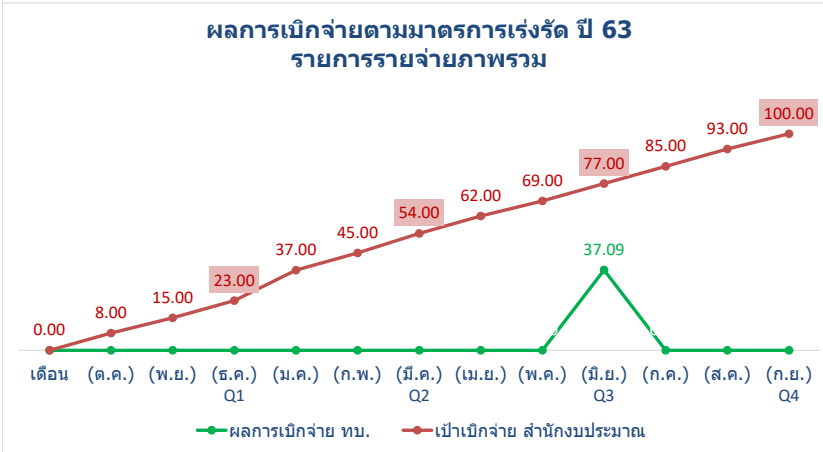
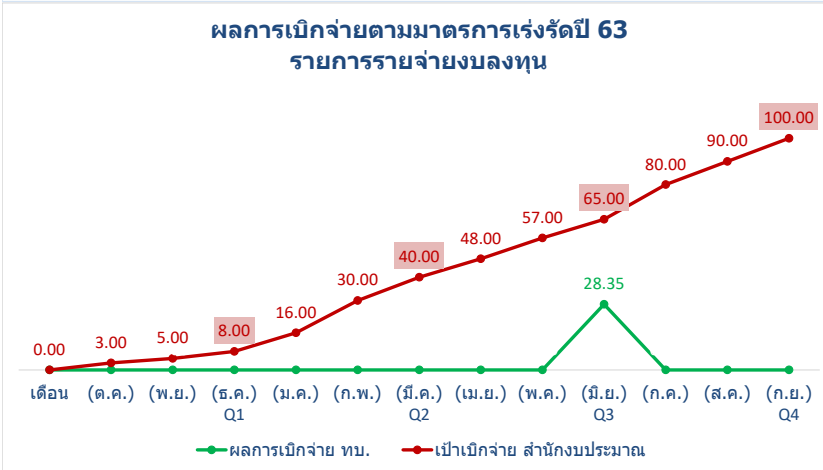
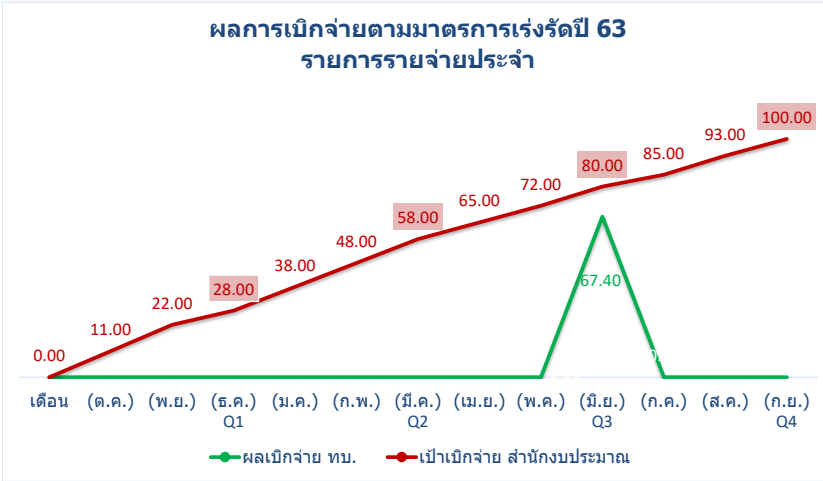


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนบ

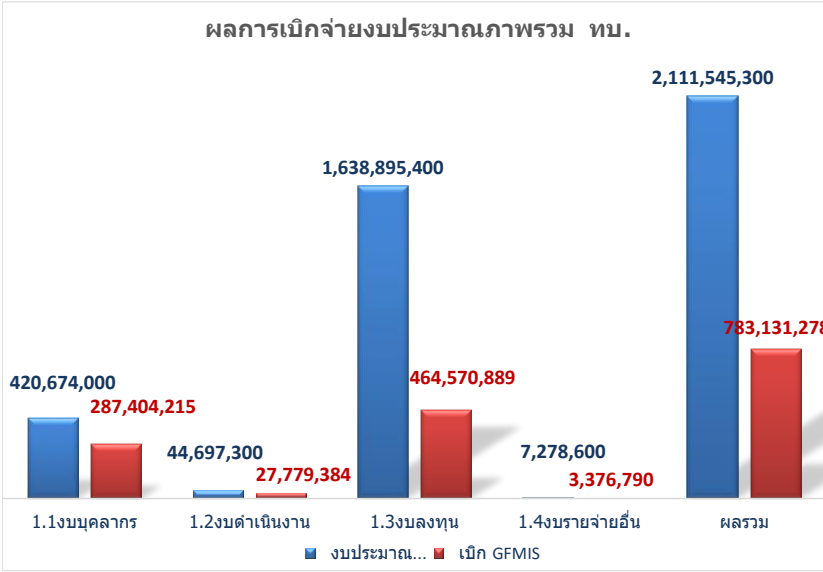

ณ 08 มิ.ย. 63						
1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิก GFMIS	% GFMIS	PO	รวมเบิก	% รวมเบิก
1.1งบบุคลากร	420,674,000	287,404,215	68.32	0	287,404,215	68.32
1.2งบดำเนินงาน	44,697,300	27,779,384	62.15	7,016,628	34,796,011	77.85
1.3งบลงทุน	1,638,895,400	464,570,889	28.35	938,495,956	1,403,066,845	85.61
1.4งบรายจ่ายอื่น	7,278,600	3,376,790	46.39	1,031,750	4,408,540	60.57
ผลรวม	2,111,545,300	783,131,278	37.09	946,544,334	1,729,675,612	81.92
2.แผนงานบุคลากรภาครัฐ (Function)	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิก GFMIS	% GFMIS	PO	รวมเบิก	% รวมเบิก
2.1งบบุคลากร	420,674,000	287,404,215	68.32	0	287,404,215	68.32
2.2งบดำเนินงาน	5,787,400	3,544,532	61.25	0	3,544,532	61.25
รวมเบิกจ่ายงบแผนงานบุคลากรภาครัฐ	426,461,400	290,948,747	68.22	0	290,948,747	68.22
3.แผนงานพื้นฐานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิก GFMIS	% GFMIS	PO	รวมเบิก	% รวมเบิก
3.1งบดำเนินงาน	38,909,900	24,234,851	62.28	7,016,628	31,251,479	80.32
3.2ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบลงทุน)	6,330,000	6,330,000	100.00	0	6,330,000	100.00
3.3ครุภัณฑ์สำรวจ (งบลงทุน)	117,750,020	32,995,470	28.02	84,754,550	117,750,020	100.00
3.4ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (งบลงทุน)	87,500	87,500	100.00	0	87,500	100.00
3.5ครุภัณฑ์สำนักงาน (เงินเหลือจ่าย) (งบลงทุน)	523,419	0	0.00	0	0	0.00
3.6ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง (งบลงทุน)	9,940,000	1,491,000	15.00	8,449,000	9,940,000	100.00
3.7ค่าปรับปรุงอาคาร สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง (งบลงทุน)	416,000	416,000	100.00	0	416,000	100.00
3.8ค่าก่อสร้างรั้วสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง (งบลงทุน)	1,899,000	284,850	15.00	1,614,150	1,899,000	100.00
3.9ค่าจัดทำระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (บางเขน) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ (งบลงทุน)	6,668,561	6,668,561	100.00	0	6,668,561	100.00
3.10จ้างปรับปรุงอาคารจอดรถเพื่อเก็บพัสดุตัวอย่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เงินเหลือจ่าย) (งบลงทุน)	380,000	0	0.00	0	0	0.00
3.11ปรับปรุงชุมเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส และประดับผ้า ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ จำนวน 12 รายการ (เงินเหลือจ่าย) (งบลงทุน)	300,000	0	0.00	0	0	0.00
3.9ค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300 ราย (งบรายจ่ายอื่น)	0	0	0	0	0	0
3.10การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด 19	2,778,600	1,566,162	56.37	0	1,566,162	56.37
3.11ค่าใช้จ่ายในการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 32,500 บ่อ (งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)	17,030,100	5,795,808	34.03	1,760,828	7,556,636	44.37
3.12ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการด้านน้ำบาดาล จำนวน 1 ระบบ (งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)	4,175,000	2,505,000	60.00	1,670,000	4,175,000	100.00
3.13ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล จำนวน 900 บ่อ (งบรายจ่ายอื่น)	4,458,820	1,810,628	40.61	1,031,750	2,842,378	63.75
3.14ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (งบรายจ่ายอื่น)	41,180	0	0.00	0	0	0.00
รวมเบิกจ่ายงบแผนงานพื้นฐาน	211,688,100	84,185,830	39.77	106,296,906	190,482,736	89.98
4.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิก GFMIS	% GFMIS	PO	รวมเบิก	% รวมเบิก
4.1โครงการจัดซื้อเครื่องจักรชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ระดับต้นพร้อมอุปกรณ์ (งบลงทุน)	82,410,000	26,360,640	31.99	56,016,360	82,377,000	99.96
รวมเบิกจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์	82,410,000	26,360,640	31.99	56,016,360	82,377,000	99.96
5.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิก GFMIS	% GFMIS	PO	รวมเบิก	% รวมเบิก
5.1การพัฒนา น้ำบาดาลระดับลึกเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลกร่อยเค็ม รวม 25 แห่ง (งบลงทุน)	24,912,500	16,733,473	67.17	169,390	16,902,863	67.85
5.2.โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (งบลงทุน)	1,069,290,000	281,373,948	26.31	701,023,958	982,397,905	91.87
5.2.1จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า รวม 352 แห่ง (งบลงทุน)	116,336,000	85,064,014	73.12	2,437,964	87,501,978	75.21
5.2.2จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 261 แห่ง (งบลงทุน)	521,622,650	102,766,024	19.70	374,418,260	477,184,285	91.48
5.2.3ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 100 ไร่ รวม 7 แห่ง (งบลงทุน)	5,484,090	4,639,458	84.60	0	4,639,458	84.60
5.2.4ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 62 แห่ง (งบลงทุน)	75,647,102	0	0.00	75,647,102	75,647,102	100.00
5.2.5พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวม 7 พื้นที่ (งบลงทุน)	154,228,900	42,979,083	27.87	104,478,590	147,457,673	95.61
5.2.6พัฒนาน้ำบาดาลชุมชนเพื่อการเกษตรยั่งยืนนอกเขตชลประทาน รวม 104 แห่ง (งบลงทุน)	195,971,258	45,925,369	23.43	144,042,042	189,967,410	96.94
5.3โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวน 12 สถานี (งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)	30,003,100	10,367,920	34.56	2,433,868	12,801,788	42.67
5.4โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับต้น รวม 530 แห่ง (งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)	46,007,000	8,676,385	18.86	15,855,290	24,531,675	53.32
5.5โครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ จำนวน 54 อำเภอ (งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)	112,185,700	34,761,327	30.99	8,663,080	43,424,407	38.71
5.6โครงการบริหารจัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 ระบบ (งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)	57,700,000	20,603,763	35.71	33,310,967	53,914,730	93.44
รวมเบิกจ่ายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,340,098,300	372,516,816	27.80	761,456,553	1,133,973,369	84.62
6.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	งบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	เบิก GFMIS	% GFMIS	PO	รวมเบิก	% รวมเบิก
6.1โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)	50,887,500	9,119,244	17.92	22,774,515	31,893,759	62.68
รวมเบิกจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	50,887,500	9,119,244	17.92	22,774,515	31,893,759	62.68
