



รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน
จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)



โดย
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กลุ่มวิศวกรน้ำบาดาล



รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่
ประสพภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)
พื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี, เขต ๓ สระบุรี,
เขต ๗ กำแพงเพชร, เขต ๘ ราชบุรี และ เขต ๙ ระยอง
จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง (ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง และ
ในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๗๓๕ แห่ง)
งบประมาณ ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐ (บาท)



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) รูปแบบที่ ๒
จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง

- ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

- วงเงินงบประมาณ ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐ บาท



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ความเป็นมา	๑
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง	๓
๓. การดำเนินงานโครงการฯ	
๓.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง	๗
๓.๒ การจัดทำแผนและการคัดเลือกพื้นที่	๘
๓.๓ การอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)	๘
๓.๔ แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)	๑๐
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง	
๔.๑ การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	๑๖
๔.๒ การจัดซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสีและอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ	๑๘
๔.๓ การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Pump) โดยวิธีพิเศษ	๑๘
๔.๔ การจัดซื้อชุดอุปกรณ์น้ำพร้อมมาตรวัดน้ำ โดยวิธี E-bidding	๑๘
๕. การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง (ดำเนินการเอง)	๑๙
๖. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	
๖.๑ ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑๙
๖.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน)	๒๐
๖.๓ แนวทางเร่งรัดดำเนินงาน	๒๐
๖.๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ใหม่	๒๑
๖.๕ การยกเลิกโครงการ	๒๑
๗. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)	
๗.๑ ครั้งที่ ๑	๒๒
๗.๒ ครั้งที่ ๒	๒๓
๘. การปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการฯ	๒๕
๙. ผลการดำเนินงานโครงการฯ	
๙.๑ เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	๒๕
๙.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	๒๗
๙.๓ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)	๒๗
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒๘
๑๑. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการฯ	๒๘
๑๒. แนวทางการแก้ปัญหา	๒๙



ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการประชุม เรื่อง มาตรการและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีได้ดำริให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ดำเนินการเตรียมบูรณาการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวก กำหนดแนวทางการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ดังนั้น จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน ๒๒ หน่วยงาน โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และ แนวทางการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง อำนาจการประสานส่วนราชการในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เชิงบูรณาการ พิจารณาให้ความเห็นและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานการบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง ๑๓๔ -๑๓๕) ได้กำหนดกรอบมาตรการช่วยเหลือ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน ๖ มาตรการ ประกอบด้วย

๑. การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ การส่งเสริมความรู้เพื่อการปรับตัว และ บรรเทาผลกระทบ การสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน เพื่อ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

- พื้นที่วิกฤต ได้แก่ ส่งเสริมการเลี้ยงปลุสสัตว์ ประมง และพืชผัก เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน (ไถ่พื้นเมือง/เปิดเทศ/แพะ/ปลาตุก/กบในบ่อพลาสติก/ผักสวนครัว) การฝึกอาชีพ เช่น แปรรูป จักสาน หัตถกรรม

- พื้นที่ภัยแล้งทั่วไป เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชตระกูลถั่ว การฝึกอาชีพ เช่น แปรรูป จักสานหัตถกรรม การส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน

๒. การควบคุมการใช้น้ำเฉพาะในพื้นที่วิกฤต โดยสนับสนุนอาจใช้เทคโนโลยีปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง

๓. การชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสหกรณ์ และกองทุนในการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๓ กองทุน

๔. การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อซ่อมสร้างสาธารณประโยชน์ การฝึกอบรมอาชีพ ทางเลือก โดยขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นลำดับแรก โดยจะมี กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก คาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑.๕ ล้านแรงงาน



๕. การเสนอโครงการความต้องการของชุมชน เป็นโครงการตามแผนของชุมชน

๖. การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ได้แก่ การขุดลอกคูคลอง สร้างแหล่งน้ำ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล การปฏิบัติการฝนหลวง และอื่นๆ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

๑. เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการ/โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อที่จะได้ รวบรวมจัดทำกรอบมาตรการการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง นำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เสนอแผนงาน/โครงการตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน โดย การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤตภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่ ๑๗ จังหวัด จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดประทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัด ลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัด กำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม และจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำแนกเป็น พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง (โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการ เจาะบ่อน้ำบาดาล) ในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน ๗๓๕ แห่ง (จ้างเหมาเอกชนเป็น ผู้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทรวงกลาโหม ปรับแผนการปฏิบัติงานในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ภายใต้มาตรการที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙



รายละเอียดโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)
จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง



โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

๑. ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

ผู้รับผิดชอบ : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๗๘

๒. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปริมาณน้ำในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำต้นทุนใน ๔ เขื่อนขนาดใหญ่ที่ส่งน้ำให้ ๒๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันนี้มีน้ำที่ใช้การได้อยู่ประมาณ ๓,๑๓๐ ล้าน ลบ.ม. คาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งมีปริมาณน้ำใช้การ ๓,๖๗๗ ลบ.ม. ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้มีการวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ๕๘๒ ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศน์ ๑,๔๐๐ ล้าน ลบ.ม. สำรองช่วงต้นฤดูฝน ๑,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. คงเหลือน้ำเพื่อการเกษตรเพียง ๑๗๗ ล้าน ลบ.ม. ถ้ามีการสูบน้ำหรือดึงน้ำจากลำน้ำมาใช้ในการเกษตร จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลมาช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (แหล่งน้ำ ในไร่นา) ที่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำน้อยในช่วงเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้มีรายได้ในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดแก่เกษตรกร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการนำน้ำบาดาลมาใช้เสริมกับน้ำผิวดินแบบบูรณาการ จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง ในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน ๗๓๕ แห่ง นอกจากนี้การมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดปียังทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนารูปแบบของการเพาะปลูกพืช จากการปลูกพืชเชิงปริมาณให้เป็นระบบเกษตรผสมผสานซึ่งพืชและสัตว์ต่างๆ สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรจึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- ๑) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเร่งด่วนให้หมดไป
- ๒) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
- ๓) ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

๔. เป้าหมายโครงการ

เกษตรกรจะได้รับน้ำบาดาลเพิ่มเติมจากโครงการฯ มาใช้เสริมกับน้ำผิวดินเพื่อช่วยเหลือการหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว์ในพื้นที่เร่งด่วนวิกฤต ๑๗ จังหวัด จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ ๑

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

ลำดับ ที่	พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด)	พื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา	ในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	รวมทั้งสิ้น
		จำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง(ดำเนินการเอง)	จำนวน ๗๓๕ แห่ง (จ้างเจาะ)	
๑	กำแพงเพชร	๑๒๐	๑๘๐	๓๐๐
๒	ฉะเชิงเทรา	๕๐	-	๕๐
๓	ชัยนาท	๑๕๐	๘๐	๒๓๐
๔	ตาก	๓๐	-	๓๐
๕	นครนายก	๓๐	๑๐	๔๐
๖	นครปฐม	๒๐	๑๕	๓๕
๗	นครสวรรค์	๖๐	๒๐	๘๐
๘	ปทุมธานี	๒๐	๑๐	๓๐
๙	พระนครศรีอยุธยา	๓๐	๑๐	๔๐
๑๐	พิจิตร	๑๒๐	๖๐	๑๘๐
๑๑	พิษณุโลก	๑๕๐	๖๐	๒๑๐
๑๒	ลพบุรี	๘๐	๔๐	๑๒๐
๑๓	สระบุรี	๘๐	๓๐	๑๑๐
๑๔	สิงห์บุรี	๑๕๐	๘๐	๒๓๐
๑๕	สุโขทัย	๑๕๐	๓๐	๑๘๐
๑๖	สุพรรณบุรี	๙๐	๕๐	๑๔๐
๑๗	อ่างทอง	๑๓๐	๖๐	๑๙๐
รวมทั้งสิ้น		๑,๔๖๐	๗๓๕	๒,๑๙๕

๕. วิธีการดำเนินการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง มาใช้เสริมกับน้ำผิวดินแบบบูรณาการเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทานที่ขาดแคลนน้ำ



เพื่อการเกษตร โดยดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบเทอร์โบน์ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๙๕ แห่ง มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะของบประมาณสนับสนุน (งบกลาง) วงเงินงบประมาณ ๗๔๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

๗. พื้นที่ดำเนินการ

พิจารณาจากผลการตรวจสอบศักยภาพน้ำบาดาล เป็นพื้นที่ที่มีน้ำบาดาลคุณภาพดี อัตรา มากกว่า ๑๐ ลบ.ม./ชม. โดยเป็นงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำบาดาล จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง หากขุดเจาะได้ตามแผนที่วางไว้ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ ๒๒,๐๐๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ำใช้ประโยชน์ ๐.๔๔ ล้าน ลบ.ม./วัน มีพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำบาดาลประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ – ๓๒๕,๐๐๐ ไร่

- พื้นที่วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พื้นที่ที่หากมีการใช้น้ำไม่เป็นไปตามแผน จะเกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของภาคส่วนอื่น) จำนวน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี และ จังหวัดอ่างทอง การดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบน์ และแนะนำการใช้งาน จำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง

- พื้นที่วิกฤตภัยแล้งในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เสี่ยงต่อน้ำไปไม่ถึง จำนวน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี และ จังหวัดอ่างทอง การดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบน์ และแนะนำการใช้งาน จำนวน ๗๓๕ แห่ง

๘. งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๘.๑ งบประมาณพื้นที่วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา วงเงิน ๔๙๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและแนะนำการใช้งานระบบ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเอง จำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง ๆ ละ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงิน ๔๙๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘.๒ งบประมาณพื้นที่วิกฤตภัยแล้งในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เสี่ยงต่อน้ำไปไม่ถึง วงเงิน ๒๔๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- จ้างเหมาบริการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ จำนวน ๗๓๕ แห่ง ๆ ละ ๒๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงิน ๑๖๒,๔๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอำนวยการบริหารโครงการ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเอง จำนวน ๗๓๕ แห่ง ๆ ละ ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับเกษตรกรในกลุ่มน้ำภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง (บางส่วน) ได้อย่างเหมาะสม และเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำไม่ถึง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำในไร่นาเป็นหลักเพื่อการเพาะปลูกได้ในระยะแรก และจะได้รับน้ำบาดาลเพิ่มเติมจากโครงการฯ เป็นส่วนเสริมเพื่อช่วยเหลือการหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร และ ปศุสัตว์ในพื้นที่เร่งด่วน วิกฤตภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ ๑๗ จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตาก นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี และ จังหวัดอ่างทอง จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ ๒๒,๐๐๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ำใช้ประโยชน์ ๐.๔๔ ล้าน ลบ.ม./วัน มีพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำบาดาลประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ - ๓๒๕,๐๐๐ ไร่

การดำเนินงานโครงการฯ

แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่

ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีคำสั่งที่ ๖๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

(๑). นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ประธานคณะทำงาน
(๒) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล	รองประธานคณะทำงาน
(๓) ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล	คณะทำงาน
(๔) ผู้อำนวยการกองแผนงาน	คณะทำงาน
(๕) ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล	คณะทำงาน
(๖) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล	คณะทำงาน
(๗) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒ สุพรรณบุรี	คณะทำงาน
(๘) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๓ สระบุรี	คณะทำงาน
(๙) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๗ กำแพงเพชร	คณะทำงาน
(๑๐) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๘ ราชบุรี	คณะทำงาน
(๑๑) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง	คณะทำงาน
(๑๒) นางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์ใส นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ(สสป.)	คณะทำงาน
(๑๓) นางจันทรัตน์ พิณสัมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ(กวน.)	คณะทำงาน
(๑๔) นายณที ทรัพย์ผ้าพับ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน(กผ.)	คณะทำงาน
(๑๕) นายบุญเลิศ เลิศพฤกษ์สุกิจ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน(ศทส.)	คณะทำงาน
(๑๖) นางพบพร เศรษฐพฤษา นักธรณีวิทยาชำนาญการ(สทบ.เขต ๒)	คณะทำงาน
(๑๗) นายธนัญชัย บุญพระกุล วิศวกรปฏิบัติการ(สทบ.เขต ๓)	คณะทำงาน



- (๑๘) นายธนู วิจิตรกุล นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน(สทบ.เขต ๗) คณะทำงาน
 (๑๙) นายจรรุญ วรสิงห์ นายช่างเทคนิคอาวุโส(สทบ.๘) คณะทำงาน
 (๒๐) นายพิเชษฐ วงษ์จันทร์ดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน (สทบ.เขต ๙) คณะทำงาน
 (๒๑) นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล คณะทำงาน
 (๒๒) นายประทีป ยอดดำเนิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 (๒๓) นายสุวรรณ์ เสาสรินทร์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่

(๑) กำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ เร่งรัดการดำเนินงาน แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

(๒) ประสานงานติดตามให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ให้คำปรึกษานับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร บทบาทหน้าที่ของกลุ่ม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบและการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ

(๓) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นเครือข่ายสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ให้คำปรึกษาระหว่างการขุดเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล และแนวทางมอบโอนการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร

(๔) สรุปรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

การจัดทำแผนและการคัดเลือกพื้นที่

๑. คัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน) โดยนำพื้นที่เป้าหมายมาทำการประเมินศักยภาพน้ำบาดาล โดยวิเคราะห์จากแผนที่น้ำบาดาล ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมาย และ สำนวนจตุกษรณี

๒. คัดเลือกจากคำของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สทบ.เขต ที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดยนำพื้นที่เป้าหมายมาทำการประเมินศักยภาพน้ำบาดาล โดยวิเคราะห์จากแผนที่น้ำบาดาล ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมาย และ การสำนวนจตุกษรณี

๓. ใช้แบบประเมินกลุ่มเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการ (แบบ นพก. ๐๑-๒ พื้นที่ ๓๐ - ๕๐ ไร่)

การอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

หนังสือด่วนที่สุด สำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๘/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) สำนักงบประมาณแจ้งว่า ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๗๔๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าว สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน เบิกเหลือปีแล้ว เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ในวงเงิน ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

๑. พื้นที่วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา วงเงิน ๔๘๙,๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ (ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ BS-M ความลึก ๑๐๐ เมตร) พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำและการแนะนำการใช้งานระบบ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเอง จำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง แห่งละ ๓๓๕,๓๐๐.๐๐ บาท วงเงิน ๔๘๙,๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. พื้นที่วิกฤตภัยแล้งในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เสี่ยงต่อน้ำไปไม่ถึง วงเงิน ๒๔๖,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าจ้างเหมาบริการเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ (ขนาด ๖ นิ้ว ท่อ BS-M ความลึก ๘๕ เมตร) จำนวน ๗๓๕ แห่ง แห่งละ ๒๑๖,๗๕๐.๐๐ บาท วงเงิน ๑๕๙,๓๑๑,๒๕๐.๐๐ บาท

๒.๒ ค่าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอำนวยการบริหารโครงการ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเอง จำนวน ๗๓๕ แห่ง แห่งละ ๑๑๘,๒๕๐.๐๐ บาท วงเงิน ๘๖,๙๑๓,๗๕๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ อาทิ สถานการณ์น้ำเปลี่ยนไป สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม หรือเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำใช้เพียงพอแล้ว ขุดเจาะแล้วไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการได้ ให้ คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบในการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม และได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้จัดลำดับความเร่งด่วน เด็ดร้อนมากก่อนเรียงตามลำดับไป และให้พิจารณาพื้นที่ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ โดยไม่กระทบ ผลผลิตหรือสาระสำคัญของโครงการลดลง

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ อย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และหากมีเงินงบประมาณเหลือ จ่ายขอให้จัดส่งคืนสำนักงบประมาณในโอกาสแรกด้วย

/แผนการดำเนินงาน...



แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

แผนการจัดสรรงบประมาณ

เปรียบเทียบอัตราราคางานต่อหน่วยกรรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558-2559						
ประมาณการโดยใช้อัตราราคาน้ำมั่นคงเฉลี่ยเหมาเหมาเร็วที่ 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร						
ที่	รายการ	จำนวน	unitcost สงป.	น้ำเกษตร		
				1,352 แห่ง	735 แห่ง	
				ดำเนินการเอง	จ้างเหมาบริการ	ดำเนินการเอง
	รวมทั้งสิ้น			335,300		335,000
	รวม			335,300	216,750	118,250
1.	งานสำรวจและทำแผนผังพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ			-	-	-
	ออกแบบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร (49*100)+(42*100)					
2.	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	10 จุด	1,580	9,480		
		6 จุด	1,580			
		20 จุด	1,580			
3.	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 100 ม.	1 บ่อ	1,720	210,000	216,750	
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 100 ม.	2 บ่อ	1,720			
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ BS-M ความลึก 100 ม.	1 บ่อ	2,100			
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ BS-M ความลึก 85 ม.	1 บ่อ	2,550			
4.	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีธรณีหลุมเจาะ	1 บ่อ	3,750	3,750		
		2 บ่อ	3,750			
5.	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 10 ชม.	1 บ่อ	8,000	8,000		8,000
		2 บ่อ	8,000			
6.	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบระยะยาว 75 ชั่วโมง	1 บ่อ	36,400	-	-	-
7.	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1 ตัวอย่าง	1,350	1,350		1,350
		2 ตัวอย่าง	1,350			
		2 ตัวอย่าง	1,350			
*	8. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 1 แรงม้า	1 ชุด	37,200	80,000		80,000
	เครื่องสูบน้ำ 3.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	130,000			
	8.1)เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบเทอร์โบ ขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	80,000			
	8.2)ชุดอุปกรณ์จ่ายน้ำพร้อมมาตรวัดน้ำ	1 ชุด	20,870			
	9 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลบ.ม.					
	10. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลบ.ม.		-			
	และติดตั้งอาคารสำหรับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ					
	11. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ		-	-	-	-
	และปักเสาพาดสายไฟฟ้า					
	12. ก่อสร้างห้องเหล็กพิกัด 30 ลบ.ม.		-	-	-	-
	และระบบน้ำเข้า-ออกถัง					
	13. ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำ/ทดสอบประสิทธิภาพ		-	-	-	-
	การทำงานของระบบ					
	14. จัดซื้อท่อระบบกระจายน้ำพร้อมอุปกรณ์		-	-	-	-
	15. ค่าควบคุมและตรวจรับงาน		-	-	-	-
**	16. ค่าอำนวยการบริหารโครงการฯ		-	1,850	-	8,030
	1) ค่าฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เอกสาร/จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้/ส่งมอบโครงการ		-	1,230	-	1,230
	2) ค่าติดตามและประเมินผล		-	-	-	2,800
	3) ค่าควบคุมงาน		-	-	-	2,916
	4) ค่าตรวจรับงาน		-	-	-	1,084
	5) ค่าเดินทางพัสดุ		-	55	-	
	6) ประชาสัมพันธ์โครงการ/วัสดุสำนักงาน/ค่าถ่ายเอกสารและข่าวคำ		-	349	-	
	7) จัดทำรายงาน/คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำบาดาล		-	216	-	
หมายเหตุ						
งานลำดับที่ 1 - 7 เป็นการคำนวณราคาตามอัตราราคางานต่อหน่วยสำนักงานงบประมาณ (มี.ค.58) ณ อัตราราคาน้ำมั่นคงเฉลี่ย 23.00-23.99 บาท/ลิตร						
* งานลำดับที่ 8 ข้อย่อยที่ 1 ใช้ตามอัตราราคางานต่อหน่วย สงป. (มี.ค.55) ข้อย่อยที่ 2-3 เป็นอัตราตามการสืบราคาของหน่วยงาน						
** งานลำดับที่ 16 ข้อย่อยที่ 1 - 7 เป็นค่าใช้จ่ายตามประมาณการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด						
ข้อย่อยที่ 3 ค่าควบคุมงานสามารถเบิกจ่ายในกิจกรรมค่าติดตามและประเมินผลได้						
ค่าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอำนวยการบริหารโครงการ จำนวน 735 แห่ง แห่งละ 118,250 บาท (หนังสือที่ นร 0709/2914) จำแนกกิจกรรมได้ดังนี้						
	รายการ	จำนวน(แห่ง)	จำนวนเงิน(บาท)			
	1. ค่าทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1	8,000			
	2. ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	1,350			
	3. ค่าอำนวยการบริหารโครงการ	1	8,030			
ค่าฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 405 บาท x 3 ครั้ง รวม 1215 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น 15 บาท = 1230 บาท						
(ค่าฝึกอบรม = ค่าอาหาร 1 มื้อ 300 บาท + ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 50 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น 5 บาท)						

[illegible]



แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง)																		
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล																		
ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	แบบปฏิบัติการรายเดือน(ไตรมาส 2558-กับยายน 2559)													
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4							
					ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ก.ย. 59				
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์	12,816,960	1,352	แห่ง			492	492										
2	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	135,200,000	1,352	แห่ง			490	490										
3	จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	159,311,250	735	แห่ง			200	290	245									
4	จัดซื้อท่อเหล็กสำหรับวางสายและอุปกรณ์สำหรับ บ่อน้ำบาดาล	145,799,000	1,352	แห่ง			1,352											
5	จัดซื้อปั๊มยกบ่อน้ำบาดาล	878,800	1,352	แห่ง														
6	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การจะ	2,042,200	1,352	แห่ง														
7	هزینهโทรศัพท์และ (E-log)	5,070,000	1,352	แห่ง			490	490	372									
8	อุปโภคบริโภคของน้ำมันปกติ 10 ลิตร (Pump oil test)	16,696,000	2,087	แห่ง			600	762	725									
9	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	2,817,450	2,087	แห่ง			600	762	725									
10	จัดซื้อเครื่องมือวัดระดับน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	166,960,000	2,087	เครื่อง			4,000											
11	จัดซื้ออุปกรณ์รถจักรยานยนต์พร้อมตัวรับน้ำหนัก	43,555,690	2,087	ชุด			2,087											
12	ค่าดำเนินการทางสถิติ	28,700	2,087	แห่ง														
13	ค่าตรวจรับงาน	798,210	735	แห่ง														
14	จัดทำรายงาน/คู่มือการใช้ระบบบริหารงาน	315,000	2,087	แห่ง														
15	ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/เอกสาร/จัดตั้งศูนย์/ส่งมอบฯ	2,567,010	2,087	แห่ง														
16	ค่าประชาสัมพันธ์/วิจัย/ศึกษานักงาน/ค่าเช่าเอกสาร	565,240	2,087	แห่ง														
17	ค่าติดตามประเมินผลงาน/ประชุมโครงการ	1,897,000	2,087	แห่ง														
18	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	2,232,090	735	แห่ง														
19	กองบัญชาการภาคที่ไม่เป็นเอกเทศพื้นที่ราชการน้ำบาดาล	36,212,400	108	แห่ง														
	รวม	735,763,000	2,195	แห่ง														
หมายเหตุ :																		
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 36,212,400 บาท คงไว้ สอนเพื่อรอการขอรับและโอนเงินงบประมาณให้กองบัญชาการภาคที่ไม่เป็นเอกเทศพื้นที่ราชการน้ำบาดาล (พื้นที่จำนวน 108 แห่ง) งบประมาณคงเหลือที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนปีงบการเงิน 699,550,600 บาท (พื้นที่																		



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง)																			
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล																			
รายการ เงินสำรองเพื่อการฉุกเฉินเห็นชอบเป็น จำนวน 735,763,000 บาท																			
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง)																			
รายการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง) จำนวน 2,195 แห่ง																			
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล																			
ลำดับ ที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน หน่วยนับ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				รวม	หน่วย: บาท		
				ค.ศ. 58		ธ.ค. 58		ม.ค. 59		ก.พ. 59		มี.ค. 59		ก.ค. 59				ก.ย. 59	
				พ.ย. 58	พ.ธ. 58	พ.ย. 58	พ.ธ. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	ก.ค. 59	พ.ย. 59	พ.ธ. 59	ม.ค. 59	ก.ค. 59				
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์	12,816,960	1,352	พหัง				4,664,160	3,488,640							12,816,960			
2	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	135,200,000	1,352	พหัง				49,000,000	37,200,000							135,200,000			
3	จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	159,311,250	735	พหัง				43,350,000	62,857,500							159,311,250			
4	จัดซื้อท่อเหล็กกล้าขนาด 6 นิ้วและอุปกรณ์สำหรับบ่อน้ำบาดาล	145,799,000	1,352	พหัง				80,000,000	65,799,000							145,799,000			
5	จัดซื้อปั๊มยกน้ำบาดาล	878,800	1,352	พหัง				316,400	246,000							878,800			
6	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาขุดเจาะและติดตั้งอุปกรณ์การเจาะ	2,042,200	1,352	พหัง				830,000	382,200							2,042,200			
7	ทรัพย์สินหมุนเวียน (E-log)	5,070,000	1,352	พหัง				1,837,500	1,395,000							5,070,000			
8	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา 10 ชุด (Pumping test)	16,696,000	2,087	พหัง				4,800,000	6,096,000							16,696,000			
9	ค่าเช่าที่ดินและอุปกรณ์การขุดเจาะ	2,817,450	2,087	พหัง				810,000	1,028,700							2,817,450			
10	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	166,960,000	2,087	พหัง				90,800,000	76,160,000							166,960,000			
11	จัดซื้อชุดอุปกรณ์การขุดเจาะน้ำพร้อมรถบรรทุก	43,555,690	2,087	พหัง				23,500,000	20,055,690							43,555,690			
12	ค่าดำเนินการทางพัสดุ	28,700	2,087	พหัง				14,350	14,350							28,700			
13	ค่าตรวจรับงาน	798,210	735	พหัง				266,270	265,670							798,210			
14	ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการไปและไปราชการ	315,000	2,087	พหัง				105,000	105,000							315,000			
15	ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากร	2,567,010	2,087	พหัง				1,283,505	1,283,505							2,567,010			
16	ค่าเช่ารถบรรทุก 5 ตันสำหรับขนถ่ายดิน	565,240	2,087	พหัง				220,000	125,240							565,240			
17	ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุบำรุงรักษา	1,897,000	2,087	พหัง				640,000	617,000							1,897,000			
18	ค่าวัสดุอุปกรณ์และวัสดุบำรุงรักษา	2,232,090	735	พหัง				743,400	745,290							2,232,090			
19	ค่าเช่ารถบรรทุก 5 ตันสำหรับขนถ่ายดิน	36,212,400	108	พหัง												36,212,400			
	รวม	735,763,000	2,195	พหัง				301,897,080	291,917,475							735,763,000			
หมายเหตุ :																			
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 36,212,400 บาท คงไว้ใช้ สอบเพื่อขอการสนับสนุนและสนับสนุนไปกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำบาดาล จำนวน 692,550,600 บาท (เกินจำนวน)																			



แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง)																
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หมวดคำอธิบาย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (//)		วิธีการ (//)				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตัว	แผนปฏิบัติการ				แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดจ้าง	สอบราคา		ประกวดราคา	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (ล้านบาท)	งบปรมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	โครงการพัฒนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง)															
	1	จ้างดูแลระบบน้ำบาดาล	735 แห่ง			/		/		จ.ค. 58	ม.ค. 59	ม.ค. 59		159,311,250		
	2	ซื้อท่อเหล็กกล้าอัดสังกะสีและอุปกรณ์สำหรับบ่อน้ำบาดาล	1,352			/		/		จ.ค. 58	ม.ค. 59	ม.ค. 59		145,799,000		
		2.1) รายการที่ 1 ท่อเหล็กกล้า ES-11 หรือ เอส 277-2532 ประเภท 2	21,226			/		/		จ.ค. 58	ม.ค. 59	ม.ค. 59		124,978,200		
		2.2) รายการที่ 2 ท่อสังกะสีเหล็ก ES-11 หรือ เอส 277-2532 ประเภท 2	2,704 ฟุต			/		/		จ.ค. 58	ม.ค. 59	ม.ค. 59		20,820,800		
	3	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบเทอร์ไบน์ (Turbine pump) ชนิดขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์การเกษตร พร้อมอุปกรณ์	2,087 ชุด			/		/		จ.ค. 58	ม.ค. 59	ม.ค. 59		166,960,000		
	4	อุปกรณ์จ่ายน้ำพร้อมมาตรวัดน้ำ	2,087 ชุด			/		/		จ.ค. 58	ม.ค. 59	ม.ค. 59		43,555,690		
หมายเหตุ :																
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 36,212,400 บาท คงไว้ใช้ สทบ.เพื่อรอการตอบรับและโอนเงินงบประมาณให้กองบัญชาการกองทัพบกจ่ายแผนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (พื้นที่จำนวน 108 แห่ง) งบประมาณคงเหลือที่																
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการ จำนวน 699,550,600 บาท (พื้นที่จำนวน 2,087 แห่ง)																



การจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน ๗๓๕ แห่ง โดยวิธีพิเศษ โดยจัดเป็นกลุ่มตามความลึกตาม ศักยภาพน้ำบาดาล จำนวน ๕๑ กลุ่ม ดังนี้

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน								
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบกลาง)								
ในเขตชลประทานพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 735 แห่ง								
ลำดับ กลุ่มที่	สทบ.เขต	กลุ่มพื้นที่ของ สทบ.เขต	จำนวน (แห่ง)	ความลึกเฉลี่ย ต่อแห่ง (เมตร)	ความลึกเฉลี่ย รวมกลุ่มพื้นที่ (เมตร)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
01	เขต 2	01	18	70	1,260	178,500	3,150,000	
02	เขต 2	02	19	70	1,330	178,500	3,325,000	
03	เขต 2	03	17	70	1,190	178,500	2,975,000	
04	เขต 2	04	16	70	1,120	178,500	2,800,000	
05	เขต 2	05	18	70	1,260	178,500	3,150,000	
06	เขต 2	06	16	70	1,120	178,500	2,800,000	
07	เขต 2	07	15	70	1,050	178,500	2,625,000	
08	เขต 2	08	17	70	1,190	178,500	2,975,000	
09	เขต 2	09	16	80	1,280	204,000	3,200,000	
10	เขต 2	10	12	80	960	204,000	2,400,000	
11	เขต 2	11	16	90	1,440	225,000	3,600,000	
12	เขต 2	12	14	80	1,120	200,000	2,800,000	
13	เขต 2	13	11	95	1,045	237,500	2,612,500	
14	เขต 2	14	15	90	1,350	225,000	3,375,000	
15	เขต 2	15	15	95	1,425	237,500	3,562,500	
16	เขต 2	16	17	90	1,530	225,000	3,825,000	
17	เขต 2	17	17	90	1,530	225,000	3,825,000	
18	เขต 2	18	13	130	1,690	339,300	4,410,900	
19	เขต 2	19	8	160	1,280	427,200	3,417,600	
20	เขต 2	20	10	120	1,200	313,200	3,132,000	
21	เขต 2	21	10	130	1,300	339,300	3,393,000	
	รวมเขต 2	21	310	1,890	26,670	4,830,000	67,353,500	
22	เขต 3	01	13	70	910	175,000	2,275,000	
23	เขต 3	02	14	70	980	175,000	2,450,000	
24	เขต 3	03	13	70	910	175,000	2,275,000	
25	เขต 3	04	17	95	1,615	237,500	4,037,500	
26	เขต 3	05	13	130	1,690	339,300	4,410,900	
27	เขต 3	06	10	100	1,000	250,000	2,500,000	
	รวมเขต 3	06	80	535	7,105	1,351,800	17,948,400	
28	เขต 7	01	14	70	980	175,000	2,450,000	
29	เขต 7	02	18	70	1,260	175,000	3,150,000	
30	เขต 7	03	15	70	1,050	175,000	2,625,000	
31	เขต 7	04	14	70	980	175,000	2,450,000	
32	เขต 7	05	14	70	980	175,000	2,450,000	
33	เขต 7	06	18	70	1,260	175,000	3,150,000	
34	เขต 7	07	16	70	1,120	175,000	2,800,000	
35	เขต 7	08	17	90	1,530	225,000	3,825,000	
36	เขต 7	09	13	90	1,170	225,000	2,925,000	
37	เขต 7	10	13	100	1,300	250,000	3,250,000	
38	เขต 7	11	15	75	1,125	187,500	2,812,500	
39	เขต 7	12	15	95	1,425	237,500	3,562,500	
40	เขต 7	13	16	85	1,360	212,500	3,400,000	
41	เขต 7	14	15	100	1,500	250,000	3,750,000	
42	เขต 7	15	13	100	1,300	250,000	3,250,000	
43	เขต 7	16	15	70	1,050	175,000	2,625,000	
44	เขต 7	17	14	70	980	175,000	2,450,000	
45	เขต 7	18	14	70	980	175,000	2,450,000	
46	เขต 7	19	11	90	990	225,000	2,475,000	
47	เขต 7	20	9	100	900	250,000	2,250,000	
48	เขต 7	21	14	110	1,540	287,100	4,019,400	
49	เขต 7	22	13	110	1,430	287,100	3,732,300	
50	เขต 7	23	14	85	1,190	212,500	2,975,000	
	รวมเขต 7	23	330	1930	27,400	4,849,200	68,826,700	
51	เขต 8	01	15	100	1,500	250,000	3,750,000	
	รวมเขต 8	01	15	100	1,500	250,000	3,750,000	
	รวมทั้งหมด	51	735	4,455	62,675	11,281,000	157,878,600	



การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล มีผู้รับจ้างทำสัญญา ดังนี้

การจัดจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๗๓๕ แห่ง					
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง					
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)					
ลำดับ ที่	รายการ/คู่สัญญา	สัญญาเลขที่/ลงวันที่	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	กลุ่ม ที่	จำนวน (แห่ง)
	จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ๕๑ กลุ่ม				๗๓๕
๑	หจก.ไท ไท เกษตร	๑๔๘/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๘
๒	บ.อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จก.	๑๓๗/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๙
๓	บ.อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จก.	๑๓๘/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๗
๔	บ.อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จก.	๑๓๖/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๖
๕	หจก.ไท ไท เกษตร	๑๔๗/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๘
๖	หจก.อินทร์บุรีก่อสร้าง	๑๔๑/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๗๘๔,๐๐๐.๐๐	๖	๑๖
๗	ร้าน พีพี ราชาบาดาล	๑๖๔/๒๕๕๙ ลว ๑๗ พค. ๕๙	๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑๕
๘	หจก.อินทร์บุรีก่อสร้าง	๑๔๒/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๘	๑๗
๙	บ.อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จก.	๑๓๙/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙	๑๖
๑๐	หจก.ไท ไท เกษตร	๑๔๖/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๒
๑๑	หจก.อินทร์บุรีก่อสร้าง	๑๔๐/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑๖
๑๒	หจก.ไท ไท เกษตร	๑๔๙/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑๔
๑๓	หจก.ส.สุรักษ์บาดาล ๙๙๙	๑๔๔/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๕๖๐,๒๕๐.๐๐	๑๓	๑๑
๑๔	หจก.ส.สุรักษ์บาดาล ๙๙๙	๑๔๕/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๓๐๗,๕๐๐.๐๐	๑๔	๑๕
๑๕	บ.ไทยเจริญสุขเอ็นจิเนียริง จก.	๑๔๓/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๕๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๕	๑๕
๑๖	บ.ที.ซี.ดี ดีเวลลอป จก.	๑๓๓/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๖	๑๗
๑๗	บ. คราฟท์ สกิลล์ จก.	๑๕๑/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๘๒๔,๑๐๐.๐๐	๑๗	๑๗
๑๘	บ. คราฟท์ สกิลล์ จก.	๑๖๓/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๔,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๑๓
๑๙	บ. คราฟท์ สกิลล์ จก.	๑๕๓/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๔๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๙	๘
๒๐	บ. คราฟท์ สกิลล์ จก.	๑๕๗/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๐	๑๐
๒๑	บ. คราฟท์ สกิลล์ จก.	๑๕๕/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๓๙๑,๕๐๐.๐๐	๒๑	๑๐
๒๒	หจก.วิสิทธิ์บาดาลการเกษตร	๑๖๐/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๒๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๒	๑๓
๒๓	หจก.วิสิทธิ์บาดาลการเกษตร	๑๓๕/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๓	๑๔
๒๔	หจก.วิสิทธิ์บาดาลการเกษตร	๑๓๔/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๒๒๙,๕๐๐.๐๐	๒๔	๑๓
๒๕	ร้าน น.นพการคำ	๑๒๙/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕	๑๗
๒๖	บ. คราฟท์ สกิลล์ จก.	๑๕๔/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๔,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๖	๑๓
๒๗	บ. คราฟท์ สกิลล์ จก.	๑๕๖/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๗	๑๐
๒๘	ร้าน ดรีมการไฟฟ้า	๑๓๐/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๘	๑๘



การจัดจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๗๓๕ แห่ง					
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง					
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)					
ลำดับ ที่	รายการ/คู่สัญญา	สัญญาเลขที่/ลงวันที่	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	กลุ่ม ที่	จำนวน (แห่ง)
	จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ๕๑ กลุ่ม				๗๓๕
๒๙	หจก. ชีรเทพทนายความและธุรกิจ	๑๒๗/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒	๑๔
๓๐	หจก.พรรณิภา ดีเพลลท์	๑๓๒/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓	๑๘
๓๑	หจก. มุกดาหารบาดาล	๑๖๑/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔	๑๖
๓๒	หจก. วาย เอ็น วาย คอน สตรัคชั่น	๑๓๑/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๘๐๘,๗๕๐.๐๐	๓๘	๑๕
๓๓	ร้าน ทรัพย์ธรณี เอ็นจิเนียริง	๑๕๙/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๕๖๒,๕๐๐.๐๐	๓๙	๑๕
๓๔	หจก. ชีรเทพทนายความและธุรกิจ	๑๒๖/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐	๑๖
๓๕	หจก. สุราอาจสามารถ	๑๒๕/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๖๒๒,๐๐๐.๐๐	๔๓	๑๕
๓๖	นายประกอบ แสงสุข	๑๒๘/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕	๑๔
๓๗	บ. คราฟท์ สกิลล์ จก.	๑๖๕/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙	๒,๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๖	๑๑
๓๘	บ. วาย แอนด์ เอ เทคโนโลยี จก.	๑๖๕/๒๕๕๙ ลว ๑๘ พค. ๕๙	๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๑	๑๕
๓๙	กิจการค้าร่วม เอสแอลเจ	๑๕๘/๒๕๕๙ ลว ๑๖ พค. ๕๙			
	๓๙.๑	๑๕๘/๒๕๕๙	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๑๔
	๓๙.๒	๑๕๘/๒๕๕๙	๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐	๑๕
	๓๙.๓	๑๕๘/๒๕๕๙	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑	๑๔
	๓๙.๔	๑๕๘/๒๕๕๙	๓,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑๗
	๓๙.๕	๑๕๘/๒๕๕๙	๒,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๖	๑๓
	๓๙.๖	๑๕๘/๒๕๕๙	๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗	๑๓
	๓๙.๗	๑๕๘/๒๕๕๙	๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑	๑๕
	๓๙.๘	๑๕๘/๒๕๕๙	๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒	๑๓
	๓๙.๙	๑๕๘/๒๕๕๙	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔	๑๔
	๓๙.๑๐	๑๕๘/๒๕๕๙	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗	๙
	๓๙.๑๑	๑๕๘/๒๕๕๙	๔,๐๑๙,๔๐๐.๐๐	๔๘	๑๔
	๓๙.๑๒	๑๕๘/๒๕๕๙	๓,๗๓๒,๓๐๐.๐๐	๔๙	๑๓
	๓๙.๑๓	๑๕๘/๒๕๕๙	๒,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๐	๑๔
	รวมทั้งสิ้น		๑๕๗,๑๒๘,๓๐๐.๐๐		๗๓๕



การจัดซื้อท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีและอุปกรณ์ โดยวิธีพิเศษ

มีผู้ขายทำสัญญา ดังนี้

การจัดซื้อท่อเหล็กและอุปกรณ์			
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)			
สทบ.เขต	รายการ/คู่สัญญา	สัญญาเลขที่/ลงวันที่	วงเงินสัญญาซื้อ (บาท)
๒	บริษัท สิมะกิจ คอมเมอร์เชียล จำกัด	๑๒๑/๒๕๕๙ ลว. ๒ พ.ค. ๕๙	๖๗,๖๗๓,๗๙๖.๐๐
๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์อินดัสตรี เคมีเคิล	๑๒๐/๒๕๕๙ ลว. ๒ พ.ค. ๕๙	๑๔,๙๗๓,๒๐๐.๐๐
๗	บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด	๑๑๗/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๕๐,๓๓๑,๖๐๐.๐๐
๘	บริษัท สิมะกิจ คอมเมอร์เชียล จำกัด	๑๑๒/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๒,๕๓๙,๘๘๐.๐๐
๙	บริษัท สิมะกิจ คอมเมอร์เชียล จำกัด	๑๑๑/๒๕๕๙ ลว. ๒๙เม.ย. ๕๙	๒,๐๔๘,๐๗๒.๐๐
รวมทั้งสิ้น			๑๓๗,๕๖๖,๕๔๘.๐๐

การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Pume) โดยวิธีพิเศษ

มีผู้ขายทำสัญญา ดังนี้

การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Pump)			
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)			
กลุ่มที่	รายการ/คู่สัญญา	สัญญาเลขที่/ลงวันที่	วงเงินสัญญาซื้อ (บาท)
๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามชีวิล ซัพพลาย	๑๑๙/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๓,๓๘๔,๓๕๐.๐๐
๒	บริษัท ไทยวอเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๑๕/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๗,๓๑๒,๒๓๐.๐๐
๓	บริษัท ไทยวอเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๑๓/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๒๒,๙๗๒,๐๕๐.๐๐
๔	บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด	๑๑๐/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๒๓,๙๖๕,๒๐๐.๐๐
๕	บริษัท ไทยวอเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๑๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๖,๘๐๔,๐๐๐.๐๐
๖	บริษัท โรลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด	๑๐๙/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๓๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐
๗	บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๒๓/๒๕๕๙ ลว. ๑๑ พ.ค. ๕๙	๒,๖๔๖,๐๐๐.๐๐
๘	บริษัท อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด	๑๑๘/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๑,๙๖๕,๖๐๐.๐๐
๙	บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๒๔/๒๕๕๙ ลว. ๑๑ พ.ค. ๕๙	๖,๐๗๕,๐๐๐.๐๐
๑๐	บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๒๒/๒๕๕๙ ลว. ๑๑ พ.ค. ๕๙	๒,๙๐๒,๕๐๐.๐๐
๑๑	บริษัท ไทยวอเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑๑๖/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๙	๖,๐๐๗,๕๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น			๑๑๗,๗๗๘,๔๓๐.๐๐

การจัดซื้อชุดอุปกรณ์จ่ายน้ำพร้อมมาตรวัดน้ำ โดยวิธี E-biding

มีผู้ขายทำสัญญา ดังนี้

การจัดซื้อชุดอุปกรณ์จ่ายน้ำพร้อมมาตรวัดน้ำ			
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)			
ลำดับที่	รายการ/คู่สัญญา	สัญญาเลขที่/ลงวันที่	วงเงินสัญญาซื้อ (บาท)
๑	บริษัท โรลิ่ง คอนเซปต์ อินโนเวชั่น จำกัด	๑๗๖/๒๕๕๙ ลว. ๒ มิ.ย. ๕๙	๔๑,๓๗๒,๖๘๘.๐๐
รวมทั้งสิ้น			๔๑,๓๗๒,๖๘๘.๐๐



การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง (ดำเนินการเอง)

สทบ.เขต ที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. สทบ.เขต ๒ สุพรรณบุรี จำนวน ๒๙๔ แห่ง
๒. สทบ.เขต ๓ สระบุรี จำนวน ๑๓๖ แห่ง
๓. สทบ. เขต ๔ ขอนแก่น จำนวน ๒๕๘ แห่ง
๔. สทบ. เขต ๗ กำแพงเพชร จำนวน ๒๘๐ แห่ง
๕. สทบ. เขต ๘ ราชบุรี จำนวน ๑๐๐ แห่ง
๖. สทบ. เขต ๙ ระยอง จำนวน ๑๒๖ แห่ง
๗. สทบ. เขต ๑๐ อุตรธานี จำนวน ๑๕๘ แห่ง
๘. กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กองบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน ๑๐๘ แห่ง (ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้วิธีเบิกจ่ายแทนกัน)

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือด่วนที่ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ ๐๒/๕๑๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อทบ. เห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าว และสั่งการให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สทบ.เขต ๑-๑๒ ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญของงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง ดังนี้

งบกลาง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔ หนังสือสำนักงบประมาณ นร ๐๗๐๔/ว ๓๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑. กรม เสนอ คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (กระทรวงเกษตรฯ) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

๒. กรม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ตามอำนาจ สำนักงบประมาณ

๓. กรม รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ และ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบ ภายใน ๓ วันทำการ

ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ในส่วนของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีการแก้ไขรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ การยกเลิกรายการ(งบเงินกู้) หมวดรายจ่าย งบลงทุน แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑. การแก้ไขรายชื่อสถานที่ ที่พิมพ์ผิด ไม่ถูกต้อง (ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติแก้ไข)



๒. การเปลี่ยนแปลงสถานที่จากแผนเดิมเป็นแผนใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ เป็น อำนาจ สำนักงบประมาณ พิจารณออนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

๓. การยกเลิกโครงการ (งบเงินกู้) ให้พิจารณายกเลิกพื้นที่เดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทุกกรณี เว้นแต่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการว่ายังมีหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตกสำรวจจากเป้าหมายเดิม หรือพื้นที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ กนช. รับรองว่ามี เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข และไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการ หรือเป็นหมู่บ้านประสบภัยแล้งเร่งด่วน ต้องได้รับการช่วยเหลือ ทั้งนี้หมู่บ้านกรณีนี้ต้องมีหลักฐานยืนยันรับรองจาก ปก. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหมู่บ้านประสบภัยแล้งต้องรีบแก้ไขโดยด่วน (เป็น อำนาจ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยเสนอ กนช. ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน)

หลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ	ความจำเป็นของ ทบ.	เอกสารหลักฐาน
๑. ไม่สามารถดำเนินการในสถานที่แห่งเดิมได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใดอันถึงเห็นผลได้ อย่างแน่ชัดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปให้แล้วเสร็จได้	-พื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล (น้ำน้อย/น้ำเค็ม) -พื้นที่/กลุ่มผู้ใช้น้ำยังไม่พร้อมในการบริหารจัดการโครงการ/ไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง	๑. รายงานผล ผลการเจาะบ่อบาดาล/ผลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ Resistivity/ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ e-log/ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล หรือ หนังสือรับรองไม่ประสงค์ขอรับโครงการของพื้นที่เดิม ๒. หนังสือคำขอของพื้นที่ใหม่
๒. หมดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในสถานที่แห่งเดิม เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้เงินจากแหล่งอื่น หรือมีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นแล้ว	-ดำเนินการแล้ว/ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น/เข้าซ้อน/ท้องถิ่นได้ใช้บ่อของ ทบ. ไปแล้ว	๑. หนังสือรับรองไม่ประสงค์ขอรับโครงการของพื้นที่เดิม ๒. หนังสือคำขอของพื้นที่ใหม่
๓. มีเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในสถานที่แห่งใหม่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	-ความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ใหม่ (มีพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วน ตามประกาศของ ปก./มติ ครม./กนช. ที่มีนโยบายให้ ทบ. เข้าดำเนินการช่วยเหลือ	๑. หนังสือรับรองไม่ประสงค์ขอรับโครงการของพื้นที่เดิม หรือ หนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงสถานที่จาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒. หนังสือคำขอของพื้นที่ใหม่

แนวทางการเร่งรัดดำเนินงาน

เห็นควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔ /ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๑. เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งรูปแบบที่ ๒ ให้เบิกจ่ายและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



๒. เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (งบกลาง) ให้เบิกจ่ายและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓. เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ให้เบิกจ่ายและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

๔. เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการงบลงทุนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ใหม่

๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค คัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

๑.๑ เลือกจากพื้นที่หมู่บ้านไม่มีระบบประปาจากข้อมูลการสำรวจระบบประปาจากกรมทรัพยากรน้ำ

๑.๒ เลือกจากข้อมูล กชช.๒ค

๑.๓ เลือกจากคำขอของ สทบ.เขต ๑ – ๑๒ (ต้องเป็นหมู่บ้านที่ยังมีความขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)

๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

๑. เลือกจากคำขอของ สทบ.เขต ๑ – ๑๒

๒. เลือกตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง คัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

๑. เลือกจากคำขอของ สทบ.เขต ๑ – ๑๒

๒. เลือกตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

การยกเลิกโครงการ

ในกรณีการขอยกเลิกไม่ดำเนินงานโครงการ ด้วยสาเหตุแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถดำเนินการยกเลิกได้ ทั้งนี้ให้ ทบ. ดำเนินการดังนี้

๑. กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาลเกษตร ให้ ทบ. แก้ไขสัญญาและคืบงานประมาณในส่วนที่จ้างเหมาก่อสร้างที่ยกเลิก โดยประเมินราคาให้ชัดเจน

๒. กรณีที่กรมดำเนินการเองในส่วนการเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้ ยุติการดำเนินงานและคืบงานประมาณในกิจกรรมที่เหลือ ที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ชัดเจนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. กรณีกรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบบ่อ ได้แก่ วัสดุท่อ และเครื่องสูบ ซึ่งถือว่าวัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าว กรมฯ ได้จัดซื้อสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว เป็นทรัพย์สินของกรม ถือว่าเป็นครุภัณฑ์คงค้าง คงเหลือจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้สามารถเอาไปใช้ในกิจกรรมหรือภารกิจอื่นๆ ที่เร่งด่วนหรือจำเป็นของกรมได้ โดยไม่ต้องคืบงานประมาณในส่วนของสถานที่ที่ยกเลิก



การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

ครั้งที่ ๑

๑. หนังสือด่วนที่สุด สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง ที่ ๐๑/๔๐๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ให้ สบก.ส่วนพัสดุ, สพบ., สทบ.เขต ๒ สุพรรณบุรี, สทบ.เขต ๓ สระบุรี, สทบ.เขต ๔ ขอนแก่น, สทบ.เขต ๗ กำแพงเพชร, สทบ.เขต ๘ ราชบุรี, สทบ.เขต ๙ ระยอง, สทบ.เขต ๑๐ อุดรธานี ให้แจ้งรายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มาให้ สบก. ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือด่วนที่สุด สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง ที่ ๐๑/๔๙๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สบก. โดยส่วนการคลังแจ้งว่า ได้ตรวจสอบผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางที่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยเรียกรายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการยกยอด จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๖๒๔,๒๔๙,๔๐๔.๙๐ บาท (หกร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์) ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๒๓๕๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ มาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงมติอนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและการใช้จ่ายงบประมาณ จากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และรับทราบการปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการด้วย



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล								
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙								
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙								
รายการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติการจัดสรร	เบิกจ่าย					คงเหลือ	
		จ่ายจริง	%	ใบสั่งซื้อ/สัญญา(PO)	รวม	%	จำนวนเงิน	%
งบกลาง								
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น								
งบรายจ่ายอื่น								
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน								
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล								
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๘,๕๗๖,๓๖๔.๑๓	๙.๓๒	๓,๕๕๔,๗๕๗.๗๓	๗๒,๑๓๑,๑๒๑.๘๖	๙.๘	๖๖๓,๖๓๑,๘๓๘.๑๔	
ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ								
พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง								
โดยเบิกจ่ายในงบลงทุน								
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ส่วนกลาง	๕๑๙,๙๘๓,๘๕๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๑๙,๙๘๓,๘๕๐.๐๐	๑๐๐
ส่วนภูมิภาค	๑๗๙,๕๖๖,๗๕๐.๐๐	๖๖,๐๖๓,๘๐๗.๑๓	๓๖.๗๙	๓,๕๕๔,๗๕๗.๗๓	๖๖,๐๖๓,๘๐๗.๑๓	๓๖.๗๙	๑๑๓,๕๐๒,๙๔๒.๘๗	๖๑.๒๓
กองบัญชาการกองทัพบก(เบิกแทน)	๓๖,๒๑๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๑๒,๕๖๐.๐๐	๖.๙๔	๐	๒,๕๑๒,๕๖๐.๐๐	๖.๙๔	๓๓,๖๙๙,๙๔๐.๐๐	๙๓.๐๖

การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

ครั้งที่ ๒

๑. ใบเสนองานส่วนการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขรับที่ ๖๙๘๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๙ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

เรื่องเดิม

๑.๑ ทส. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจากเดิมสิ้นสุดโครงการเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการเดือน มกราคม ๒๕๖๐

๑.๒ ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

อนุมัติตามที่ ทส.เสนอ และให้ ทส.(ทบ.) รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปดำเนินการ ด้วยกรณี ทบ. ควรจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน รอบคอบ สอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ก่อนดำเนินโครงการ จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์



การดำเนินโครงการดังกล่าวเสนอ ครม. เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เห็นสมควรให้ยกเลิกการดำเนินการและส่งคืนงบประมาณในส่วนที่เหลือต่อไป

๑.๓ ให้ ทส. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานผลให้ ครม. ทราบภายในไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วย

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๕/๒๓๔๓๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ตามที่ได้ยื่นย้มนมติคณะรัฐมนตรี (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนมาเพื่อทราบ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาด้วย

๓. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๓/๖๘๐๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ได้พิจารณาเห็นชอบการเสนอขอปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงาน จำนวน ๓๙๗ แห่ง และการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) เป็นโครงการสำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือและแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒,๐๙๗ แห่ง คงเหลือ ๙๘ แห่ง คาดว่าจะสามารถดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการฯ

๑. หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุดที่ ๐๒/๑๓๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มติที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) จำนวน ๓๙๗ แห่ง

ผลการดำเนินงานโครงการฯ

เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์

ลำดับ ที่	พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด)	พื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา		ในเขตชลประทาน พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา		รวม ทั้งสิ้น (แผน)	รวม ทั้งสิ้น (ผล)	หมายเหตุ
		จำนวน ๑,๔๖๐ แห่ง(ดำเนินการเอง)		จำนวน ๗๓๕ แห่ง (จ้างเจาะ)				
		แผน	ผล	แผน	ผล			
๑	กำแพงเพชร	๑๒๐	๑๒๐	๑๘๐	๑๗๓	๓๐๐	๒๙๓	น้ำน้อย
๒	ฉะเชิงเทรา	๕๐	๕๐	-	-	๕๐	-	
๓	ชัยนาท	๑๕๐	๑๕๐	๘๐	๘๐	๒๓๐	๒๓๐	
๔	ตาก	๓๐	๓๐	-	-	๓๐	-	
๕	นครนายก	๓๐	๓๐	๑๐	๑๐	๔๐	๑๐	
๖	นครปฐม	๒๐	๒๐	๑๕	๑๕	๓๕	๑๕	
๗	นครสวรรค์	๖๐	๖๐	๒๐	๒๐	๘๐	๒๐	
๘	ปทุมธานี	๒๐	๒๐	๑๐	๑๐	๓๐	๓๐	
๙	พระนครศรีอยุธยา	๓๐	๒๗	๑๐	๑๐	๔๐	๓๗	น้ำน้อย
๑๐	พิจิตร	๑๒๐	๑๒๐	๖๐	๖๐	๑๘๐	๑๘๐	
๑๑	พิษณุโลก	๑๕๐	๑๕๐	๖๐	๕๔	๒๑๐	๒๐๔	น้ำน้อย
๑๒	ลพบุรี	๘๐	๘๐	๔๐	๔๐	๑๒๐	๑๒๐	
๑๓	สระบุรี	๘๐	๘๐	๓๐	๒๗	๑๑๐	๑๐๗	น้ำน้อย
๑๔	สิงห์บุรี	๑๕๐	๑๕๐	๘๐	๘๐	๒๓๐	๒๓๐	
๑๕	สุโขทัย	๑๕๐	๑๕๐	๓๐	๓๐	๑๘๐	๑๘๐	
๑๖	สุพรรณบุรี	๙๐	๙๐	๕๐	๕๐	๑๔๐	๑๔๐	
๑๗	อ่างทอง	๑๓๐	๑๓๐	๖๐	๖๐	๑๙๐	๑๙๐	
รวมทั้งสิ้น		๑,๔๖๐	๑,๔๕๗	๗๓๕	๗๑๒	๒,๑๙๕	๒,๑๗๖	




โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)

พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง

กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน (แห่ง)	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	หมายเหตุ
ดำเนินการเอง	๑,๕๖๐	๑,๕๕๗	๙๙.๗๙	ไม่ดำเนินการ ๓ แห่ง
จ้างเหมาชุดเจาะ	๗๓๕	๗๑๙	๙๗.๘๒	ไม่ดำเนินการ ๑๖ แห่ง
รวม	๒,๑๙๕	๒,๑๗๖	๙๙.๑๓	รวมไม่ดำเนินการ ๑๙ แห่ง

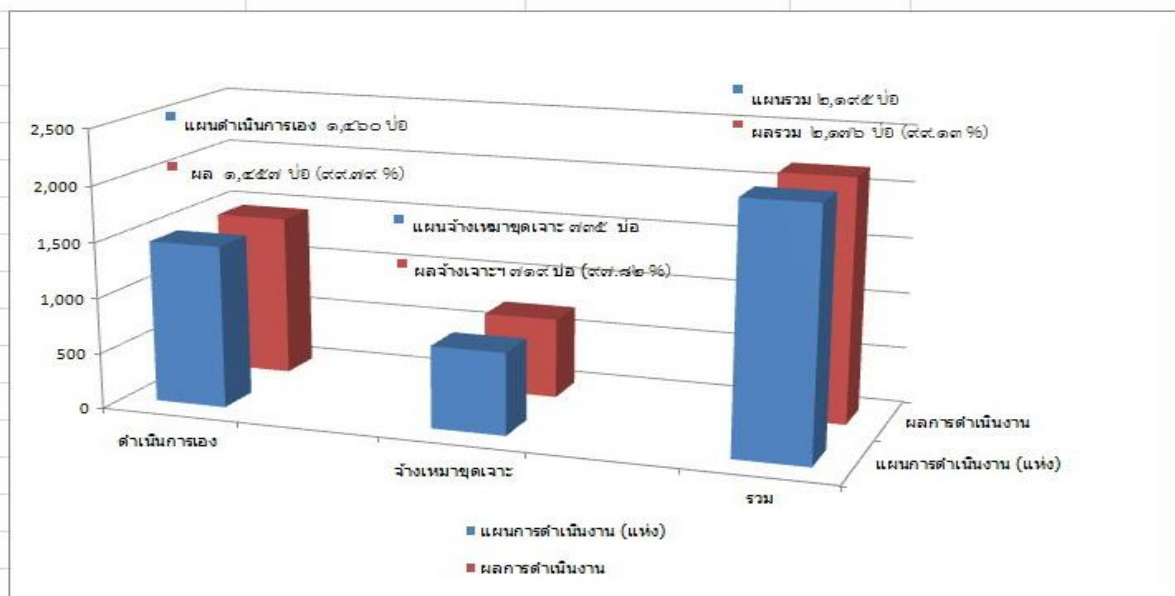


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งระยะเร่งด่วน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	หักคั่นคลัง (บาท)	ร้อยละ
๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๖๙,๘๘๓,๖๕๓.๕๒	๙๑.๐๕	๖๕,๘๗๙,๓๕๖.๔๘	๘.๙๕

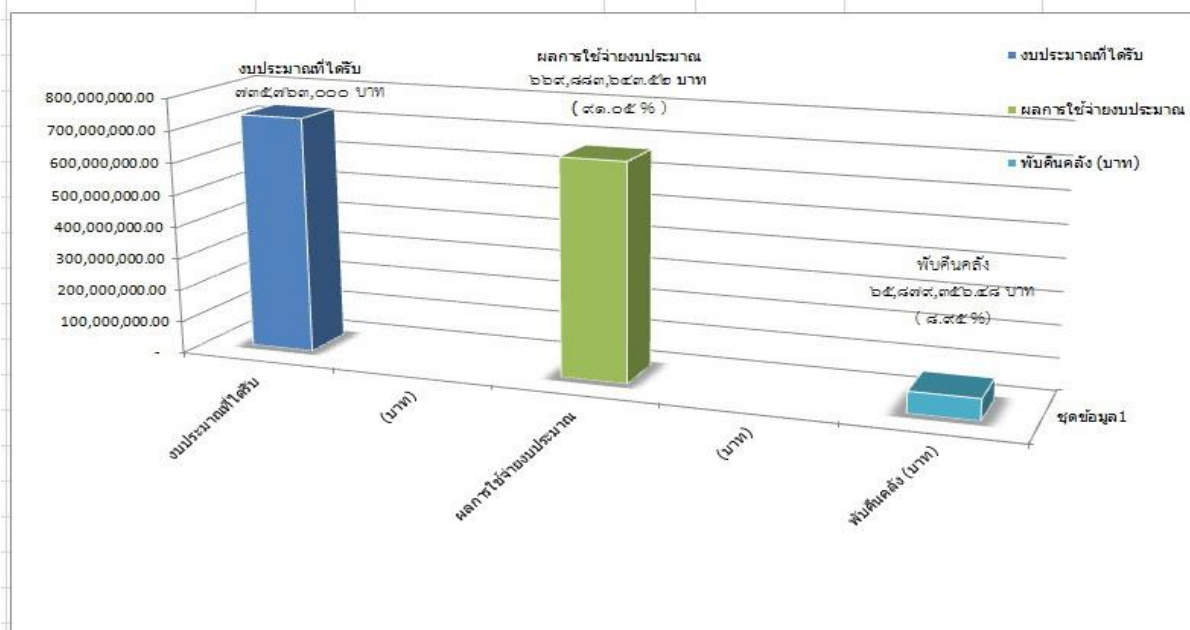



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	PO	รวม	คงเหลือ
ส่วนกลาง(สพบ.)	๕๑๙,๙๘๓,๘๕๐.๐๐	๓๒๖,๗๓๓,๑๙๓.๒๘	๑๕๗,๑๒๘,๓๐๐.๐๐	๔๘๓,๘๖๑,๔๙๓.๒๘	๓๖,๑๒๒,๓๕๖.๗๒
ส่วนภูมิภาค	๑๗๙,๕๖๖,๗๕๐.๐๐	๑๕๗,๐๔๙,๓๘๖.๐๐	-	๑๕๗,๐๔๙,๓๘๖.๐๐	๒๒,๕๑๗,๓๖๔.๐๐
สทบ.เขต ๒	๔๑,๖๕๑,๒๑๐.๐๐	๓๖,๘๒๕,๑๘๒.๑๘	-	๓๖,๘๒๕,๑๘๒.๑๘	๔,๘๒๖,๐๒๗.๘๒
สทบ.เขต ๓	๑๘,๒๔๖,๑๔๐.๐๐	๑๗,๓๗๑,๔๖๘.๙๖	-	๑๗,๓๗๑,๔๖๘.๙๖	๘๗๔,๖๗๑.๐๔
สทบ.เขต ๔	๓๑,๘๓๔,๐๔๐.๐๐	๒๘,๖๔๔,๐๓๒.๖๒	-	๒๘,๖๔๔,๐๓๒.๖๒	๓,๑๙๐,๐๐๗.๓๘
สทบ.เขต ๗	๔๐,๑๒๘,๘๓๐.๐๐	๓๒,๘๘๐,๓๐๑.๒๒	-	๓๒,๘๘๐,๓๐๑.๒๒	๗,๒๔๘,๕๒๘.๗๘
สทบ.เขต ๘	๑๒,๕๕๘,๘๓๐.๐๐	๑๑,๑๖๓,๘๓๐.๐๐	-	๑๑,๑๖๓,๘๓๐.๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐
สทบ.เขต ๙	๑๕,๖๑๒,๖๖๐.๐๐	๑๓,๑๘๒,๖๓๑.๘๐	-	๑๓,๑๘๒,๖๓๑.๘๐	๒,๔๓๐,๐๒๘.๒๐
สทบ.เขต ๑๐	๑๙,๔๙๕,๐๔๐.๐๐	๑๖,๙๘๑,๙๓๙.๒๒	-	๑๖,๙๘๑,๙๓๙.๒๒	๒,๕๑๓,๑๐๐.๗๘
กองบัญชาการ กองทัพไทย (เบิกแทน)	๓๖,๒๑๒,๔๐๐.๐๐	๓๖,๐๘๒,๙๙๓.๑๕	-	๓๖,๐๘๒,๙๙๓.๑๕	๑๒๙,๔๐๖.๘๕
รวมทั้งสิ้น	๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๑๙,๘๖๕,๕๗๒.๔๓	๑๕๗,๑๒๘,๓๐๐.๐๐	๖๗๖,๙๙๓,๘๗๒.๔๓	๕๘,๗๖๙,๑๒๗.๕๗

หมายเหตุ กองบัญชาการกองทัพไทย (เบิกแทน) ส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒๙,๔๐๖.๘๕ บาท

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบกลาง) จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐)

หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	PO	เบิกจ่าย PO	รวม	คงเหลือ
ส่วนกลาง (สพบ.)	๓๖, ๑๒๒,๓๕๖.๗๒	๗๙๖,๔๒๖.๐๐	๑๕๗,๑๒๘,๓๐๐.๐๐	๑๓๘,๕๘๗,๒๘๘.๐๐	๑๓๙,๓๘๓,๗๑๔.๐๐	๕๓,๘๖๖,๙๔๒.๗๒
ส่วนภูมิภาค	๒๒,๕๑๗,๓๖๔.๐๐	๑๐,๖๓๔,๓๕๗.๐๙	-	-	๑๐,๖๓๔,๓๕๗.๐๙	๑๑,๘๘๓,๐๐๖.๙๑
สทบ.เขต ๒	๔,๘๒๖,๐๒๗.๘๒	๔,๘๑๑,๐๖๗.๓๔	-	-	๔,๘๑๑,๐๖๗.๓๔	๑๔,๙๖๐.๔๘
สทบ.เขต ๓	๘๗๔,๖๗๑.๐๔	๘๗๐,๐๒๘.๕๐	-	-	๘๗๐,๐๒๘.๕๐	๔,๖๔๒.๕๔
สทบ.เขต ๔	๓,๑๙๐,๐๐๗.๓๘	๑,๙๗๗,๕๙๐.๐๐	-	-	๑,๙๗๗,๕๙๐.๐๐	๑,๒๑๒,๔๑๗.๓๘
สทบ.เขต ๗	๗,๒๔๘,๕๒๘.๗๘	๑,๘๕๕,๙๖๙.๒๕	-	-	๑,๘๕๕,๙๖๙.๒๕	๕,๓๙๒,๕๕๙.๕๓
สทบ.เขต ๘	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐
สทบ.เขต ๙	๒,๔๓๐,๐๒๘.๒๐	๑๘๑,๐๖๒.๐๐	-	-	๑๘๑,๐๖๒.๐๐	๒,๒๔๘,๙๖๖.๒๐
สทบ.เขต ๑๐	๒,๕๑๓,๑๐๐.๗๘	๙๓๘,๖๔๐.๐๐	-	-	๙๓๘,๖๔๐.๐๐	๑,๕๗๔,๔๖๐.๗๘
รวมทั้งสิ้น	๕๘,๖๓๙,๗๒๐.๗๒	๑๑,๔๓๐,๗๘๓.๐๙	๑๕๗,๑๒๘,๓๐๐.๐๐	๑๓๘,๕๘๗,๒๘๘.๐๐	๑๕๐,๐๑๘,๐๘๑.๐๙	๖๕,๒๐๙,๖๓๙.๖๓

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๖๖๙,๘๘๓,๖๔๓.๕๒ บาท จากงบประมาณที่ได้รับ

จำนวน ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือส่งคืนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๘๗๙,๓๕๖.๔๘ บาท

/ประโยชน์...



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ / ปริมาณน้ำต้นทุน

ปี พ.ศ.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย แล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) รูปแบบ ๒		
	จำนวน (แห่ง)	พื้นที่ (ไร่)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ล้าน ลบ.ม)
๒๕๕๙	๒,๑๗๖	๖๕,๒๘๐	๑๙๐.๖๑๗๖
รวมทั้งสิ้น	๒,๑๗๖	๖๕,๒๘๐	๑๙๐.๖๑๗๖

ปริมาณครุว์เรือนที่ได้รับประโยชน์ / ปริมาณน้ำใช้ได้

ปี พ.ศ.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย แล้งระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) รูปแบบ ๒		
	จำนวน (ครุว์เรือน)	พื้นที่ (ไร่)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ล้าน ลบ.ม)
๒๕๕๙	๖,๕๒๘	๖๕,๒๘๐	๑๒๕.๓๓๗๖
รวมทั้งสิ้น	๖,๕๒๘	๖๕,๒๘๐	๑๒๕.๓๓๗๖

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการฯ

๑. การปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ข้อกำหนด ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเพื่อ
กลั่นกรองและอนุมัติ
๒. การขาดแคลนอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลของผู้รับจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล (ท่อกรุ/ท่อเซาเร่)
๓. การเข้าพื้นที่ดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากมีฝนตก เกษตรกรกำลังดำเนินการเพาะปลูก
๔. ความซับซ้อนทางธรณีวิทยา ทำให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการเจาะบ่อน้ำ
บาดาลบางแบบใช้ไม่ได้ผล
๕. ความซ้ำซ้อนของพื้นที่ดำเนินงานของโครงการจากงบประมาณอื่น
๖. เครื่องจักรเจาะบ่อของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บางส่วนเป็นเครื่องจักรรุ่นเก่า มีขีดความสามารถ
เจาะได้ช้า บางส่วนชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ต้องหยุดทำการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง
๗. จำนวนเครื่องจักรและบุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานโครงการฯ
๘. พื้นที่ดำเนินงานบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่หาน้ำยาก (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้)



แนวทางการแก้ปัญหา

๑. การจัดทำแผนงานกรอบการทำงานที่ชัดเจน
๒. การหารือระหว่างรัฐและภาคเอกชน
๓. เอกชนผู้รับจ้างต้องมีการพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์ และบุคลากรของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
๔. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรจัดหาเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนของเก่า
๕. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรจะต้องมีการสำรวจและประเมินศักยภาพผิวน้ำบาดาลให้ทั่วถึงและมีความแม่นยำมากขึ้น โดยเห็นควรต้องดำเนินการที่ความลึกตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป
