โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 892 แห่ง

ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

	หน้า
1. ความเป็นมา	1
2. หลักการและเหตุผล	1
3. วัตถุประสงค์	1
4. เป้าหมาย	2
5. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน	2
6. พื้นที่ดำเนินการ	2
7. งบประมาณ	26
8. ระยะเวลาดำเนินงาน	26
9. ขั้นตอนการดำเนินงาน	26
10. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	36
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	36
12. การคัดเลือกพื้นที่	36
13. การอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ	37
13.1 ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน, แผนการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	42
13.2 รับโอนจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 892 แห่ง งบประมาณรวม 713,600,000 บาท	47
14. การจัดซื้อจัดจ้าง	50
15. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ	51
16. ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้	57
16.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558	57
16.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้	62
17. การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	68
18. ผลการดำเนินงานโครงการ	177
18.1 สรุปผลการดำเนินงาน งานเจาะบ่อน้ำบาดาลและงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 800 แห่ง	181
18.2 สรุปผลการเบิกจ่าย	194

สารบัญรูป

		หน้า
รูปที่ 1	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง	182
รูปที่ 2	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี	183
รูปที่ 3	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี	184
รูปที่ 4	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น	185
รูปที่ 5	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา	186
รูปที่ 6	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง	187
รูปที่ 7	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร	188
รูปที่ 8	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี	189
รูปที่ 9	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง	190
รูปที่ 10	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี	191
รูปที่ 11	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี	192
รูปที่ 12	ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา	193

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	กรอบสถานที่ราย สทบ. เขต 1-12 และรายจังหวัด	2
ตารางที่ 2	รายละเอียดสถานที่รายแห่ง จำนวน 892 แห่ง	3
ตารางที่ 3	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง	109
ตารางที่ 4	รายละเอียดการยกเลิกโครงการ จำนวน 91 แห่ง	111
ตารางที่ 5	รายละเอียดการยกเลิกโครงการ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 แห่ง	172
ตารางที่ 6	สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ของแต่ละ สทบ. เขต	177
ตารางที่ 7	ผลการดำเนินงานรายจังหวัด	178
ตารางที่ 8	สรุปผลการดำเนินงานราย สทบ. เขต	181

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ผลการดำเนินงานรายแห่ง จำนวน 892 แห่ง

1. ความเป็นมา

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำ พบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปัญหาอุทกภัย และคุณภาพน้ำ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยบูรณาการร่วมกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติให้กับประชาชนอย่างแท้จริง และสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการจึงได้ดำเนินการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล รวมทั้งกำกับดูแลทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเหมาะสมและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล

การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นปัญหาของประชาชนในชนบทของไทย สาเหตุเกิดจากสภาวการณ์ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้แหล่งน้ำผิวดินของชุมชนแห้ง พื้นที่เหล่านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้งมากบ้างน้อยบ้างเป็นประจำทุกปี บางปีสภาวการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นเกือบทั่วประเทศ รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้เฉพาะหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำสำหรับระบบประปาเท่านั้น ยังคงมีหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แหล่งน้ำผิวดินที่มีอยู่แห้ง และไม่มีบ่อน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองหรือมีบ่อน้ำบาดาลเดิมอยู่แล้วแต่ปริมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเฉพาะหน้าด้วยการนำน้ำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านทุกปี ซึ่งการเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่เหล่านี้จำเป็นต้องใช้วิชาการด้านอุทกธรณีชั้นสูงเพื่อสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล และต้องใช้บุคลากรเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลจะต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมกับช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีทักษะ จึงจะเจาะบ่อน้ำบาดาลได้มีประสิทธิภาพ ให้น้ำได้ในปริมาณมากเพียงพอแก่ความต้องการของชาวบ้าน

รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน จึงให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการตาม “แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ” ในระยะเร่งด่วน โดยการจัดหาระบบประปาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาและไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน โดยจัดทำ **“โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค”** ให้หมู่บ้านทั่วประเทศ มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดและสามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอในพื้นที่ทั่วประเทศ

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศมีระบบประปาบาดาลที่สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

2) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเชิงบูรณาการ

3) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

4) เพื่อส่งมอบระบบประปาบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย

1) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน โดยประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง มีแหล่งน้ำดิบและมีระบบประปาบาดาลสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอทุกฤดูกาล

2) เพื่อนำทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนหรือแหล่งน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมู่บ้านที่มีปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตในภาวะแล้ง

5. ความสอดคล้องสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค

6. พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ดำเนินการอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา รวม 54 จังหวัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 892 แห่ง

ตารางที่ 1 กรอบสถานที่ราย สทบ. เขต 1-12 และรายจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ	ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน
สทบ.เขต 1 จ.ลำปาง	1	เชียงราย	37
	2	เชียงใหม่	35
	3	น่าน	14
	4	พะเยา	27
	5	แพร่	2
	6	แม่ฮ่องสอน	1
	7	ลำปาง	7
	8	ลำพูน	2
	รวม		**125**
สทบ.เขต 2 จ.สุพรรณบุรี	9	กาญจนบุรี	0
	10	ชัยนาท	3
	11	นครสวรรค์	2
	12	สุพรรณบุรี	3
	13	อ่างทอง	0
	14	อุทัยธานี	0
	15	สิงห์บุรี	0
	16	พระนครศรีอยุธยา	1
	17	ปทุมธานี	0
	18	นนทบุรี	0
	รวม		**9**
สทบ.เขต 3 จ.สระบุรี	19	สระบุรี	0
	20	ลพบุรี	0
	21	นครนายก	1
	22	ปราจีนบุรี	9
	23	เพชรบูรณ์	14
	รวม		**24**
สทบ.เขต 4 จ.ขอนแก่น	24	กาฬสินธุ์	9
	25	ขอนแก่น	3
	26	มหาสารคาม	2
	27	หนองบัวลำภู	0
	28	เลย	2
	รวม		**16**
สทบ.เขต 5 จ.นครราชสีมา	29	นครราชสีมา	4
	30	ชัยภูมิ	3
	31	สุรินทร์	191
	32	บุรีรัมย์	46
	รวม		**244**

หน่วยงานรับผิดชอบ	ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน
สทบ.เขต 6 จ.ตรัง	33	นครศรีธรรมราช	62
	34	สุราษฎร์ธานี	6
	35	ชุมพร	18
	36	พังงา	2
	37	กระบี่	0
	38	ระนอง	0
	39	ภูเก็ต	0
	40	ตรัง	2
	รวม		**90**
สทบ.เขต 7 จ.กำแพงเพชร	41	กำแพงเพชร	2
	42	สุโขทัย	2
	43	อุตรดิตถ์	0
	44	พิษณุโลก	2
	45	พิจิตร	3
	46	ตาก	0
	รวม		**9**
สทบ.เขต 8 จ.ราชบุรี	47	นครปฐม	0
	48	ประจวบคีรีขันธ์	0
	49	เพชรบุรี	3
	50	ราชบุรี	1
	51	สมุทรสงคราม	0
	52	สมุทรสาคร	0
	53	สมุทรปราการ	1
	รวม		**5**
สทบ.เขต 9 จ.ระยอง	54	จันทบุรี	68
	55	ฉะเชิงเทรา	0
	56	ชลบุรี	0
	57	ตราด	0
	58	ระยอง	2
	59	สระแก้ว	1
	รวม		**71**
สทบ.เขต 10 จ.อุดรธานี	60	นครพนม	4
	61	มุกดาหาร	2
	62	สกลนคร	0
	63	หนองคาย	5
	64	อุดรธานี	7
	65	บึงกาฬ	6
	รวม		**24**

หน่วยงานรับผิดชอบ	ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน
สทบ.เขต 11 จ.อุบลราชธานี	66	อุบลราชธานี	24
	67	ยโสธร	2
	68	ร้อยเอ็ด	20
	69	ศรีสะเกษ	169
	70	อำนาจเจริญ	2
	รวม		**217**
สทบ.เขต 12 จ.สงขลา	71	นราธิวาส	38
	72	ยะลา	4
	73	ปัตตานี	2
	74	พัทลุง	3
	75	สงขลา	7
	76	สตูล	4
	รวม		**58**
	รวมทั้งหมด		**892**

ตารางที่ 2 รายละเอียดสถานที่รายแห่ง จำนวน 892 แห่ง

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	บ้านปางปูเลย	5	ป่าซาง	แม่จัน	เชียงราย
2	บ้านแม่ห่าง	7	ป่างิ้ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย
3	บ้านป่าฮ่างงาม	3	ทานตะวัน	พาน	เชียงราย
4	บ้านไร่	2	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย
5	บ้านป่าบง	4	แม่สรวย	แม่สรวย	เชียงราย
6	บ้านร่องเจริญ	7	แม่สรวย	แม่สรวย	เชียงราย
7	บ้านปางห้า	1	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย
8	บ้านป่าแดง	5	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย
9	บ้านม่วงคำ	7	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย
10	บ้านศรีชัยภูมิ	10	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย
11	บ้านห้วยสลัก	21	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย
12	บ้านทุ่งเกลี้ยง	6	ศรีเมืองชุม	แม่สาย	เชียงราย
13	บ้านศรีป่าสัก	9	ศรีเมืองชุม	แม่สาย	เชียงราย
14	บ้านศรีดอนเรือง	5	เมืองชุม	เวียงชัย	เชียงราย
15	บ้านเวียงใต้	3	เวียง	เชียงแสน	เชียงราย
16	บ้านป่ารวก	4	ธารทอง	พาน	เชียงราย
17	บ้านสันมะแฟน	6	ธารทอง	พาน	เชียงราย
18	บ้านป่ารวกใต้	9	ธารทอง	พาน	เชียงราย
19	บ้านผาวี	8	ป่าหุ่ง	พาน	เชียงราย
20	บ้านหนองหม้อ	9	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย
21	บ้านป่าตึง	10	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย
22	บ้านหนองหม้อใหม่	19	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย
23	บ้านโพธิ์งาม	20	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย
24	บ้านประตูล้อ	21	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย
25	บ้านป่ากว๋าว	1	แม่ไร่	แม่จัน	เชียงราย
26	บ้านดงมะตื๋น	5	แม่ไร่	แม่จัน	เชียงราย
27	บ้านห้วยหวาย	2	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย
28	บ้านร่องศาลา	3	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย
29	บ้านท่าสันกลาง	14	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย
30	บ้านร่องคตสามัคคี	10	ทานตะวัน	พาน	เชียงราย
31	บ้านเขื่อนแก้ว	9	ท่าสาย	เมืองเชียงราย	เชียงราย
32	บ้านร่องลึก	13	สันกลาง	พาน	เชียงราย
33	บ้านแควว้ัวคำ	12	แม่ยาว	เมืองเชียงราย	เชียงราย
34	บ้านออบเสือแหวน	15	แม่ยาว	เมืองเชียงราย	เชียงราย
35	บ้านใหม่บัวแดง	15	แม่ข้าวต้ม	เมืองเชียงราย	เชียงราย
36	บ้านห้วยอ้ม	8	แม่ข้าวต้ม	เมืองเชียงราย	เชียงราย
37	บ้านห้วยอ้มใหญ่	9	แม่ข้าวต้ม	เมืองเชียงราย	เชียงราย

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
38	บ้านเชียงดาว	6	เชียงดาว	เชียงดาว	เชียงใหม่
39	บ้านบวกห้า	18	บ้านแปะ	จอมทอง	เชียงใหม่
40	บ้านศรีสะอาด	15	เชียงดาว	เชียงดาว	เชียงใหม่
41	บ้านทุ่งข้าวพวง	3	ทุ่งข้าวพวง	เชียงดาว	เชียงใหม่
42	บ้านม่วงโง้ม	9	เมืองงาย	เชียงดาว	เชียงใหม่
43	บ้านหนองบัว	11	เมืองงาย	เชียงดาว	เชียงใหม่
44	บ้านปางตองนอก	11	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่
45	บ้านห้วยโจ้	4	แม่นะ	เชียงดาว	เชียงใหม่
46	บ้านสบอ้อ	7	แม่นะ	เชียงดาว	เชียงใหม่
47	บ้านแก่งปันเต๊า	10	แม่นะ	เชียงดาว	เชียงใหม่
48	บ้านห้วยโจ้	4	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่
49	บ้านหล่ายฝาง	6	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่
50	บ้านสันต้นเปา	7	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่
51	บ้านใหม่หล่ายฝาง	10	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่
52	บ้านห้วยโจ้เหนือ	13	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่
53	บ้านแม่งอนสันติสุข	14	แม่งอน	ฝาง	เชียงใหม่
54	บ้านหนองยาวใต้	16	แม่สูน	ฝาง	เชียงใหม่
55	บ้านหนองยาวเหนือ	17	แม่สูน	ฝาง	เชียงใหม่
56	บ้านหนองอึ่ง	3	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่
57	บ้านสวนดอก	4	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่
58	บ้านต้นหนุน	5	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่
59	บ้านแม่ใจใต้	7	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่
60	บ้านสันกลาง	5	ป่าไหน่	พร้าว	เชียงใหม่
61	บ้านขามสุ่มนอก	6	สันทราย	พร้าว	เชียงใหม่
62	บ้านแม่ปาคี	12	สันทราย	พร้าว	เชียงใหม่
63	บ้านแม่ทัง	5	หางดง	ฮอด	เชียงใหม่
64	บ้านโค้งงาม	7	หางดง	ฮอด	เชียงใหม่
65	บ้านทุ่งฟ้าบด	1	มะขามหลวง	สันป่าตอง	เชียงใหม่
66	บ้านพนัง	3	ทุ่งสะโตก	สันป่าตอง	เชียงใหม่
67	บ้านตาลใต้	3	บ้านตาล	ฮอด	เชียงใหม่
68	บ้านป้อก	5	สะเมิงเหนือ	สะเมิง	เชียงใหม่
69	บ้านยางเปียง	2	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่
70	บ้านยางครก	7	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่
71	บ้านดอย	13	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่
72	บ้านยางเปียงใต้	16	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่
73	บ้านปากนาย	17	นาทะนุง	นาหมื่น	น่าน
74	บ้านนาน้อย	4	นาน้อย	นาน้อย	น่าน
75	บ้านใหม่	8	ส้าน	เวียงสา	น่าน
76	บ้านพระเนตร	2	ส้าน	เวียงสา	น่าน

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
77	บ้านโปร่ง	7	ส้าน	เวียงสา	น่าน
78	บ้านป่าหัด	2	ปัว	ปัว	น่าน
79	บ้านนาป่าน	1	สถาน	ปัว	น่าน
80	บ้านห้วนสาวแลว	8	ไชยวัฒนา	ปัว	น่าน
81	บ้านสกาดกลาง	2	สกาด	ปัว	น่าน
82	บ้านสกาดเหนือ	1	สกาด	ปัว	น่าน
83	บ้านสร้อยพร้าว	5	พระธาตุ	เชียงกลาง	น่าน
84	บ้านห้วยแก้ว	7	พระธาตุ	เชียงกลาง	น่าน
85	บ้านป่าเปือย	7	ปอน	ทุ่งช้าง	น่าน
86	บ้านใหม่	5	ปอน	ทุ่งช้าง	น่าน
87	บ้านแม่ต๋ำน้อย	18	แม่กา	เมืองพะเยา	พะเยา
88	บ้านแม่ต๋ำบุญโยง	11	แม่กา	เมืองพะเยา	พะเยา
89	บ้านแม่ต๋ำบุญโยง	8	แม่กา	เมืองพะเยา	พะเยา
90	บ้านปางพริก	3	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา
91	บ้านห้วยทรายคำ	8	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา
92	บ้านร่องไผ่ใต้	10	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา
93	บ้านร่องไผ่เหนือ	9	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา
94	บ้านห้วยต้นตุ้มใต้	6	ห้วยลาน	ดอกคำใต้	พะเยา
95	บ้านจุนรัชดา	17	จุน	จุน	พะเยา
96	บ้านใหม่กาญจนา	15	จุน	จุน	พะเยา
97	บ้านสันทราย	3	แม่ปืม	เมืองพะเยา	พะเยา
98	บ้านแม่สุก	2	แม่สุก	แม่ใจ	พะเยา
99	บ้านทุ่งรวงทอง	9	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา
100	บ้านสิบสองพัฒนา	7	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา
101	บ้านปางค่า	1	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา
102	บ้านปางมะโอ	4	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา
103	บ้านสันสลี	7	เจริญราษฎร์	แม่ใจ	พะเยา
104	บ้านดงบุญนาค	7	บ้านเหล่า	แม่ใจ	พะเยา
105	บ้านป่าแฝกกลาง	2	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา
106	บ้านป่าแฝกดอย	4	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา
107	บ้านป่าแฝกใต้	5	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา
108	บ้านสระวังทอง	10	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา
109	บ้านแม่เย็นนอก	8	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา
110	บ้านแม่เย็นใต้	1	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา
111	บ้านหนองสระ	6	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา
112	บ้านทุ่งติ้ว	6	ภูซาง	ภูซาง	พะเยา
113	บ้านฮวด	3	ภูซาง	ภูซาง	พะเยา
114	บ้านลูนิเกตุ	1	ห้วยหม้าย	สอง	แพร่
115	บ้านลูนิเกตุ	9	ห้วยหม้าย	สอง	แพร่

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
116	บ้านไร่ (ดงสะงัด)	6	แม่สะเรียง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน
117	บ้านโต้ง	1	แม่พริก	แม่พริก	ลำปาง
118	บ้านแม่วะศรีบุญเรือง	6	แม่วะ	เถิน	ลำปาง
119	บ้านนิคมเขต4	4	นิคมพัฒนา	เมืองลำปาง	ลำปาง
120	บ้านวังสัก	10	แจ้ห่ม	แจ้ห่ม	ลำปาง
121	บ้านสบฟ้า	7	แจ้ห่ม	แจ้ห่ม	ลำปาง
122	บ้านบนทุ่ง	9	ทุ่งฮั้ว	วังเหนือ	ลำปาง
123	บ้านแม่ทรายเงิน	2	ทุ่งฮั้ว	วังเหนือ	ลำปาง
124	บ้านปู	3	ลี้	ลี้	ลำพูน
125	บ้านบ่อแฮ้ว	3	ต้นธง	เมืองลำพูน	ลำพูน
126	บ้านโคกจันทน์	5	โพนางดำตก	สรรพยา	ชัยนาท
127	บ้านบางเสวย	4	โพนางดำตก	สรรพยา	ชัยนาท
128	บ้านคงคาราม	3	โพนางดำตก	สรรพยา	ชัยนาท
129	บ้านสอนจันทร์	12	หนองโพ	ตาคลี	นครสวรรค์
130	บ้านตะกรุดแรต	16	หนองบัว	หนองบัว	นครสวรรค์
131	บ้านหนองหมัน	15	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี
132	บ้านบางบอน	5	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี
133	บ้านไผ่ช่องลม	7	บางเลน	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี
134	บ้านอ้อย	7	อุทัย	อุทัย	พระนครศรีอยุธยา
135	บ้านคลองหนึ่ง	2	ทรายมูล	องครักษ์	นครนายก
136	บ้านวังกวาง	11	วังท่าช้าง	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี
137	บ้านหอย	1	บ้านหอย	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี
138	บ้านเกาะแดง	7	บ้านหอย	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี
139	บ้านแปลงประดู่	2	หนองโพรง	ศรีมหาโพธิ	ปราจีนบุรี
140	บ้านโนนห้อม	4	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
141	บ้านเหล่าบุตร	6	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
142	บ้านขอม	8	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
143	บ้านม่วงแฝก	10	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
144	บ้านทุ่งตะลุมพุก	12	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
145	บ้านซับไพเราะ	3	ซับไม้แดง	บึงสามพัน	เพชรบูรณ์
146	บ้านบ่อตาสัก	10	ซับไม้แดง	บึงสามพัน	เพชรบูรณ์
147	บ้านซับตะเคียน	8	ซับสมอทอด	บึงสามพัน	เพชรบูรณ์
148	บ้านท่ากกตาล	6	ดงมูลเหล็ก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
149	บ้านพลำ	6	ป่าเลา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
150	บ้านใหม่ซับเจริญ	8	ซับสมบูรณ์	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์
151	บ้านซับโอบ	8	ภูน้ำหยด	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์
152	บ้านวังทองสามัคคี	9	วังใหญ่	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์
153	บ้านห้วยมะยม	6	นาแซง	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์
154	บ้านหล่มเก่า	5	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
155	บ้านพรวน	9	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์
156	บ้านบุ่งน้ำเต้า	1	บุ่งน้ำเต้า	หล่มสัก	เพชรบูรณ์
157	บ้านห้วยคณฑา	9	บุ่งน้ำเต้า	หล่มสัก	เพชรบูรณ์
158	สำนักสงฆ์เอี่ยมสำอางค์ บ้านธนิตคำเที่ยง	2	ริมสีม่วง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์
159	บ้านกุดหว้า	2	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์
160	บ้านดอนอุมรัว	8	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์
161	บ้านบัวขาว	9	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์
162	บ้านโนนสวรรค์	10	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์
163	บ้านบัวขาว	15	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์
164	บ้านคำดอกซ้อน	7	นามะเขือ	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์
165	บ้านหนองแสงใต้	14	สำราญใต้	สามชัย	กาฬสินธุ์
166	บ้านคำชมภู	7	ภูสิงห์	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์
167	บ้านโนนทับช้าง	5	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์
168	บ้านจรเข้สงเคราะห์	2	ทุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น
169	บ้านโนนอินทร์แปลง	3	ทุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น
170	บ้านทรัพย์สมบูรณ์	4	ทุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น
171	บ้านหนองแวง	16	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม
172	บ้านไก่เฒ่า	20	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม
173	บ้านป่าหวายพัฒนา	6	นาด้วง	นาด้วง	เลย
174	บ้านราษฎร์ประดิษฐ์	8	นาด้วง	นาด้วง	เลย
175	บ้านสุขสำราญ	13	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา
176	บ้านโนนพยอม	4	ช้างทอง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา
177	บ้านหนองตะคลอง	1	หนองบัวศาลา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา
178	บ้านแฝก	3	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา
179	บ้านหินลาด	4	ชีบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ
180	บ้านเทพนิมิตร	12	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ
181	บ้านใหม่หนองแดง	9	ชีบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ
182	บ้านโนนมะยาง	6	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์
183	บ้านเกษตรสมบูรณ์	11	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์
184	บ้านไทยนิยม	17	บักได	พนมดงรัก	สุรินทร์
185	บ้านพนมดิน	3	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์
186	บ้านตาเมียง	12	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์
187	บ้านใหม่พัฒนา	5	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์
188	บ้านคลองเจริญ	12	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์
189	บ้านประดู่	8	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์
190	บ้านพาชื่น	10	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์
191	บ้านน้อยแสนสุข	12	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์
192	บ้านวังทอง	15	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
193	บ้านโคกพยุง	6	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์
194	บ้านจารย์	6	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์
195	บ้านประคำ	4	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์
196	บ้านโคกยาว	2	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์
197	บ้านโนนค้อทอง	8	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์
198	บ้านโคกลาว	9	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์
199	บ้านไทรงาม	8	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์
200	บ้านโคกเจริญ	9	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์
201	บ้านสะเดาพัฒนา	12	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์
202	บ้านตะเพรา	8	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์
203	บ้านห้วยสำเริง	8	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์
204	บ้านตาไทย	4	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์
205	บ้านหนองตายึง	16	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์
206	บ้านเสกกอง	3	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์
207	บ้านหมื่นสังข์	4	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์
208	บ้านโอรุณ	10	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์
209	บ้านมะเมียง	4	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์
210	บ้านหนองระหาร	13	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์
211	บ้านอามุย	3	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์
212	บ้านถนนชัย	8	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์
213	บ้านพรสุข	12	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์
214	บ้านโชคนาสาม	1	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์
215	บ้านสำโรง	5	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์
216	บ้านปะปูล	13	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์
217	บ้านสะเดา	1	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์
218	บ้านโสน	7	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์
219	บ้านสังแก	2	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์
220	บ้านสวายตาพึง	15	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์
221	บ้านโคกไทรงาม	12	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์
222	บ้านห้วยเสนง	14	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์
223	บ้านทำนบ	4	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์
224	บ้านชัยมงคล	13	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์
225	บ้านโคกจราบ	8	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์
226	บ้านตาโมม	3	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์
227	บ้านสระ	2	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์
228	บ้านจบก	19	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์
229	บ้านแยง	3	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์
230	บ้านธรรมราช	2	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์
231	บ้านสระ	18	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
232	บ้านหนองเหล็ก	9	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์
233	บ้านหนองกุง	10	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์
234	บ้านหนองบัว	17	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์
235	บ้านเพชรจังวา	7	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์
236	บ้านโพธิ์พัฒนา	16	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์
237	บ้านเดือยไก่แก้ว	11	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์
238	บ้านสามแยก	14	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์
239	บ้านตลาด	10	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์
240	บ้านโคกเพชร	15	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์
241	บ้านกระทม	9	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์
242	บ้านใหม่	2	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์
243	บ้านโคกยาง	1	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์
244	บ้านตะเคียน	1	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์
245	บ้านจรูกแขวะ	8	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์
246	บ้านดง	3	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์
247	บ้านหนองคู	6	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์
248	บ้านโคกวัด	14	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์
249	บ้านตาปุม	5	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์
250	บ้านกาเกาะ	9	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
251	บ้านโคกสะอาด	9	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์
252	บ้านสนวน	1	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์
253	บ้านผักไหม	16	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
254	บ้านโคกมะกะ	7	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์
255	บ้านแสงทรัพย์	13	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
256	บ้านเสม็ด	13	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
257	บ้านตระแบก	6	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์
258	บ้านอำปึล	3	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์
259	บ้านแจรน	5	ตาอ็อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
260	บ้านสวาย	11	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
261	บ้านตาเพชร	7	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
262	บ้านประวิทย์	2	บุแกรง	จอมพระ	สุรินทร์
263	บ้านยางน้อย	6	หนองเมธี	ท่าตูม	สุรินทร์
264	บ้านพิงพวย	4	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์
265	บ้านน้ำสร้าง	13	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์
266	บ้านเหล่าม่วง	11	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์
267	บ้านนางเภา	10	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์
268	บ้านบึงน้อย	9	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์
269	บ้านยางน้อย	13	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์
270	บ้านระไชร์	10	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
271	บ้านกันตรง	8	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์
272	บ้านกะเตียว	6	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์
273	บ้านเบาะอุ่น	8	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์
274	บ้านสกอร์	12	บักได	พนมดงรัก	สุรินทร์
275	บ้านนากลาง	8	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์
276	บ้านโคกหิน	10	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์
277	บ้านสะกาด	1	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์
278	บ้านหนองสลัม	15	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์
279	บ้านอำปึล	6	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์
280	บ้านสนวน	6	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์
281	บ้านน้ำซับ	20	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์
282	บ้านคอนสวรรค์	10	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์
283	บ้านตาสอน	11	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์
284	บ้านตระแบกน้อย	5	แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
285	บ้านหนองคูน้อย	2	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์
286	บ้านยางเก่า	13	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์
287	บ้านหนองบาก	19	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์
288	บ้านโนนก่อ	12	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์
289	บ้านขี้ตุ่น	9	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์
290	บ้านโบก	13	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์
291	บ้านสองห้อง	9	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์
292	บ้านหนองผาย	17	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์
293	บ้านโพธิ์น้อย	5	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์
294	บ้านหนองบัวงาม	2	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์
295	บ้านสะเดา	5	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์
296	บ้านทนง	1	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์
297	บ้านขนาด	6	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์
298	บ้านโคกกลัน	7	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์
299	บ้านแสรโบราณ	4	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์
300	บ้านปราสาท	6	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์
301	บ้านโสนกพัฒนา	11	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์
302	บ้านกล้วย	6	ศรีสุข	ศรีณรงค์	สุรินทร์
303	บ้านหนองมะแซว	11	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์
304	บ้านหนองหว้า	4	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์
305	บ้านสำโรง	3	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์
306	บ้านสำโรง	10	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์
307	บ้านหนองสิม	14	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์
308	บ้านโคกสะอาด	15	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์
309	บ้านนิคมซอย3	13	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
310	บ้านโคกแดง	12	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
311	บ้านอลงกรณ์	15	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
312	บ้านกูน	2	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
313	บ้านโคกโพธิ์	16	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
314	บ้านโคกตะแบง	8	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
315	บ้านหนองก้านเหลือง	11	หนองฮะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์
316	บ้านตราด	14	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
317	บ้านโคกเบง	6	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
318	บ้านโคกจ๊ะ	4	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์
319	บ้านนาครอง	5	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์
320	บ้านโนง	5	ศรีสุข	ศรีณรงค์	สุรินทร์
321	บ้านใหม่ไทยเจริญ	12	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์
322	บ้านกระแสร์อุดม	9	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์
323	บ้านหนองบัว	8	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์
324	บ้านสว่าง	12	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์
325	บ้านกุดหวาย	7	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์
326	บ้านแก่นเมธี	6	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์
327	บ้านตาเมือน	9	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์
328	บ้านกันจาน	11	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์
329	บ้านโคกยางชุม	4	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์
330	บ้านเตาแดก	6	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์
331	บ้านโคกสง่า	3	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์
332	บ้านโคกสะอาด	2	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์
333	บ้านจบก	4	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์
334	บ้านห้วยราช	9	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์
335	บ้านไผ่	8	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์
336	บ้านขวาว	5	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์
337	บ้านสนิท	1	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์
338	บ้านวารไพรศรี	6	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์
339	บ้านโนนกลาง	9	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์
340	บ้านหนองขอน	2	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์
341	บ้านโคกสะอาด	3	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์
342	บ้านตาปิม	5	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์
343	บ้านแสนทอง	7	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์
344	บ้านสะเดาน้อย	9	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์
345	บ้านตาวัง	1	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์
346	บ้านแสนสำราญ	5	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์
347	บ้านทะลอกกอง	9	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
348	บ้านโคกใหญ่	18	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
349	บ้านไทรงาม	10	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์
350	บ้านตาเดาะ	9	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์
351	บ้านรันเดง	3	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์
352	บ้านละเบิก	13	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์
353	บ้านโคกละลอก	17	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์
354	บ้านอังกัญโพธิ์	4	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์
355	บ้านหนองยาว	8	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์
356	บ้านสมุด	7	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์
357	บ้านโคกทม	16	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์
358	บ้านโคกปราสาท	10	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
359	บ้านจลง	14	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
360	บ้านเฉนียง	8	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
361	บ้านขุนไชย	12	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
362	บ้านระหาร	6	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
363	บ้านไผ่	14	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์
364	บ้านสมบูรณ์	3	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์
365	บ้านโนนกลาง	9	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์
366	บ้านบวรรัตน์	11	อู่โลก	ลำดวน	สุรินทร์
367	บ้านโคกกระโดน	9	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์
368	บ้านกระสัง	8	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์
369	บ้านโชคเหนือ	1	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์
370	บ้านสกร็อม	8	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์
371	บ้านเชิงอะ	5	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์
372	บ้านสองชั้น	14	นาดี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
373	บ้านบุ่งช้าง	8	สระทอง	หนองหงษ์	บุรีรัมย์
374	บ้านถนน	11	กระสัง	กระสัง	บุรีรัมย์
375	บ้านสำโรง	5	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์
376	บ้านหนองโสน	11	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์
377	บ้านติม	11	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์
378	บ้านทุ่งสว่าง	7	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์
379	บ้านท่าม่วง	10	หินเหล็กไฟ	คูเมือง	บุรีรัมย์
380	บ้านไทรโยง	8	ละลวด	ชำนิ	บุรีรัมย์
381	บ้านหนองนาโคกสูง	5	ทรัพย์พระยา	นางรอง	บุรีรัมย์
382	บ้านบุ	17	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์
383	บ้านกระสัง	4	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์
384	บ้านโคกกี่	8	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์
385	บ้านไพบูลย์	9	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์
386	บ้านกระสัง	4	ประทัดบุ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์
387	บ้านหนองมะเขือ	2	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
388	บ้านไทรโยง	8	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์
389	บ้านตาพระ	5	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์
390	บ้านทะเมนชัย	13	โคกขมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์
391	บ้านตะโกรี	3	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์
392	บ้านสว่างงิ้วงาม	8	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
393	บ้านหนองสะแบง	6	ท่าโพธิ์ชัย	หนองกี่	บุรีรัมย์
394	บ้านหนองน้ำขุ่น	8	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์
395	บ้านชำแระ	10	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์
396	บ้านทางโค้ง	13	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์
397	บ้านหนองสะแก	5	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์
398	บ้านฟากคลอง	6	ลำไทรโยง	นางรอง	บุรีรัมย์
399	บ้านสะเดา	6	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์
400	บ้านสี่เหลี่ยมน้อย	8	หนองโสน	นางรอง	บุรีรัมย์
401	บ้านโสนน้อยพัฒนา	12	หนองโสน	นางรอง	บุรีรัมย์
402	บ้านแสลงโทน	1	แสลงโทน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์
403	บ้านประดู่	7	สำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์
404	บ้านดอนพยอม	5	หายโศก	พุทไธสง	บุรีรัมย์
405	บ้านหนองไทรงาม	21	ชุมเห็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
406	บ้านผึ้งต้น	8	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
407	บ้านบุ	6	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
408	บ้านยางน้อย	3	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
409	บ้านโคกลำดวน	9	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
410	บ้านขาชันโลง	2	ลุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
411	บ้านโคกเพชร	11	ลุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
412	บ้านหนองม่วง	2	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
413	บ้านหนองจอก	19	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
414	บ้านโคกเก่า	4	หลักเขต	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
415	บ้านสระแร่	8	หนองกะทิง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์
416	บ้านโคกอิสระ	10	นิคม	สตึก	บุรีรัมย์
417	บ้านพงสวรรค์	12	สนามชัย	สตึก	บุรีรัมย์
418	บ้านศรีสง่า	4	ทุ่งกระตาดพัฒนา	หนองกี่	บุรีรัมย์
419	บ้านนาสัญญา	5	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
420	บ้านคลองสาย	4	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
421	บ้านห้วยปริก (ชายคลอง)	1	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
422	บ้านชะเมา	6	ท่าเรือ	เมือง นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
423	บ้านปลายสระ	4	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
424	บ้านปากเสียวใต้	2	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช
425	บ้านโคกหาด	7	ไสหร้า	ฉวาง	นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
426	บ้านทุ่งนาใหม่	4	ยางค้อม	พิปูน	นครศรีธรรมราช
427	บ้านต้นเหลียง	14	เสาเภา	สิชล	นครศรีธรรมราช
428	บ้านเขาคา	11	เสาเภา	สิชล	นครศรีธรรมราช
429	บ้านไทรขาม	6	ดอนตะโก	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
430	บ้านโพธิ์	1	ไทยบุรี	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
431	บ้านบนโพธิ์	5	ท่าดี	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
432	บ้านวัวหลุง	5	ควนชุม	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
433	บ้านทุ่งเลน	4	ควนชุม	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
434	บ้านเหนือคลอง	2	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
435	บ้านท่าแห้ง	3	นาแว	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
436	บ้านโคกข่อย	1	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
437	บ้านบางไทร	9	บางศาลา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
438	บ้านบางยัง	8	บางศาลา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
439	บ้านสระโพธิ์	3	บ้านกลาง	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช
440	บ้านสวนเรียน	9	เขาพระบาท	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช
441	บ้านบางเข็ม	7	บางศาลา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
442	บ้านคลองแดน	12	เชียรเขา	เฉลิมพระเกียรติ	นครศรีธรรมราช
443	บ้านในกลอง	5	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
444	บ้านเกาะป่ายาง	6	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
445	บ้านเขาวง	2	บ้านนิคม	บางขัน	นครศรีธรรมราช
446	บ้านค้อ	4	เกาะทวด	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
447	บ้านโคกวัว	3	บางตะพง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
448	บ้านจันดี	3	จันดี	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
449	บ้านตลาดบ้านตูล	1	บ้านตูล	ชะอวด	นครศรีธรรมราช
450	บ้านฉาง	3	เสือหึง	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช
451	บ้านในอ่าว	1	บ้านเนิน	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช
452	บ้านดอนโรง	8	เขาพระบาท	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช
453	บ้านต้นไทร	8	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
454	บ้านหนองท่อม	5	ไม้เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
455	บ้านสวนจีน	9	ไสหร้า	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
456	บ้านปากกา	3	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
457	บ้านหัวควน	6	ควนชุม	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
458	บ้านในหมง	6	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
459	บ้านในทับ	3	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
460	บ้านเขาปูน	8	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช
461	บ้านมะม่วงกวาง	6	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
462	บ้านวังไทร	7	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
463	บ้านสานขุน	6	เขาแก้ว	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
464	บ้านนิคมสมสรร	8	บ้านนิคม	บางขัน	นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
465	บ้านเขาอม	5	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช
466	บ้านคอกวัว	3	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช
467	บ้านใสพลู	8	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช
468	บ้านสี่สาออก	11	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช
469	บ้านคลองเพียร (เผี่ยนล่าง)	5	เทพราช	สิชล	นครศรีธรรมราช
470	บ้านพังกำ	9	ฉลอง	สิชล	นครศรีธรรมราช
471	บ้านควนเย็น	14	นาบอน	นาบอน	นครศรีธรรมราช
472	บ้านริมเขื่อน	10	ท่าพยา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช
473	บ้านท่าสูงบน	4	ท่าศาลา	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
474	บ้านทุ่งหล่อ	7	ควนชุม	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
475	บ้านวังงู	4	เสาธง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช
476	บ้านปากเสียว	3	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช
477	บ้านชายทุ่ง	6	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช
478	บ้านตรอกแค	4	ไสหร้า	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
479	บ้านฝ่ายท่า	11	นาแว	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
480	บ้านนา	1	ช้างกลาง	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช
481	บ้านบางคราม	2	ปากฉลุย	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี
482	บ้านในปราบ	5	บ้านเสด็จ	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี
483	บ้านบางไต	16	ตะกุกเหนือ	วิภาวดี	สุราษฎร์ธานี
484	บ้านหน้าฮะ	3	เขาพัง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี
485	บ้านควนอารี	9	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี
486	บ้านสี่แยกสามัคคี	10	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี
487	บ้านทุ่งคาใหญ่	1	ทุ่งคา	เมืองชุมพร	ชุมพร
488	บ้านทุ่งคาน้อย	2	ทุ่งคา	เมืองชุมพร	ชุมพร
489	บ้านบากแดง	12	วังตะกอ	หลังสวน	ชุมพร
490	บ้านเขายาว	9	วิสัยเหนือ	เมืองชุมพร	ชุมพร
491	บ้านดอนโชน	12	วิสัยเหนือ	เมืองชุมพร	ชุมพร
492	บ้านทรายทอง	6	นาชะอัง	เมืองชุมพร	ชุมพร
493	บ้านนาปรือ	4	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร
494	บ้านเขาวง	6	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร
495	บ้านเขาล้าน	8	ครน	สวี	ชุมพร
496	บ้านปลายกริม	10	ครน	สวี	ชุมพร
497	บ้านท่าหิน	5	ท่าหิน	สวี	ชุมพร
498	บ้านคลองหงาว	9	หาดยาย	หลังสวน	ชุมพร
499	บ้านชุมแสง	10	หาดยาย	หลังสวน	ชุมพร
500	บ้านหินช้างสี	13	วังตะกอ	หลังสวน	ชุมพร
501	บ้านสันตินิมิตร	10	รับร่อ	ท่าแซะ	ชุมพร
502	บ้านหาดใน	2	รับร่อ	ท่าแซะ	ชุมพร

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
503	บ้านนาเหรี่ยง	1	ครน	สวี	ชุมพร
504	บ้านช่องรอ	11	ครน	สวี	ชุมพร
505	บ้านนาป่าตอ	5	โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา
506	บ้านตะวันออก	13	โคกกลอย	ตะกั่วทุ่ง	พังงา
507	บ้านแหลมไทร	3	เขาไม้แก้ว	สิเกา	ตรัง
508	บ้านหนองผักฉีด	5	สุโสะ	ปะเหลียน	ตรัง
509	บ้านเนินกรวด	4	ลานดอกไม้ตก	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร
510	บ้านโนนใน	8	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร
511	บ้านหนองจิกกรี	4	หนองหญ้าปล้อง	บ้านด่านลานหอย	สุโขทัย
512	บ้านดอนเพชร	20	แม่สิน	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย
513	บ้านหัวนา	4	เนินเพิ่ม	นครไทย	พิษณุโลก
514	บ้านห้วยทรายทอง	7	บ้านพร้าว	นครไทย	พิษณุโลก
515	บ้านนาเหนือ	11	บ้านนา	วชิรบารมี	พิจิตร
516	บ้านหนองสนวนเหนือ	2	ห้วยร่วม	ดงเจริญ	พิจิตร
517	หนองจิกเภา	8	หนองปล้อง	วังทรายพูน	พิจิตร
518	บ้านเนิน	1	หนองชุมพล	เขาย้อย	เพชรบุรี
519	บ้านพุหวาย	6	ห้วยทรายเหนือ	ชะอำ	เพชรบุรี
520	บ้านสหกรณ์	10	ท่ายาง	ท่ายาง	เพชรบุรี
521	บ้านทุ่งแจง	2	แก้มอ้น	จอมบึง	ราชบุรี
522	บ้านคลองเสาธง	12	บางเสาธง	บางเสาธง	สมุทรปราการ
523	บ้านแสงทอง	13	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี
524	บ้านคลองเรือ	15	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี
525	บ้านคลองพริก	13	ขุนซ่อง	แก่งหางแมว	จันทบุรี
526	บ้านตกปก-ตาลึง	6	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี
527	บ้านหนองกวาง	8	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี
528	บ้านตกปก	9	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี
529	บ้านคลองเหล็กบน	7	เขาแก้ว	ท่าใหม่	จันทบุรี
530	บ้านเนินพูลศิลป์	6	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี
531	บ้านไร่โอ่	1	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี
532	บ้านหมู่	3	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี
533	บ้านโรงน้ำมัน	4	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี
534	บ้านทุ่งเพล	8	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี
535	บ้านโป่งวัว	6	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี
536	บ้านน้ำเป็น	7	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี
537	บ้านคลองตาขิง	8	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี
538	บ้านวังใหม่	14	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี
539	บ้านนาบุญ	18	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี
540	บ้านตะปอนใหญ่	1	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี
541	บ้านตะปอนใหญ่	2	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
542	บ้านหนองเสม็ด	4	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี
543	บ้านเนินมะหาด	3	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
544	บ้านเนินมะหาดมูซู	5	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
545	บ้านเขารูปช้าง	6	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
546	บ้านคลองหินลอย	7	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
547	บ้านว่านเหลือง	8	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
548	บ้านคลองกระสือ	7	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
549	บ้านตะพง	1	เขาแก้ว	ท่าใหม่	จันทบุรี
550	บ้านท่าปก	3	เขาแก้ว	ท่าใหม่	จันทบุรี
551	บ้านตาเลียว	8	เขาแก้ว	ท่าใหม่	จันทบุรี
552	บ้านโป่งกวาง	1	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
553	บ้านไร่ป่า	2	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
554	บ้านเขาบายศรี	4	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
555	บ้านเขาบายศรี	5	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
556	บ้านหนองบัว	8	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
557	บ้านยางระหง	10	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
558	บ้านมาบโอน	11	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
559	บ้านเขาสุกิม	12	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
560	บ้านเขาลูกช้าง	8	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี
561	บ้านเขายายเปลื่อง	10	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี
562	บ้านทุ่งใหญ่	12	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี
563	บ้านวัดลาด	2	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี
564	บ้านวัดกลาง	7	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี
565	บ้านวัดบน	8	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี
566	บ้านรำพัน	5	รำพัน	ท่าใหม่	จันทบุรี
567	บ้านตลิ่งชัน	5	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี
568	บ้านแถวคลอง	1	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
569	บ้านทุ่งว่าเหลือง	2	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
570	บ้านโป่งล่าง	4	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
571	บ้านบ่อลึก	5	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
572	บ้านหนองฉวี	6	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
573	บ้านหนองฉวี	7	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
574	บ้านคลองกะพง	9	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี
575	บ้านหนองปรือ	8	เขาวัว	ท่าใหม่	จันทบุรี
576	บ้านหนองเคล้า	1	แสลง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
577	บ้านเขากระแจะ	8	แสลง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
578	บ้านตรอกนองกลาง	3	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี
579	บ้านตรอกนองกลาง	4	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี
580	บ้านตรอกนองล่าง	5	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
581	บ้านคลองซาง	6	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี
582	บ้านสะโทย	1	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี
583	บ้านจังกิ้น	2	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี
584	บ้านดอน	4	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี
585	บ้านร้อยรู	5	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี
586	บ้านทุ่งสะพาน	1	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
587	บ้านชากไทย	4	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี
588	บ้านเนินดินแดง	7	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี
589	บ้านน้ำใส	11	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี
590	บ้านบึงบอน	14	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี
591	บ้านบ่อหิน	14	ตะพง	เมืองระยอง	ระยอง
592	บ้านหนองน้ำดำ	5	หนองไร่	ปลวกแดง	ระยอง
593	บ้านทดน้อย	7	ผักขะ	วัฒนานคร	สระแก้ว
594	บ้านกลางน้อย	11	นาแก	นาแก	นครพนม
595	บ้านหาดกวน	5	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม
596	บ้านนาทมใต้	4	นาทม	นาทม	นครพนม
597	บ้านขามเตี้ยเหนือ	16	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม
598	บ้านโชคชัย	10	ดงมอน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร
599	บ้านสงเปือย	3	ดงมอน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร
600	บ้านโพนธาตุ	6	บ้านว่าน	ท่าบ่อ	หนองคาย
601	บ้านดงเวร	5	สีกาย	เมืองหนองคาย	หนองคาย
602	บ้านสังคมพัฒนา	8	สีกาย	เมืองหนองคาย	หนองคาย
603	บ้านโนนแสงทอง	13	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย
604	บ้านหนองนาแพง	3	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย
605	บ้านไทยรุ่งเรือง	7	นางัว	น้ำโสม	อุดรธานี
606	บ้านนางัว	1	นางัว	น้ำโสม	อุดรธานี
607	บ้านดงสง่า	4	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี
608	บ้านป่าเป้า	2	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี
609	บ้านทุ่งพัฒนา	12	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี
610	บ้านหนองเม็ก	7	หนองเม็ก	หนองหาน	อุดรธานี
611	บ้านหนองเม็ก	15	หนองเม็ก	หนองหาน	อุดรธานี
612	บ้านท่าสวรรค์	7	ป่งไฮ	เซกา	บึงกาฬ
613	บ้านกลาง	4	ศรีชมภู	โซ่พิสัย	บึงกาฬ
614	บ้านไทยเสรี	13	เซกา	เซกา	บึงกาฬ
615	บ้านบึงกาฬเหนือ	1	วิศิษฐ์	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ
616	บ้านห้วยอีแฮต	2	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ
617	บ้านคำแสน	10	ไคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ
618	บ้านนามน	11	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี
619	บ้านนาห้วยแคน	9	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
620	บ้านคำประเสริฐ	12	นากระแซง	เดชอุดม	อุบลราชธานี
621	บ้านป่าโมงน้อย	3	ป่าโมง	เดชอุดม	อุบลราชธานี
622	บ้านกุดกลอยเหนือ	17	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี
623	บ้านกุดกลอย	20	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี
624	บ้านหลักชัย	11	เหล่าบก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี
625	บ้านหนองยอ	5	หนองไข่นก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี
626	บ้านไผ่ใหญ่	8	ไผ่ใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี
627	บ้านแจ้งสว่าง	15	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี
628	บ้านคอนสาย	3	โนนโหนน	วารินชำราบ	อุบลราชธานี
629	บ้านวังดู่	16	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
630	บ้านโนนโพธิ์	18	กุดชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
631	บ้านโคกสะอาด	15	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
632	บ้านม่วงงาม	18	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
633	บ้านทุ่งแสงตะวัน	19	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
634	บ้านใหม่ผาสุข	21	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
635	บ้านแก่งเจริญสุข	22	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
636	บ้านทุ่งเทวา	23	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
637	บ้านผักหย่าใต้	2	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
638	บ้านโนนสร้างคำ	15	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
639	บ้านหนองบัวฮี	1	หนองบัวฮี	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี
640	บ้านหนองไฮน้อย	12	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี
641	บ้านพรสวรรค์	17	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี
642	บ้านประชาสรรค์	12	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร
643	บ้านเหล่าโป	2	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร
644	บ้านเหล่าตำแย	6	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
645	บ้านโนน	9	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
646	บ้านหนองบัวแดงน้อย	13	สระบัว	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด
647	บ้านหนองกระเดา	9	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด
648	บ้านกุดแคน	2	ดงกลาง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด
649	บ้านดงยาง	1	ดู่น้อย	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด
650	บ้านธวัชชัย	14	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด
651	บ้านก้างปลา	6	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด
652	บ้านโนนสมบูรณ์	5	ค้อใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด
653	บ้านหนองบัว	7	ขามเบี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด
654	บ้านแก้ง	2	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด
655	บ้านดอนน้ำสร้าง	4	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด
656	บ้านหนองไผ่	11	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด
657	บ้านหนองจอก	3	นาใหญ่	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด
658	บ้านโนนสระพังยาง	9	น้ำคำ	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
659	บ้านโพนดวน	1	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด
660	บ้านบาก	6	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด
661	บ้านดงเค็ง	9	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด
662	บ้านป่าสุ่มน้อย	3	พระเจ้า	เชียงขวัญ	ร้อยเอ็ด
663	บ้านหวายหลึม	6	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด
664	บ้านหนองแข้	13	ซำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
665	บ้านฮ่องขาด	6	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
666	บ้านลิงไอ	11	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
667	บ้านวังไฮ	4	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
668	บ้านหนองทามใหญ่	6	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
669	บ้านบุข้าวดอ	4	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
670	บ้านน้ำคำ	6	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
671	บ้านอีลอก	2	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
672	บ้านโนนจาน	3	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
673	บ้านดอนเหมือดแอ่	7	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ
674	บ้านทุ่งพาย	3	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
675	บ้านหนองหัวช้าง	5	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
676	บ้านลือชัย	6	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
677	บ้านโนนสีไคล	8	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
678	บ้านร่องน้ำคำ	10	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
679	บ้านหนองดุม	2	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
680	บ้านหมัด	3	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
681	บ้านผึ้ง	4	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
682	บ้านเจี่ย	6	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
683	บ้านละทาย	9	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
684	บ้านหนองมุข	5	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
685	บ้านหนองไฮ	3	อีปาด	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
686	บ้านแวง	1	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
687	บ้านพันลำ	5	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
688	บ้านโนนปอ	7	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
689	บ้านหนองถ่ม	3	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
690	บ้านเหมือดแอ่	4	ดู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
691	บ้านประอาง	3	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
692	บ้านโนนสมบูรณ์	12	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
693	บ้านหนองอีกว่าง	5	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
694	บ้านน้ำขวบ	2	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
695	บ้านศรีสะอาด	15	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
696	บ้านณรงค์	4	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
697	บ้านโนนพิทักษ์	16	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
698	บ้านจานเลียว	4	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
699	บ้านโนนเปือย	6	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
700	บ้านรุง	1	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
701	บ้านสมบูรณ์	2	รุง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
702	บ้านโคก	1	ตระกาจ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
703	บ้านโนนขาม	12	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
704	บ้านหนองตาสา	14	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
705	บ้านชำม่วง2	6	ชำ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
706	บ้านกระมอล	7	ทุ่งใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
707	บ้านตาซุน	8	ทุ่งใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ
708	บ้านใจดี	1	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
709	บ้านพะเยียว	2	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
710	บ้านทะลอก	3	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
711	บ้านอังกุล	7	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
712	บ้านใจดีเหนือ	10	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
713	บ้านตราด	7	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
714	บ้านสวาย	7	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
715	บ้านสี่แยกนาเจริญ	9	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
716	บ้านปรือคันตะวันตก	7	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
717	บ้านสำโรงสูง	3	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
718	บ้านจะลง	9	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
719	บ้านหนองติมใต้	15	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
720	บ้านสวงษ์	4	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
721	บ้านตาทึง	11	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
722	บ้านกวางขาว	7	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
723	บ้านเสลา	6	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
724	บ้านระกาน้อย	9	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
725	บ้านสุขเกษม	11	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
726	บ้านนาก๊อกตะวันออก	7	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
727	บ้านแทรงเหนือ	11	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
728	บ้านทุ่งศักดิ์	1	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
729	บ้านอาทิ	2	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
730	บ้านเคาะ	1	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
731	บ้านละเบิก	4	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
732	บ้านตาฮิง	5	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
733	บ้านสวาย	2	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
734	บ้านสนวน	18	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
735	บ้านหนองอารี	1	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
736	บ้านลาวเดิม	3	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
737	บ้านหนองสิม	9	ดินแดง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
738	บ้านเตรียะ	5	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
739	บ้านประอางเหนือ	11	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
740	บ้านสะเดาน้อย	3	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
741	บ้านไม้แก่น	12	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
742	บ้านสำโรงธรรม	13	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
743	บ้านตาโมกข์	14	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
744	บ้านตาตุม	17	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
745	บ้านระหาร	10	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
746	บ้านสุขสวัสดิ์	11	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
747	บ้านหนองระเยียว	2	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ
748	บ้านละเอิง	11	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
749	บ้านกำแมด	3	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
750	บ้านมัดกา	4	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
751	บ้านแขม	9	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
752	บ้านหนองแต้	11	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
753	บ้านป่าบาก	17	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
754	บ้านทางโค้ง	18	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
755	บ้านแจนแลน	19	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
756	บ้านกระโพธิ์	2	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
757	บ้านรงระ	8	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
758	บ้านตรอก	10	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
759	บ้านนาเวียง	1	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
760	บ้านกอกหวาน	1	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
761	บ้านหนองบัวบัลลังก์	6	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
762	บ้านดงตาดทอง	10	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
763	บ้านกอกหวานใต้	12	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
764	บ้านหนองหาน	12	ดู่	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
765	บ้านท่าคอยนาง	5	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
766	บ้านเหล็ก	4	พิมายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
767	บ้านไฮ	7	พิมายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
768	บ้านโพธิ์สามัคคี	8	พิมายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
769	บ้านห้วย	7	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ
770	บ้านโนนศรีทอง	11	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ
771	บ้านกระหวัน	4	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ
772	บ้านกระเดา	12	ดู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ
773	บ้านหนองคูน้อย	10	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ
774	บ้านกอก	12	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ
775	บ้านสองห้อง	8	กำแพง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
776	บ้านสระภูน้อย	9	กำแพง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
777	บ้านสำโรง	1	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
778	บ้านหนองแคน	12	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
779	บ้านโนนเค็ง	6	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
780	บ้านห่องใหล	8	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
781	บ้านตาเกษ	1	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
782	บ้านกลาง	9	หัวช้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
783	บ้านดู่	4	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
784	บ้านฝาง	5	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
785	บ้านหลักป้าย	8	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
786	บ้านสำโรงน้อย	16	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
787	บ้านเหงี่ยง	6	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
788	บ้านโปร่งสามัคคี	5	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
789	บ้านค้อ	6	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ
790	บ้านหนองเมย	9	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ
791	บ้านหว้า	6	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ
792	บ้านอีสร้อย	7	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ
793	บ้านโนนสว่าง	3	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ
794	บ้านทุ่งรวงทอง	5	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ
795	บ้านหนองแก	9	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ
796	บ้านนาม่อง	2	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ
797	บ้านสะพุงน้อย	4	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ
798	บ้านพิงพวย	7	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ
799	บ้านตูมกระแซงราษฎร์	9	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ
800	บ้านสามสิบเอ็ดพัฒนา	10	ตูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ
801	บ้านนาเจริญ	13	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ
802	บ้านบางกระวาน	15	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
803	บ้านหนองนาเวียง	7	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ
804	บ้านหนองอาเสร	16	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ
805	บ้านยางน้อย	2	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ
806	บ้านโนนสว่าง	6	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ
807	บ้านสบายใต้	1	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ
808	บ้านสบาย	3	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ
809	บ้านสบายเหนือ	14	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ
810	บ้านหนองหว้า	12	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ
811	บ้านหนองม่วง	4	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ
812	บ้านโนนดู่	7	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ
813	บ้านหนองทุ่มน้อย	3	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ
814	บ้านเจ้าทุ่ง	9	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
815	บ้านท่าสำราญ	10	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ
816	บ้านน้ำท่วม	12	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ
817	บ้านหลักป้าย	7	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ
818	บ้านบก	1	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ
819	บ้านหนองโน	14	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ
820	บ้านหนองเรือ	25	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ
821	บ้านหนองตาด	6	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ
822	บ้านหนองไผ่	12	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ
823	บ้านป่าไร่	8	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ
824	บ้านโนนสว่าง	15	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ
825	บ้านอะลาง	6	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ
826	บ้านโคกเพ็ก	9	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ
827	บ้านโพธิ์ศรี	10	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ
828	บ้านยางปอ	11	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ
829	บ้านหนองไผ่	3	หนองม้า	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ
830	บ้านหนองแวง	7	หนองม้า	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ
831	บ้านแสง	1	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ
832	บ้านห่องเปือย	8	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ
833	บ้านคำสร้างบ่อ	4	น้ำปลีก	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ
834	บ้านหนองหินใต้	11	หนองมะแซว	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ
835	บ้านบาลา	5	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส
836	บ้านสาวอ	8	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส
837	บ้านเจ๊ะยอ	3	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส
838	บ้านเขาสามสิบ	6	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส
839	บ้านตำเสา	6	ฆอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส
840	บ้านผ่านศึก	5	ฆอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส
841	บ้านกะดูนง	2	ฆอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส
842	บ้านบางขุด	1	ฆอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส
843	บ้านจะมาแก๊ะ	3	ฆอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส
844	บ้านกีแยมัส	4	ฆอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส
845	บ้านบูเกะ	5	มูโนะ	สุไหงโก-ลก	นราธิวาส
846	บ้านปลักปลา	5	โฆษิต	ตากใบ	นราธิวาส
847	บ้านโคกมือบา	4	โฆษิต	ตากใบ	นราธิวาส
848	บ้านปะลุกา	3	โฆษิต	ตากใบ	นราธิวาส
849	บ้านสะหริ่ง	1	โฆษิต	ตากใบ	นราธิวาส
850	บ้านบูเกะกือจิ	12	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส
851	บ้านบูเกะตาโมง	7	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส
852	บ้านบูเก๊ะบูแย	11	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส
853	บ้านตันหยงมัส	1	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
854	บ้านโต๊ะเปาะมะ	10	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส
855	บ้านร่อน	2	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส
856	บ้านไทย	3	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส
857	บ้านบาตง	3	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส
858	บ้านแกแม	4	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส
859	บ้านแกแมเก้า	9	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส
860	บ้านบูเก๊ะมูนิง	4	มะรือโบตก	ระแงะ	นราธิวาส
861	บ้านบลูกาอีเลตะวันตก	8	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส
862	บ้านบลูกาฮีเล	6	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส
863	บ้านบาโงอาแซ	6	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส
864	บ้านบริจ๊ะ	7	ลาโละ	รือเสาะ	นราธิวาส
865	บ้านอาแว	6	มะรือโบตก	ระแงะ	นราธิวาส
866	บ้านสันติสุข	2	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส
867	บ้านอีนอ	3	ลาโละ	รือเสาะ	นราธิวาส
868	บ้านตะแม็ง	1	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส
869	บ้านบูเก๊ะ	7	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส
870	บ้านลุโบะบือซา	1	ลุโบะบือซา	ยี่งอ	นราธิวาส
871	บ้านบือเระ	1	บาเระใต้	บาเจาะ	นราธิวาส
872	บ้านตันหยง	4	บาเระใต้	บาเจาะ	นราธิวาส
873	บ้านออก	3	ตาชี	ยะหา	ยะลา
874	บ้านไร่	4	ตาชี	ยะหา	ยะลา
875	บ้านบาโด	3	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา
876	บ้านบ่อเจ็ดลูก	6	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา
877	บ้านเกาะหม้อแกง	6	ท่ากำชำ	หนองจิก	ปัตตานี
878	กองพลทหารราบที่ 15 บ้านบ่อทอง		บ่อทอง	หนองจิก	ปัตตานี
879	บ้านบางมวง	3	ฝาละมี	ปากพะยูน	พัทลุง
880	บ้านสวน	6	มะกอกเหนือ	ควนขนุน	พัทลุง
881	บ้านทะเลน้อย	13	พนางตุง	ควนขนุน	พัทลุง
882	บ้านตีนนา	1	เขามีเกียรติ	สะเดา	สงขลา
883	บ้านหาร	4	บ้านหาร	บางกล่ำ	สงขลา
884	บ้านคู	1	บ้านหาร	บางกล่ำ	สงขลา
885	บ้านเลียบ	1	ท่าช้าง	บางกล่ำ	สงขลา
886	บ้านปากช่อง	1	ชะแล้	สิงหนคร	สงขลา
887	บ้านท่าหิน	6	ท่าหิน	สทิงพระ	สงขลา
888	บ้านพรวน	8	ท่าหิน	สทิงพระ	สงขลา
889	บ้านโต๊ะสัะ	1	ควนสตอ	ควนโดน	สตูล
890	บ้านบ่อเจ็ดลูก	1	ปากน้ำ	ละงู	สตูล
891	บ้านหนองยูง	8	น้ำผุด	ละงู	สตูล

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
892	บ้านทุ่งทะนาน	3	ทุ่งบุหลัง	ทุ่งหว้า	สตูล

7. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 713,600,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)

8. ระยะเวลาดำเนินการ

กรกฎาคม 2558 – กรกฎาคม 2562

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน

9.1 รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาจากฐานข้อมูลการสำรวจของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งมาจากการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านและแบบสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากฐานข้อมูลการสำรวจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

9.2 คัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านน้ำบาดาลทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดหาแหล่งน้ำได้

9.3 สทบ. เขต ที่รับผิดชอบในพื้นที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคำขอรับบริการตามแบบฟอร์ม (อภ.58-1) และแบบฟอร์มคัดเลือก (อภ.58-2)

9.4 การสำรวจธรณีฟิสิกส์

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง แบ่งเป็นการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินด้วยวิธีการตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity method) และการสำรวจธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดินด้วยการหยั่งธรณีฟิสิกส์ (Electric logging) ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งชั้นน้ำบาดาลเป็นตะกอนร่วน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2551) กำหนดมาตรฐานการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินด้วยวิธีการตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า (resistivity method) ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1) การวางแผนสำรวจต้องสอดคล้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่สำรวจ โดยพิจารณาจากแผนที่น้ำบาดาลและแผนที่อุทกธรณีวิทยาของพื้นที่สำรวจ

2) กำหนดความลึกในการสำรวจและปริมาณจุดสำรวจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจ

3) การจัดวางหลักขั้วไฟฟ้าและเทคนิคการสำรวจ ต้องมีความสอดคล้องกับความแตกต่างของค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของชั้นดิน ชั้นหินใต้ผิวดินในพื้นที่สำรวจ

4) ต้องศึกษาทิศทางการไหลของน้ำบาดาลในพื้นที่สำรวจควบคู่กันไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาล หรือการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อน

แบบฟอร์มคำขอรับบริการ (อภ.58-1)

อ.ภ.58/1.1

คำขอรับบริการ

โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต..... กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1. สถานที่ขอรับบริการ.....ตั้งอยู่ที่บ้าน.....หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

2. สถานที่หรือบริเวณที่ขอให้เจาะ (เช่น วัด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, ที่สาธารณะหรือที่ส่วนบุคคลในหมู่บ้าน)
.....พิกัด.....ZONE.....UTM E.....UTM N.....
ละติจูด.....ลองติจูด.....

3. จำนวนประชากรผู้ใช้น้ำ.....คน .....ครัวเรือน ครู/นักเรียน.....คน พระ/เณร.....รูป

4. ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ขอรับบริการ ☐ ไม่เคยมีการเจาะน้ำบาดาล ☐ เคยเจาะ ณ ที่ใด .....
.....อยู่ห่างจากสถานที่ขอรับบริการเป็นระยะทาง.....เมตร
สภาพบ่อน้ำบาดาลปัจจุบัน ☐ ใช้การได้ ☐ ใช้การไม่ได้ เนื่องจาก.....
☐ ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบของระบบประปา
ชนิดเครื่องสูบน้ำที่ใช้ ☐ สูบมือโยก ☐ สูบไฟฟ้า ☐ อื่น ๆ.....
คุณภาพน้ำบาดาล ☐ จืด ☐ กร่อย/เค็ม ☐ อื่นๆ.....

5. ปัจจุบันสถานที่ขอรับบริการใช้น้ำจากแหล่งใดสำหรับการอุปโภคบริโภค
☐ บ่อน้ำตื้น (โดยวิธีขุด) ☐ บ่อตอก ☐ สระ ☐ แม่น้ำหรือลำคลอง ☐ อื่นๆ.....
☐ ประปาหมู่บ้าน/หมู่บ้านอื่น หมู่.....ของหน่วยงาน.....ความจุหอถัง.....$ม^3$
ระยะห่างหอถัง.....ม. ปริมาณน้ำดิบ.....$ม^3$/ชม.
☐ แหล่งน้ำดิบ..... ☐ น้ำผิวดิน ☐ น้ำบาดาล

6. เหตุผลการขอเจาะบ่อน้ำบาดาล.....

7. สถานที่ขอรับบริการมีไฟฟ้า ขนาด.....โวลต์ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด.....แอมป์

8. หากโครงการเสร็จเรียบร้อย ราษฎรจะสามารถช่วยตัวเองในการบริหารจัดการประปาได้เพียงใด เช่น
○ จัดตั้งกลุ่มใช้น้ำมาบริหารกันเอง ○ อปท. ดำเนินการ
○ อื่นๆ.....

9. การเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับบริการ
9.1 ☐ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและมีความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี
9.2 ☐ มีพื้นที่สาธารณะสำหรับโครงการ หากเป็นพื้นที่เอกชนผู้ร้องขอต้องดำเนินการประสานให้ความยินยอม
9.3 ☐ พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการฯทุกด้านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
9.4 ☐ สามารถบริหารจัดการหลังส่งมอบโครงการฯ ให้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
9.5 ☐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่เห็นชอบและยินดีให้การสนับสนุนโครงการ

10. เมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโครงการฯ ให้แล้ว อปท. จะต้องดำเนินการ
10.1 มอบหมายให้.....เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษาระบบประปาบาดาล
10.2 รับทราบและเข้าใจดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ต่อไป

อ.ภ.58/1.2

ความเห็น อปท.

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ขอ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

หมายเลขโทรศัพท์.....

แผนที่แสดงเส้นทางไปยังหมู่บ้านที่ขอรับบริการ

สถานที่ขอรับบริการ.....ตั้งอยู่ที่บ้าน.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ทิศเหนือ

ไปถึงบริเวณที่ขอเจาะได้โดยเส้นทางใด (ให้อธิบายว่าใช้เส้นทางสายใด แยกตรงหลัก กม. ที่เท่าใด เป็นระยะทางเท่าใด

.....

สภาพเส้นทาง (สภาพทางเป็นอย่างไรบ้าง รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าออกได้ทุกฤดูหรือไม่ ฯลฯ

.....

*** กรุณาเขียนแผนที่ให้ถูกต้อง ***

อ.ภ.58/1.3

สัญลักษณ์ที่ใช้

จุดที่ขอเจาะบ่อน้ำบาดาล	อ่างเก็บน้ำ
บ่อน้ำบาดาลของเดิมที่ทางราชการเจาะให้ เช่น กทธ. รพช. โยธา ฯลฯ	สระน้ำ
บ่อตอก	แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วย
หอถังเก็บน้ำประปา	

ลงชื่อ.....ผู้เขียนแผนที่

(.....)

วันที่...../...../.....

แบบฟอร์มหลักเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ (อ.ภ.58/2)

หลักเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

พื้นที่โครงการ .....**หมู่ที่**.....

ตำบล.....**อำเภอ**.....**จังหวัด**.....

ผู้ประเมิน นาย/นาง/นางสาว.....**นามสกุล**.....**เบอร์โทร**.....

ส่วนที่	หลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	**ด้านศักยภาพน้ำบาดาล**	10	
	- ปริมาณน้ำ ที่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค		
	☐ ปริมาณน้ำน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร (3 คะแนน) } 5 คะแนน		
	☐ ปริมาณน้ำ 3 - 5 ลูกบาศก์เมตร (5 คะแนน)		
	☐ ความลึกพัฒนาน้อยกว่า 50 เมตร (5 คะแนน)		
	☐ ความลึกพัฒนา 50-100 เมตร (4 คะแนน) } 5 คะแนน		
	☐ ความลึกพัฒนามากกว่า 100 เมตร (3 คะแนน)		
2	**ด้านคุณภาพน้ำบาดาล**	10	
	☐ คุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตราฐานน้ำอุปโภคบริโภค (5 คะแนน) } 5 คะแนน		
	☐ คุณภาพน้ำสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานน้ำอุปโภคบริโภค (2 คะแนน)		
	☐ คุณภาพน้ำมีสภาพการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 75 (EC, µs/cm) (5 คะแนน)		
	☐ คุณภาพน้ำมีสภาพการนำไฟฟ้า 75 - 3,000 (EC, µs/cm) (3 คะแนน) } 5 คะแนน		
	☐ คุณภาพน้ำมีสภาพการนำไฟฟ้า มากกว่า 3,000 (EC, µs/cm) (2 คะแนน)		
3	**ด้านปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์**	20	
	☐ มีระบบประปาแต่ไม่เพียงพอ (7 คะแนน) } 20 คะแนน		
	☐ ไม่มีระบบประปา (10 คะแนน)		
4	**ด้านเศรษฐกิจและสังคม**	5	
	☐ ประเภทที่ 1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการผลิตประปาบาดาล (5 คะแนน)		
	☐ ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้ใช้น้ำมีความพร้อมในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการผลิตประปาบาดาล (5 คะแนน) 5 คะ		
	☐ ไม่เข้าเกณฑ์ประเภทที่ 1 และ 2 (0 คะแนน)		
5	**ด้านพื้นที่โครงการฯ**	20	
	☐ มีเอกสารมอบหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการผลิตระบบประปาบาดาล (10 คะแนน) } 10 คะแนน		
	☐ ไม่มีเอกสารมอบหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการผลิตระบบประปาบาดาล (0 คะแนน)		
	☐ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (5 คะแนน) } 5 คะแนน		
	☐ ไม่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (0 คะแนน)		
	☐ ไม่มีระบบระบบประปา (5 คะแนน) } 5 คะแนน		
	☐ มีระบบระบบประปา (0 คะแนน)		
6	**ด้านไฟฟ้า**	10	
	- พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้า		
	☐ มีระยะห่างจากระบบไฟฟ้าแรงต่ำน้อยกว่า 50 เมตร (10 คะแนน) } 10 คะแนน		
	☐ มีระยะห่างจากระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 50-100 เมตร (3 คะแนน)		
7	**ด้านความพร้อมในการก่อสร้างของพื้นที่โครงการ**	25	
	☐ มีความพร้อมในเรื่องที่ดินเจาะบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ (10 คะแนน) } 10 คะแนน		
	☐ ไม่มีความพร้อมในเรื่องที่ดินเจาะบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ (0 คะแนน)		
	☐ มีความพร้อมในเรื่องที่ดินในการก่อสร้างระบบประปาบาดาล (5 คะแนน) } 5 คะแนน		
	☐ ไม่มีความพร้อมในเรื่องที่ดินในการก่อสร้างระบบประปาบาดาล (0 คะแนน)		
	☐ มีความพร้อมในเรื่องที่ดินในการวางระบบไฟฟ้า (10 คะแนน) } 10 คะแนน		
	☐ ไม่มีความพร้อมในเรื่องที่ดินในการวางระบบไฟฟ้า (0 คะแนน)		
	คะแนนรวม	100	

☐ **เข้าหลักเกณฑ์** ☐ **ไม่เข้าหลักเกณฑ์**

ผู้ประเมิน .....
(.....)
ตำแหน่ง .....
วันที่ .....

ผู้ตรวจสอบ .....
(.....)
ผอ.สพบ.เขต .....
(.....)
วันที่ .....

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ได้ดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Survey) ก่อนการเจาะน้ำบาดาล เพื่อศึกษาความแตกต่างของชั้นดิน ชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ และนำค่าที่ได้จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์มาประกอบกับผลการวิเคราะห์ชั้นดิน ชั้นหินที่ได้จากการเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบความหนาของชั้นหินอุ้มน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัย (safe yield)

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey)

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity survey) เป็นการวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดินด้วยตัวกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรง (direct current, DC) หรือใช้กระแสไฟฟ้าสลับที่มีความถี่ต่ำปล่อยลงไปในดินอย่างช้า ๆ คล้ายกระแสไฟฟ้าตรง สิ่งที่มีผลต่อค่าการปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์และทางเดินของกระแสไฟฟ้า คือ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน-หิน ที่ประกอบด้วยแร่องค์ประกอบในเนื้อดิน-หิน รูพรุน ของเหลวในรูพรุน หรือ องค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อดิน-หิน

วิธีการสำรวจนี้นิยมทำกันแพร่หลายกว่าวิธีอื่น ๆ ในประเภทของการสำรวจด้วยไฟฟ้า

ในการปฏิบัติงานโครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินชั้นหิน (Vertical Electrical Resistivity Sounding: VES) โดยจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจอร์ (Schlumberger Configuration) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ มีดังนี้

1. เครื่องมือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (resistivity meter)
2. ม้วนสายไฟ ความยาว ม้วนละ 300 เมตร จำนวน 2 ม้วน
3. ค้อนตอกหลัก 4 อัน
4. หลักเหล็ก (electrode) 4 หลัก
5. เครื่องหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
6. วิทยุรับ-ส่ง สนาม จำนวน 3 เครื่อง
7. กระดาษบันทึกข้อมูล

9.5 การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2551) กำหนดมาตรฐานด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐานในการเจาะน้ำบาดาล การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล การตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล การสูบทดสอบปริมาณน้ำ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้

1) การเจาะน้ำบาดาล ต้องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของชั้นดิน ชั้นหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และกำหนดจุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งบ่อที่เจาะต้องอยู่ในแนวดิ่งบนพื้นที่ที่แข็งแรงเพื่อไม่ให้บ่อเอียง โดยเก็บตัวอย่างชั้นดินและหินในขณะที่เจาะทุก ๆ ความลึก 1 เมตร

2) การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล อาศัยข้อมูลจากการหยั่งธรณีหลุมเจาะประกอบกับการวิเคราะห์ชั้นดิน ชั้นหิน ที่ได้จากการเจาะ ในการกำหนดระยะความลึกของท่อกรุ มาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลกำหนดให้ระยะห่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร เทฐานคอนกรีตรอบบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 15 เซนติเมตร และผนึกข้างบ่อไม่น้อยกว่า 6 เมตร สำหรับบ่อน้ำบาดาลในชั้นหินร่วน การสร้างบ่อจะต้องกรุกรวดรอบ ๆ บ่อ ในช่วงที่เป็นชั้นน้ำบาดาล

9.6 การสำรวจชั้นน้ำบาดาลด้วยเครื่องหยั่งธรณี

การสำรวจชั้นน้ำบาดาลเป็นการดำเนินงานการตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยเครื่องหยั่งธรณี (Electric Log) ในหลุมเจาะน้ำบาดาล โดยสำรวจตั้งแต่ปากบ่อน้ำบาดาลจนถึงก้นบ่อน้ำบาดาลให้ทราบความลึกของชั้นน้ำบาดาลและตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้นว่าเป็นน้ำจืด น้ำเค็มหรือน้ำกร่อย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ นำมาออกแบบการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล (Well design) โดยช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลดำเนินการวางท่อกรุบ่อและท่อกรองน้ำให้ตรงตามความลึกที่เหมาะสมของชั้นน้ำบาดาล

9.7 การสูบทดสอบปริมาณน้ำ

เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ทราบปริมาณน้ำที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ ข้อมูลที่ได้จากการสูบทดสอบปริมาณน้ำ สามารถนำไปใช้ในการคำนวณค่าสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณน้ำกักเก็บและปริมาณน้ำไหลเติมสู่ชั้นน้ำบาดาล และใช้เป็นข้อมูลในการเลือกเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งประจำบ่อได้อย่างเหมาะสม

การสูบทดสอบปริมาณน้ำ ตามมาตรฐานมี 2 วิธี คือ การสูบทดสอบเพื่อทราบปริมาณน้ำและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล (well test) และการสูบทดสอบเพื่อหาสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer test) อธิบายได้ดังนี้

การสูบทดสอบเพื่อทราบปริมาณน้ำ และประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล (well test) สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

1) การสูบทดสอบแบบอัตราคงที่ต่อเนื่องระยะสั้น (constant rate test) อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงหรือสูบจนกว่าระดับน้ำคงที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

2) การสูบทดสอบแบบปรับอัตราการสูบ (step – drawdown test) ไม่น้อยกว่า 3 ขั้น ๆ ละ 4 ชั่วโมง ใช้กับบ่อที่มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

การสูบทดสอบเพื่อหาสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer test) เป็นการสูบทดสอบในอัตราคงที่ มีบ่อสังเกตการณ์ไม่น้อยกว่า 1 บ่อ และสูบทดสอบต่อเนื่อง 24-72 ชั่วโมง หรือจนกว่าระดับน้ำในบ่อสังเกตการณ์ไม่ลดลงอีกต่อไปโดยบันทึกอัตราสูบและระดับน้ำลดในบ่อน้ำบาดาลตามช่วงเวลา

9.8 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล

บ่อน้ำบาดาลที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อย ก่อนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำต้องดำเนินการทดสอบปริมาณน้ำ (Pumping test) เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสูบขึ้นมาได้ และเพื่อหาข้อมูลสำหรับการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง การทดสอบแบบธรรมดาทำได้โดยการหาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกให้ได้มากที่สุด พร้อมกับวัดระดับน้ำในบ่อก่อนทำการสูบ ขณะสูบ และหลังจากหยุดสูบ และนำค่าตัวเลขที่ได้ไปคำนวณหาขนาดเครื่องสูบน้ำได้ เครื่องสูบน้ำบาดาลที่ใช้ในปัจจุบันกับระบบประปาบาดาลส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเครื่องสูบน้ำชนิดนี้เท่านั้น การเลือกเครื่องสูบน้ำให้เหมาะสม จะต้องประกอบด้วย

- ข้อมูลเบื้องต้นของบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ ขนาดบ่อน้ำบาดาล และปริมาณน้ำ
- ข้อมูลที่ได้จากการสูบทดสอบ ปริมาณน้ำขณะสูบ ระดับน้ำปกติ และระยะน้ำลด
- ความต้องการใช้น้ำของประชากรในพื้นที่
- ระบบไฟฟ้าที่จะทำการติดตั้ง

เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible pump ประกอบด้วย

- มอเตอร์และปั๊ม
- สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ
- อุปกรณ์ปิดปากบ่อ

- ตู้ควบคุม ชนิด 2 ชั้น กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
- ท่อทางดูดขนาดตามความเหมาะสมของเครื่องสูบน้ำ

โดยเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในโครงการมี 2 ขนาด คือ ขนาด 1.5 และ 2.0 แรงม้า

9.9 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

เป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลในห่องปฏิบัติการโดยกองวิเคราะห์น้ำบาดาล ซึ่งจะตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อให้ทราบคุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี ว่ามีความเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคหรือไม่ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใชบริโภคได้

คุณลักษณะทางกายภาพ

รายการ	**เกณฑกำหนดที่เหมาะสม**	**เกณฑอนุโลมสูงสุด**
สี (Color)	5 (หนวยแพลทินัม-โคบอลต)	15 (หนวยแพลทินัม-โคบอลต)
ความขุ่น (Turbidity)	5 (หนวยความขุ่น)	20 (หนวยความขุ่น)
ความเปนกรด-ดาง (pH)	7.0-8.5	6.5-9.2

คุณลักษณะทางเคมี

รายการ	**เกณฑกำหนดที่เหมาะสม** (มิลลิกรัมตอลิตร)	**เกณฑอนุโลมสูงสุด** (มิลลิกรัมตอลิตร)
เหล็ก (Fe)	ไมเกิน 0.5	1.0
แมงกานีส (Mn)	ไมเกิน 0.3	0.5
ทองแดง (Cu)	ไมเกิน 1.0	1.5
สังกะสี (Zn)	ไมเกิน 5.0	15
ซัลเฟต (SO4)	ไมเกิน 200	250
คลอไรด (Cl)	ไมเกิน 250	600
ฟลูออไรด (F)	ไมเกิน 0.7	1.0
ไนเตรท (NO3)	ไมเกิน 45	45
ความกระดางทั้งหมด (Total hardness as $CaCO_3$)	ไมเกิน 300	500
ความกระดางถาวร (Non-carbonate hardness as $CaCO_3$)	ไมเกิน 200	250
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	ไมเกิน 600	1,200

คุณลักษณะที่เป็นพิษ

รายการ	**เกณฑกำหนดที่เหมาะสม** (มิลลิกรัมตอลิตร)	**เกณฑอนุโลมสูงสุด** (มิลลิกรัมตอลิตร)
สารหนู (As)	ตองไมมี	0.05
ไซยาไนด (CN)	ตองไมมี	0.1
ตะกั่ว(Pb)	ตองไมมี	0.05
ปรอท(Hg)	ตองไมมี	0.001
แคดเมียม(Cd)	ตองไมมี	0.01
ซีลีเนียม(Se)	ตองไมมี	0.01

คุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย

รายการ	**เกณฑกำหนดที่เหมาะสม**
Standard plate count	ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร
Most probable number of	นอยกวา 2.2 ตอรอยลูกบาศกเซนติเมตร
Coliform organism (MPN) E. coli	ตองไม่มี

ตัวอย่างรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
75/10 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ 0-2660-2579 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 20

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 9/23

เลขที่คำขอ 173/2559 หมายเลขบ่อ 5810B041 หมายเลขห้องปฏิบัติการ 1960/2559
เจ้าของบ่อ - ผู้ขอรับบริการ สทบ.เขต 10 จ.อุดรธานี
สถานที่ตั้งบ่อ บ้านสังคมพัฒนา ม.8 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย E278040 N1987957
ความลึกของบ่อ 45.00 เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง - ผู้เก็บตัวอย่าง -
วันที่รับตัวอย่าง 11 พฤศจิกายน 2558 สภาพตัวอย่าง วิธีทดสอบ -
หมายเหตุ -

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 7.3
การนำไฟฟ้า 88 ไมโครซีเมนส์ / ซม. (ที่ 25° ซ.)
ความขุ่น - หน่วยความขุ่น (NTU)
สี - หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

แคลเซียม	(Ca)	6.4	คลอไรด์	(Cl)	9.6
แมกนีเซียม (คำนวณ)	(Mg)	0.2	คาร์บอเนต	(CO_3)	0
โซเดียม	(Na)	8	ไบคาร์บอเนต	(HCO_3)	32
โพแทสเซียม	(K)	-	ฟลูออไรด์	(F)	< 0.4
เหล็ก	(Fe)	0.1	ไนไทรต์	(NO_2)	-
แมงกานีส	(Mn)	0.0	ไนเทรต	(NO_3)	< 0.9
ทองแดง	(Cu)	-	ความกระด้างทั้งหมด	(Total hardness as $CaCO_3$)	17
สังกะสี	(Zn)	-	ความกระด้างถาวร	(Noncarbonate hardness as $CaCO_3$)	0
ซัลเฟต	(SO_4)	< 1	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้		57

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ ใส วันที่ทดสอบ 4 ธันวาคม 2558
สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้รับรอง
(นายสุดใจ วงชารี)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล
วันที่ - 5 ม.ค. 2559

ผู้ทดสอบ
(น.ส.เสาวนีย์ หนูขาว)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
วันที่ 29 ธ.ค. 2558

รายงานฉบับนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร

9.10 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อจ่ายน้ำ

เมื่อสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำดิบโดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้ว จะทำการส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาลต่อไป โดยงานในส่วนของผู้รับจ้างประกอบด้วยงานก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็กเก็บน้ำ ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติ ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ชนิด pressure sand filter ซึ่งมีอัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ส่วนการวางท่อจ่ายน้ำและการขยายเขตไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต

9.11 ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบประปาบาดาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

บ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 892 แห่ง

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งมีแหล่งน้ำดิบเพียงพอทุกฤดูกาล และมีระบบประปาบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

12. การคัดเลือกพื้นที่

การดำเนินโครงการพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 892 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบประปาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาและไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 2,728 หมู่บ้าน ภายในปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง โดยคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการจากฐานข้อมูลการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งพื้นที่เป้าหมายเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา และสทบ.เขต ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำคำขอรับบริการตามแบบฟอร์ม (อภ.58-1) และแบบฟอร์มคัดเลือก (อภ.58-2)

13. การอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 78,294.85 ล้านบาท และได้อนุมัติกรอบวงเงินให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อใช้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

http://www.thaigov.go.th

วันนี้ (17 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย		
1.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
2.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....
3.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
4.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. ....
5.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ
7.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
8.	เรื่อง	ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำนาจศาลมณฑลทหาร พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ
9.	เรื่อง	ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....
10.	เรื่อง	ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำมันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง พริกไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
11.	เรื่อง	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข :020-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ด้านลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า บ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ-สังคม

12. เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชิงบูรณาการปีพ.ศ. 2557 – 2564
13. เรื่อง แผนแม่บทและบรรเทาภัยแล้ง
14. เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558
15. เรื่อง ขออนุมัติโค'งการและการกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
16. เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
17. เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME

ต่างประเทศ

18. เรื่อง ขออนุมัติกา:จัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างไทยกับสิงคโปร์
19. เรื่อง ร่างปฏิญญาทางการเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4
20. เรื่อง การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในหบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)
21. เรื่อง การสมัครขอไทยเพื่อเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันะออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48
23. เรื่อง การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007 เป็นฉบับปี 2012 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
24. เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
25. เรื่อง ความตกลงเรื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ฉบับแก้ไข
26. เรื่อง การลงนามร่'งพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window)
27. เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 2

มาตรการที่ 2 การเชื่อมโยงระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา มี 2 กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 3 การสนธิกำลังเข้าช่วยเหลือและควบคุมเหตุการณ์มี 3 กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 4 การประชาสัมพันธ์ มี 2 กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการหลังการเกิดภัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ 9 กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 1 การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยมี 2 กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 2 การรายงานและติดตามประเมินผล มี 3 กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 3 การเรียนรู้จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นมี 2 กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 4 การจัดทำแผนที่ฟื้นฟูความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งด้านการมีงานทำ คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ มี 2 กิจกรรมหลัก

14. เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษจิกายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษ์ของประเทศไทยในเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

2. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทบทวนข้อเสนอในส่วนของโครงสร้างองค์กรบริหารการแข่งขันฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยหากประสงค์จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

3. เห็นชอบให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำรายละเอียดงบประมาณเพื่อใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยให้ระบุวงเงินและแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

15. เรื่อง ขออนุมัติโครงการและการกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ภายใต้กรอบวงเงิน 78,294.85 ล้านบาท และในกรณีโครงการใดต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเริ่มดำเนินกระบวนการจัดหาพัสดุได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ แต่จะลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้จากสำนักงบประมาณ (สงป.) แล้ว

2. อนุมัติให้ กค. กู้เงินตราต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในกรอบวงเงินไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กค. สามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศก็ได้ และอนุมัติให้จัดสรรเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการตามข้อ 1

3. เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ....

ต่อมาสำนักงบประมาณ เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน แผนงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แผนงานรองการแก้ไขปัญหาด้านอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน/เพิ่มประสิทธิภาพระบบ) งบลงทุน ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 892 รายการ ในวงเงินงบประมาณ 713,600,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)

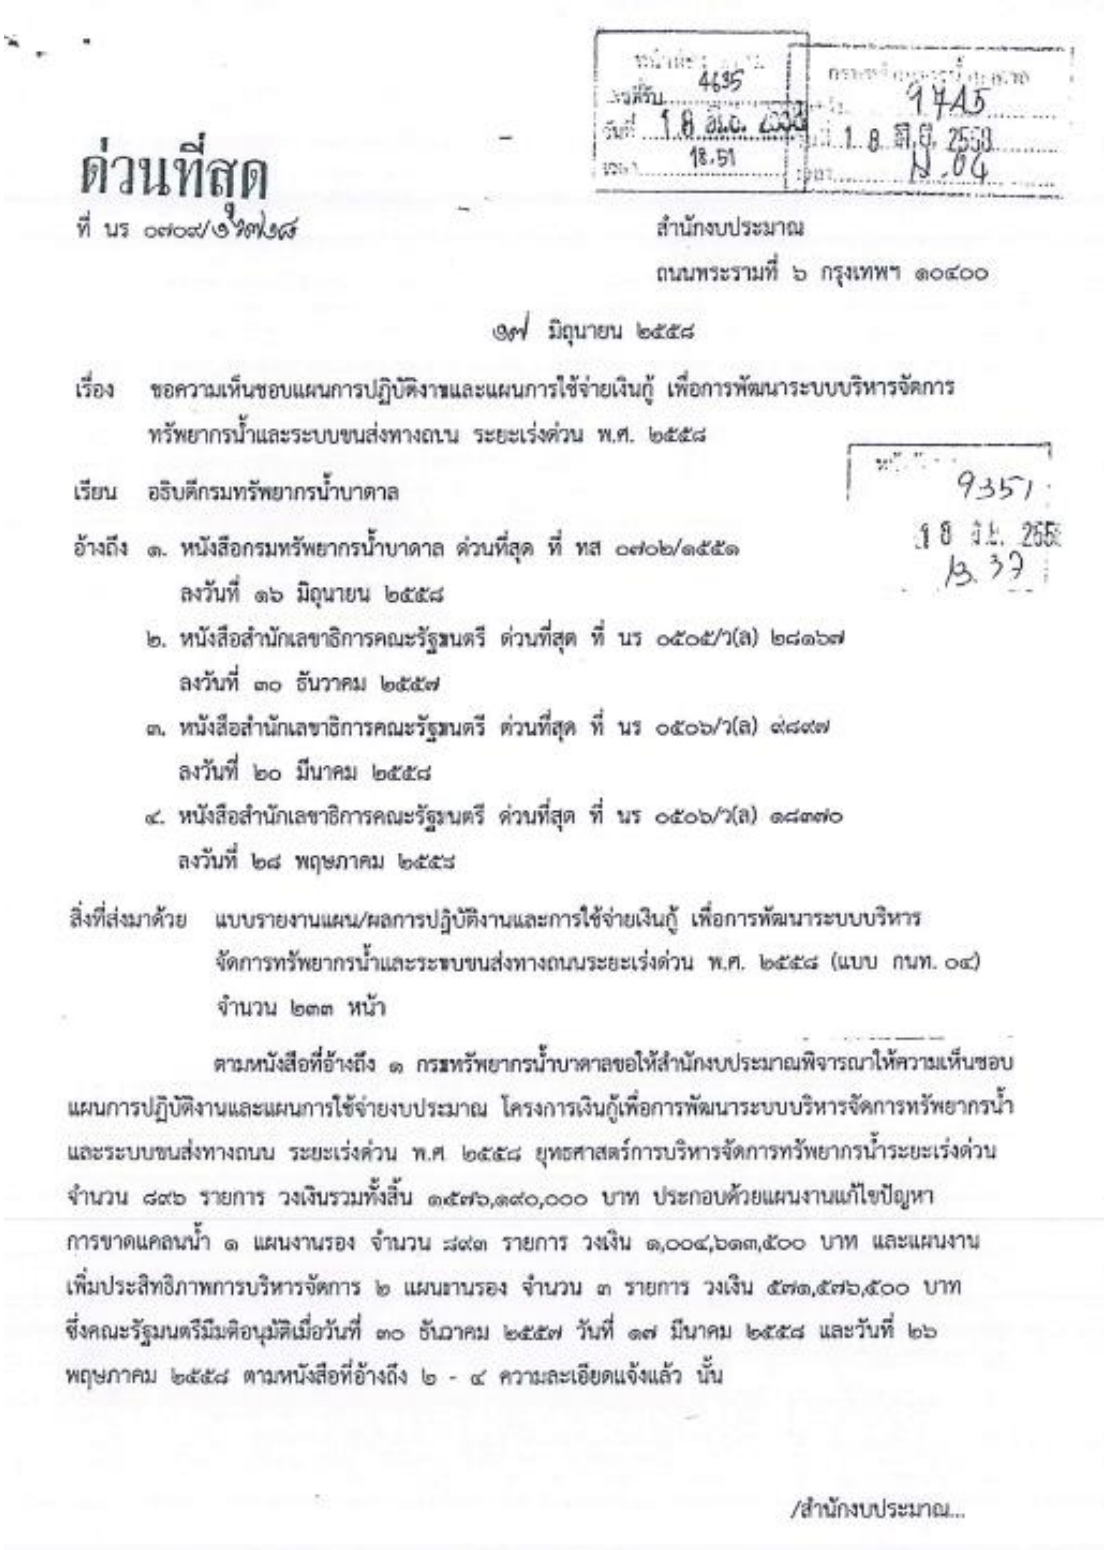

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๑๒๗๘

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๘๑๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๘๙๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๘๓๗๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ กนท. ๐๔) จำนวน ๒๓ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน จำนวน ๘๙๖ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๔๗๖,๑๙๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยแผนงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ๑ แผนงานรอง จำนวน ๘๙๓ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๔,๖๑๓,๕๐๐ บาท และแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ๒ แผนงานรอง จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๕๗๑,๕๗๖,๕๐๐ บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ - ๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน จำนวน ๘๙๖ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๕๗๖,๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน อทบ.
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๑๘ มิ.ย. 2558

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป)
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐
สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กบ./สนก. (สค./สพ.)
ตามเสนอ หัวหน้าฯ ให้ลงนามหนังสือ
ตามเสนอ และประสานกับสำนักงบประมาณ

(นายปราชิต รักกลาง)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
22 มิ.ย. 2558

13.1 การขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน, แผนการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๔๗ โทรสาร ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๓๗

ที่ ๐๕/๓๑๘ **วันที่** ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ. ผ่าน รอง อทบ. (สุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)

เรื่องเดิม

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ โครงการเงินกู้สำหรับแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) โดย สพบ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) วงเงินงบประมาณ ๗๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

สพบ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ตามเอกสารแนบ ๑, ๒, ๓ และ ๔

ข้อพิจารณา

เพื่อให้ ทบ. เร่งรัดการดำเนินงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) วงเงินงบประมาณ ๗๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน) เห็นควร พิจารณาดังนี้

๑. อนุมัติแผนปฏิบัติงาน

๒. อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. อนุมัติแผนโอนเงินจัดสรรงบประมาณ

๔. อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับการอนุมัติแผนโอนจัดสรรงบประมาณ ตามข้อ ๓ ให้ สพบ.เขต ๑-๑๒ เป็นเงินงบประมาณ ๑๓๖,๗๘๕,๓๓๐ (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีฟิสิกส์, ค่าเจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาล, ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ, ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล, ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า, ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าตรวจรับงาน และให้กองวิเคราะห์น้ำบาดาล เป็นเงินงบประมาณ ๑,๒๐๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยมีรายละเอียดตามรายการแผนการจัดสรรงบประมาณ เอกสารแนบ ๕ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศเชิญชวนว่าส่วนราชการจะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนเงินจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔

๒. มอบหมาย กผ. สพ.สบก. และ สค.สบก.พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมชัย ทองบางพึ่ง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

เรียน อคพ.
เพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติในหลักการ และมีเงื่อนไข
ให้ กผ./สบก./สพ. สามารถ
ดำเนินการได้

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘

- เห็นชอบ
- อนุมัติ ข้อ 1
- มอบ กผ./สพ.สบก./สค.สบก.
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ด้วย

(นายปราณีต ร้อยบาง)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	ระยะเวลา											
					ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง							446	446				
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ							142	250	250	250		
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด							892					
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ							892					
5	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ							142	250	250	250		
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง							142	250	250	250		
7	ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง							142	250	250	250		
8	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	499,520,000	892	แห่ง									449		443	
9	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง							142	250	250	250		
10	ดำเนินการทางพัสดุ	178,400														
11	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	2,676,000														
12	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าตรวจรับงาน	2,230,000														
	รวม	713,600,000		บาท												

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในหัสโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเปี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซิเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า

6.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบลงทุน รายการแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน	กิจกรรม													รวมเป็นเงิน
	จำนวนบ่อ	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์/จุฬกธรณี	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าดำเนินการทางพัสดุ	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าตรวจรับงาน	
สทบ.1 (สำปาง)	125	1,762,400	12,500,000			1,050,000		81,250		1,778,075		250,000	312,500	17,734,225
สทบ.2 (สุพรรณบุรี)	9	114,400	900,000			75,600		5,850		124,335		18,000	22,500	1,260,685
สทบ.3 (สระบุรี)	24	355,900	2,400,000			201,600		15,600		346,560		48,000	60,000	3,427,660
สทบ.4 (ขอนแก่น)	16	257,600	1,600,000			134,400		10,400		427,140		32,000	40,000	2,501,540
สทบ.5 (นครราชสีมา)	244	3,928,400	24,400,000			2,049,600		158,600		6,997,760		488,000	610,000	38,632,360
สทบ.6 (ตรัง)	90	1,449,000	9,000,000			756,000		58,500		1,939,850		180,000	225,000	13,608,350
สทบ.7 (กำแพงเพชร)	9	144,900	900,000			75,600		5,850		157,085		18,000	22,500	1,323,935
สทบ.8 (ราชบุรี)	5	68,300	500,000			42,000		3,250		49,975		10,000	12,500	686,025
สทบ.9 (ระยอง)	71	1,143,100	7,100,000			596,400		46,150		1,433,215		142,000	177,500	10,638,365
สทบ.10 (อุดรธานี)	24	386,400	2,400,000			201,600		15,600		660,460		48,000	60,000	3,772,060
สทบ.11 (อุบลราชธานี)	217	3,493,700	21,700,000			1,822,800		141,050		6,020,705		434,000	542,500	34,154,755
สทบ.12 (สงขลา)	58	933,800	5,800,000			487,200		37,700		1,525,670		116,000	145,000	9,045,370
รวมเขต	**892**	**14,037,900**	**89,200,000**			**7,492,800**	**-**	**579,800**	**-**	**21,460,830**	**-**	**1,784,000**	**2,230,000**	**136,785,330**
กวน.							1,204,200							1,204,200
สพบ.				37,797,500	37,222,570				499,520,000		178,400	892,000		575,610,470
รวม	**892**	**14,037,900**	**89,200,000**	**37,797,500**	**37,222,570**	**7,492,800**	**1,204,200**	**579,800**	**499,520,000**	**21,460,830**	**178,400**	**2,676,000**	**2,230,000**	**713,600,000**

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า

6.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	ลักษณะงาน (/) งานที่เสร็จภายในปี 2558	วิธีการ (/) จัดซื้อ	วิธีการ (/) จัดจ้าง	วิธีการ (/) สอบราคา	วิธีการ (/) ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) ไม่มี	แผนปฏิบัติการ: ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ: คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ: คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี2558 (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน: งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	แผนการจ่ายเงิน: งบนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
1)	**โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 892 แห่ง**																	
		1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 และ 2 แรงม้า	892	ชุด		/				/	/		Apr-58	May-58	Jun-58	37,797,500.00		
		รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า	703	ชุด												28,612,100.00		@40,700 บาท
		รายการที่ 2 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า	189	ชุด												9,185,400.00		@48,600 บาท
		2) ท่อและอุปกรณ์														37,222,570.00		
		รายการที่ 1 ท่อกรุพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาดระบุ 150 มม.	15,031	ท่อน		/				/	/		Apr-58	May-58	Jun-58	30,813,550.00		@ 2,050 บ.
		รายการที่ 2 ท่อเจาะร่องพีวีซีแข็ง แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาขนาดระบุ 150 มม.	2,676	ท่อน		/				/	/		Apr-58	May-58	Jun-58	5,726,640.00		@ 2,140 บ.
		รายการที่ 3 ฝาครอบท่อรับทรายพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.	892	อัน		/				/	/		Apr-58	May-58	Jun-58	392,480.00		@ 440 บ.
		รายการที่ 4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	892	กระป๋อง		/				/	/		Apr-58	May-58	Jun-58	289,900.00		@ 325 บ.
		3) หอถังเหล็กพักน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 12.60 เมตร	892	ระบบ		/				/	/		Apr-58	May-58	Jun-58	499,520,000.00		@ 560,000 บ.
		4) ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	892	อัน						/	/		Apr-58	May-58	Jun-58	579,800.00		@ 650 บ.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13.2 รับโอนจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 892 แห่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2558 จำนวน 442,709,000 บาท และตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2559 จำนวน 270,891,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 713,600,000 บาท

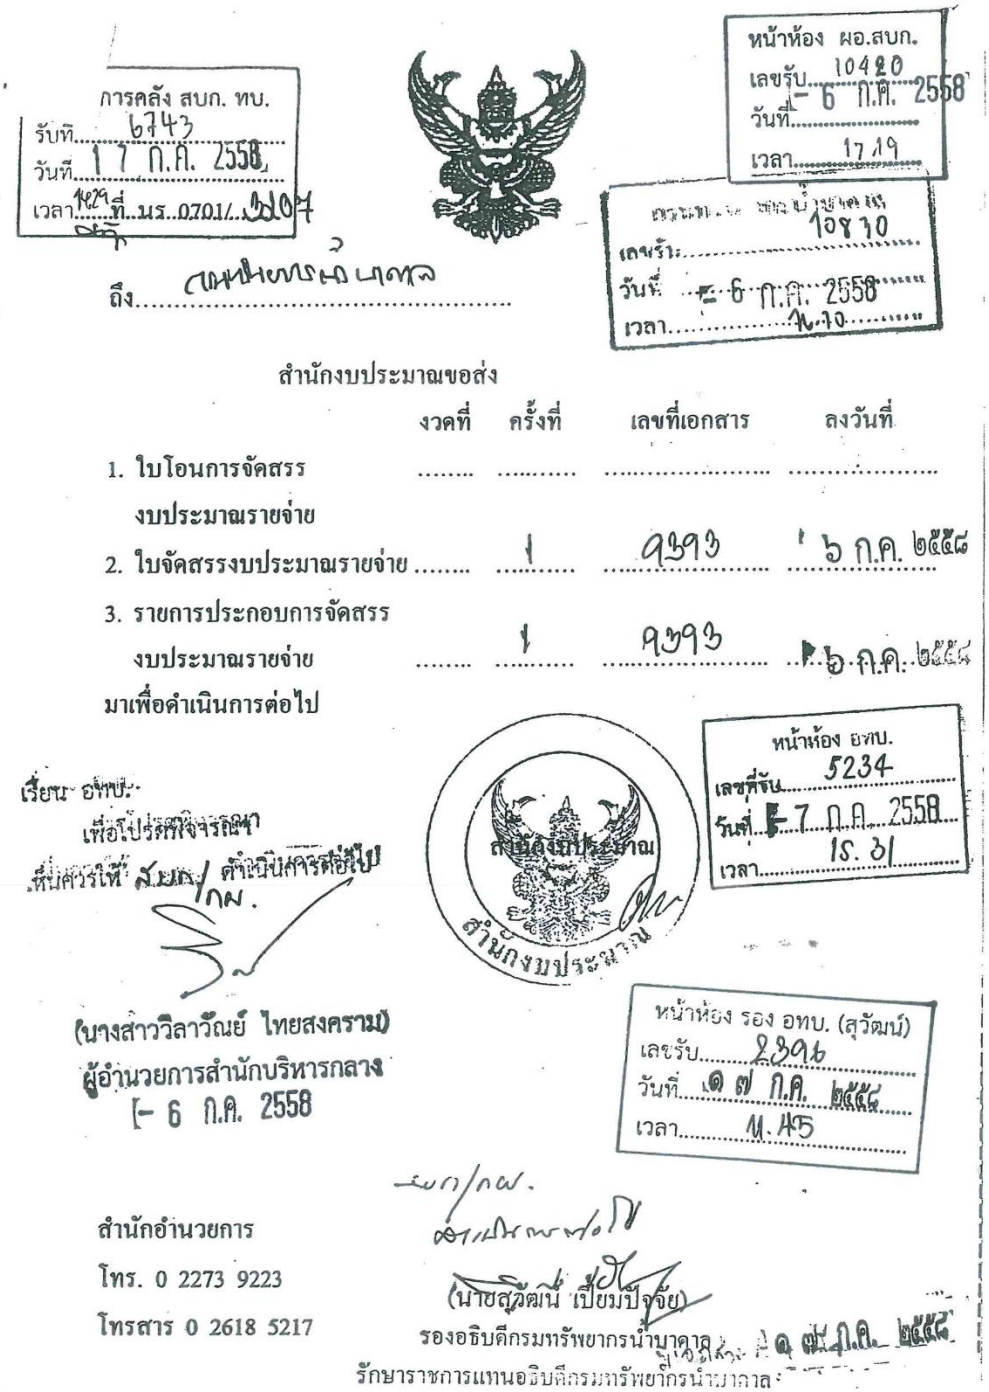

การคลัง สบก. ทบ.
รับที่ 6743
วันที่ 17 ก.ค. 2558
เวลา 14.29
ที่ นร 0701/ 3407

หน้าห้อง ผอ.สบก.
เลขรับ 10420
วันที่ 6 ก.ค. 2558
เวลา 17.19

เลขรับ 10870
วันที่ 6 ก.ค. 2558
เวลา 16.10

ถึง

สำนักงบประมาณขอส่ง

	งวดที่	ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่
1. ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	.....	.....	.....	.....
2. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	.....	1	9393	6 ก.ค. ๒๕๕๘
3. รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	.....	1	9393	6 ก.ค. ๒๕๕๘

มาเพื่อดำเนินการต่อไป

เรียน อทบ.
เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควรให้ สบก./กพ. ดำเนินการต่อไป

สำนักงบประมาณ

หน้าห้อง อทบ.
เลขที่รับ 5234
วันที่ 7 ก.ค. 2558
เวลา 15.31

(นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
6 ก.ค. 2558

หน้าห้อง รอง อทบ. (สุวัฒน์)
เลขรับ 2396
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘
เวลา 11.45

สบก./กพ.

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักอำนวยการ
โทร. 0 2273 9223
โทรสาร 0 2618 5217

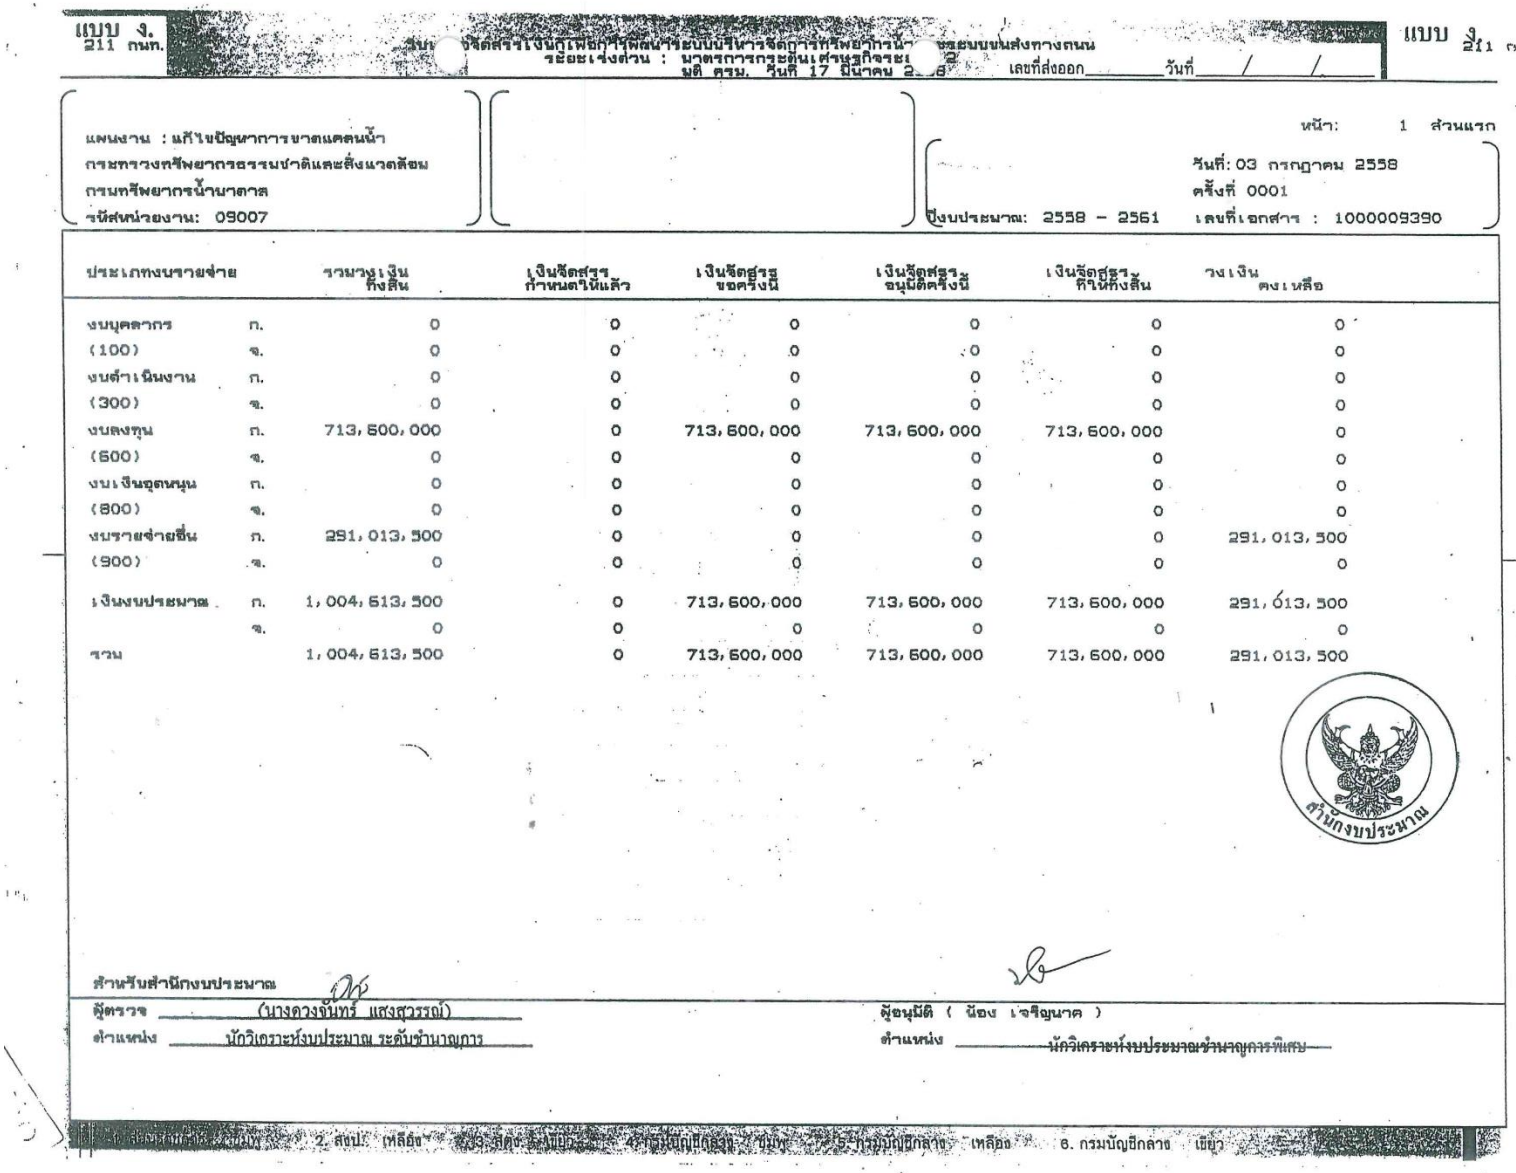

แบบ จ. 211 กนท.

ขอจัดสรรเงินกู้เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2
มติ ครม. วันที่ 17 มีนาคม 2558

แบบ จ. 211 กนท.

เลขที่ส่งออก _____ วันที่ ___/___/___

แผนงาน : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยงาน: 09007

หน้า: 1 ส่วนแรก

วันที่: 03 กรกฎาคม 2558
ครั้งที่ 0001
ปีงบประมาณ: 2558 - 2561 เลขที่เอกสาร : 1000009390

ประเภทงบรายจ่าย		รวมวงเงินทั้งสิ้น	เงินจัดสรรที่กำหนดให้แล้ว	เงินจัดสรรขอครั้งนี้	เงินจัดสรรอนุมัติครั้งนี้	เงินจัดสรรที่ให้ทั้งสิ้น	วงเงินคงเหลือ
งบบุคลากร	ก.	0	0	0	0	0	0
(100)	จ.	0	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน	ก.	0	0	0	0	0	0
(300)	จ.	0	0	0	0	0	0
งบลงทุน	ก.	713,600,000	0	713,600,000	713,600,000	713,600,000	0
(500)	จ.	0	0	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	ก.	0	0	0	0	0	0
(800)	จ.	0	0	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	ก.	291,013,500	0	0	0	0	291,013,500
(900)	จ.	0	0	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ก.	1,004,613,500	0	713,600,000	713,600,000	713,600,000	291,013,500
	จ.	0	0	0	0	0	0
รวม		1,004,613,500	0	713,600,000	713,600,000	713,600,000	291,013,500

สำนักงบประมาณ

สำหรับสำนักงบประมาณ

ผู้ตรวจ (นางดวงจันทร์ แสงสุวรรณ์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ

ผู้อนุมัติ (น้อง เจริญนาค)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

1. สงป. เหลือง 2. สงป. เหลือง 3. สตง. ม่วง 4. กรมบัญชีกลาง ชมพู 5. กรมบัญชีกลาง เหลือง 6. กรมบัญชีกลาง เขียว

14. การจัดซื้อจัดจ้าง

1) การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 834 แห่ง รวม 11 เขต โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	คู่สัญญา	สัญญาเลขที่	วงเงินสัญญา	จำนวน (แห่ง)
1	บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี จำกัด	191/2559 ลว 26 ส.ค. 59	53,553,500.00	125
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธร ชัพพลาย	204/2559 ลว 23 ก.ย. 59	3,857,778.00	9
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธร ชัพพลาย	208/2559 ลว 23 ก.ย. 59	10,369,584.00	24
4	บริษัท วรรณา จีระ จำกัด	206/2559 ลว 23 ก.ย. 59	6,916,480.00	16
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิยนต์	192/2559 ลว 26 ส.ค. 59	103,439,896.00	244
6	บริษัท โรลลิ่ง คอนเซ็ปต์ อินโนเวชั่น จำกัด	190/2559 ลว 26 ส.ค. 59	40,469,400.00	90
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธร ชัพพลาย	205/2559 ลว 23 ก.ย. 59	3,848,148.00	9
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธร ชัพพลาย	203/2559 ลว 23 ก.ย. 59	2,138,930.00	5
9	บริษัท วรรณา จีระ จำกัด	201/2559 ลว 13 ก.ย. 59	30,615,910.00	71
10	บริษัท วรรณา จีระ จำกัด	207/2559 ลว 13 ก.ย. 59	10,274,568.00	24
11	บริษัท โรลลิ่ง คอนเซ็ปต์ อินโนเวชั่น จำกัด	193/2559 ลว 26 ส.ค. 59	93,502,913.00	217
	รวมทั้งสิ้น		**358,987,107.00**	**834**

2) การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 24 แห่ง พื้นที่ สทบ. เขต 12 โดยวิธีพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	คู่สัญญา	สัญญาเลขที่	วงเงินสัญญา	จำนวน (แห่ง)
1	บริษัท สหชลทิศ จำกัด	291/2560 ลว 29 มิ.ย. 60	11,000,000.00	24

3) การจัดซื้อท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ รวม 12 เขต โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	คู่สัญญา	สัญญาเลขที่	วงเงินสัญญา	สทบ.เขต
1	บริษัท โรลลิ่ง คอนเซ็ปต์ อินโนเวชั่น จำกัด	116/2558 ลว 15 ก.ย. 58	30,522,775.00	1-12

4) การจัดซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี จำนวน 4 รายการ รวม 12 เขต โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	คู่สัญญา	สัญญาเลขที่	วงเงินสัญญา	สทบ.เขต
1	บริษัท สิมะกิจคอมเมอเชียล จำกัด	30/2559 ลว 23 ธ.ค. 58	3,045,116.00	1-12

5) การจัดซื้อท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ (สำหรับระบบประปา) จำนวน 12 รายการ โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	คู่สัญญา	สัญญาเลขที่	วงเงินสัญญา	สทบ.เขต
1	บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด	51/59 ลว 28 ม.ค. 59	18,738,636.08	1,3,4,5 และ 11
2	บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด	55/59 ลว 2 ก.พ. 59	4,573,792.00	6 และ 12
3	บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด	56/59 ลว 2 ก.พ. 59	3,557,246.20	2,7,8,9 และ 10
	รวมทั้งสิ้น		**26,869,674.28**	

15. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๑.เหตุผลความจำเป็น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณหลัก ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยดำเนินโครงการตามหมวดรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวน ๓,๘๐๒ แห่ง ดังนั้น

๑.๑ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ ๑ (๒๐๐ แห่ง)

๑.๒ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ ๒ (๔๘๘ แห่ง)

๑.๓ รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (๑,๘๓๖ แห่ง)

๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๑ (๓๓ แห่ง)

๑.๕ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๒ (๑,๒๔๕ แห่ง)

๒. งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง

๓. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เงินกู้) ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๘๙๒ แห่ง

ซึ่งจากการดำเนินโครงการฯ หมวดรายจ่ายงบลงทุนข้างต้น ประสบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ตามแผนงานได้ ด้วยหลายสาเหตุ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ แต่เนื่องจากรหัสงบประมาณของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เงินกู้) เป็นรหัสงบประมาณรายแห่ง ทำให้การเปลี่ยนแปลง แก้ไขสถานที่ดำเนินการ ถือเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณฯ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๒๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๑ กรม เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

๑.๒ กรม เสนออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ(สถานที่) ตามอำนาจ สำนักงบประมาณ

๑.๓ กรม รายงานให้ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบ ภายใน ๓ วันทำการ

/๒. งบกลาง ...

๒. งบกลาง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔ หนังสือสำนักงบประมาณ นร ๐๗๐๔/ว ๓๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ และตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๒๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒.๑ กรม เสนอ คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี๒๕๕๘/๕๙(กระทรวงเกษตรฯ) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

๒.๒ กรม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ตามอำนาจ สำนักงบประมาณ

๒.๓ กรม รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบ ภายใน ๓ วันทำการ

๓. งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เงินกู้) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน และหนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๔/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๒)

๓.๑ กรมเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อพิจารณานำเรียน คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๓.๒ กรม เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ กรมรายงานให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบ ภายใน ๓ วันทำการ

๒. ขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ในส่วนของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีการแก้ไขรายชื่อหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ การยกเลิกรายการ(งบเงินกู้) หมวดรายจ่าย งบลงทุน แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้

๑. การแก้ไขรายชื่อสถานที่ ที่พิมพ์ผิด ไม่ถูกต้อง (ไม่ใช่การเปลี่ยนรายการ เป็นอำนาจหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติแก้ไข)

๒. การเปลี่ยนแปลงสถานที่จากแผนเดิมเป็นแผนใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ **เป็น อำนาจ สำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด**

๓. การยกเลิกโครงการ (งบเงินกู้) ให้พิจารณายกเลิกพื้นที่เดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทุกกรณี เว้นแต่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการว่ายังมีหมู่บ้านที่ไม่มีประปาตกสำรวจจากเป้าหมายเดิม หรือพื้นที่ที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ กนช. รับรองว่ามีเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข และไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการหรือเป็นหมู่บ้านประสบภัยแล้งเร่งด่วน ต้องได้รับการช่วยเหลือ ทั้งนี้หมู่บ้านกรณีนี้ต้องมีหลักฐานยืนยันรับรองจาก ปภ. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหมู่บ้านประสบภัยแล้งต้องรีบแก้ไขโดยด่วน **(เป็น อำนาจ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยเสนอ กนช.ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด)**

/ขั้นตอน...

ขั้นตอน :กรณีที่ ๑

๑. สทบ.เขต ๑-๑๒ รวบรวมรายชื่อการแก้ไขรายชื่อให้ถูกต้อง และแจ้ง สำนักผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมเพื่อเสนอ อทบ.พิจารณาอนุมัติ แก้ไขรายชื่อ ภายในไตรมาสแรก

๒. สำนักรับผิดชอบโครงการ รวบรวมคำขอและจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอ อทบ. พิจารณาอนุมัติแก้ไขภายในไตรมาสแรก

๓. หลังจาก อทบ.อนุมัติแล้วให้สำนักที่รับผิดชอบโครงการ แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป (กผ./สทบ.เขต ที่เกี่ยวข้อง/ส่วนการคลัง/ส่วนพัสดุ/ศทส.)

๔. สทบ.เขต ๑-๑๒ แจ้งผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญา

๕. ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการจ้าง ขอ อนุมัติ อทบ. ผ่านหัวหน้าพัสดุ เพื่อแก้ไขสัญญา

ขั้นตอน :กรณีที่ ๒

๑. สทบ.เขต ๑-๑๒ รวบรวมคำขอเปลี่ยนแปลงเป็นรายโครงการ ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายการ (สถานที่) พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

๑.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

-หนังสือยืนยันไม่ขอรับโครงการจากเจ้าของพื้นที่ ยินดีให้ปรับเปลี่ยนสถานที่จากพื้นที่เดิม โดย อบต. หรือผู้มีอำนาจลงนามรับรอง **หรือ** ผลการเจาะบ่อบาดาล/ผลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ Resistivity/ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ e-log /ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

-หนังสือคำขอจากพื้นที่ใหม่ โดย อบต. หรือผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

๑.๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

-หนังสือยืนยันไม่ขอรับโครงการ และยินดีให้ปรับเปลี่ยนสถานที่ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเทียบเท่าหรือผู้มีอำนาจ ลงนามรับรอง **หรือ** ผลการเจาะบ่อบาดาล/ผลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ Resistivity/ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ e-log /ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

-หนังสือคำขอจากพื้นที่ใหม่ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเทียบเท่า หรือผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

๒. สทบ.เขต ๑-๑๒ แจ้ง สำนักผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมทั้งส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลง รวบรวมเพื่อเสนอสำนักผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอ อทบ. พิจารณาเห็นชอบ และมอบหมายให้ กผ.รวบรวมเพื่อเสนอ รมว.ทส. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

๓. รมว.ทส. เห็นชอบแล้ว ให้ กผ. เสนอ สำนักงบประมาณอนุมัติ

๔. หลังจาก สำนักงบประมาณ อนุมัติ ให้ กผ. แจ้ง (สำนักรับผิดชอบโครงการ/สทบ.เขต ที่เกี่ยวข้อง/ส่วนการคลัง/ส่วนพัสดุ/ศทส.) เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๕. สทบ.เขต แจ้งผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญา

๖. ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการจ้าง ขออนุมัติ อทบ.ผ่านหัวหน้าพัสดุ เพื่อแก้ไขสัญญาต่อไป

ทั้งนี้ให้ กผ. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทราบภายใน ๓ วันทำการ

/หลักเกณฑ์...

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน)

หลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ	ความจำเป็นของ ทบ.	เอกสารหลักฐาน
๑. ไม่สามารถดำเนินการในสถานที่แห่งเดิมได้ เนื่องจากมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือด้วยเหตุผลอื่นใดอันเล็งเห็นผลได้อย่างแน่ชัดว่าจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จได้	-พื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล (น้ำน้อย/น้ำเค็ม) -พื้นที่/กลุ่มผู้ใช้น้ำยังไม่พร้อมในการบริหารจัดการโครงการ/ไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง	๑. รายงานผลผลการเจาะบ่อบาดาล/ผลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ Resistivity/ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ e-log /ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล **หรือ** หนังสือรับรองไม่ประสงค์ขอรับโครงการของพื้นที่เดิม ๒. หนังสือคำขอของพื้นที่ใหม่
๒. หมดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในสถานที่แห่งเดิม เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้เงินจากแหล่งอื่น หรือมีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นไปแล้ว	-ดำเนินการแล้ว/ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น/ซ้ำซ้อน/ท้องถิ่นได้ใช้บ่อของ ทบ.ไปแล้ว	๑. หนังสือรับรองไม่ประสงค์ขอรับโครงการของพื้นที่เดิม ๒หนังสือคำขอของพื้นที่ใหม่
๓. มีเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการในสถานที่แห่งใหม่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	-ความจำเป็นเร่งด่วนของพื้นที่ใหม่ (มีพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วน ตามประกาศของ ปภ./มติ ครม./กนช. ที่มีนโยบายให้ ทบ. เข้าดำเนินการช่วยเหลือ)	๑. หนังสือรับรองไม่ประสงค์ขอรับโครงการของพื้นที่เดิม หรือ หนังสือแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงสถานที่จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๒.หนังสือคำขอของพื้นที่ใหม่

๓. แนวทางการเร่งรัดดำเนินงาน

เห็นควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘)

๓.๑ เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๒ ให้เบิกจ่ายและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

๓.๒ เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (งบกลาง) ให้เบิกจ่ายและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓.๓ เร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ให้เบิกจ่ายและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

๓.๔ เร่งดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการงบลงทุนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

/๔.หลักเกณฑ์...

๔.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ใหม่

๔.๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค คัดเลือกตามลำดับดังนี้

๑. เลือกจากพื้นที่หมู่บ้านไม่มีระบบประปาจากข้อมูลการสำรวจระบบประปาจากกรมทรัพยากรน้ำ

๒. เลือกจากคำขอของ สทบ.เขต ๑-๑๒ (ต้องเป็นหมู่บ้านที่ยังมีความขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการว่ายังมีหมู่บ้านที่ไม่มีประปาตกสำรวจจากเป้าหมายเดิม หรือพื้นที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ กนช. รับรองว่ามีเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข และไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการหรือเป็นหมู่บ้านประสบภัยแล้งเร่งด่วน ต้องได้รับการช่วยเหลือ ทั้งนี้หมู่บ้านกรณีนี้ต้องมีหลักฐานยืนยันรับรองจาก ปภ. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหมู่บ้านประสบภัยแล้งต้องรีบแก้ไขโดยด่วน)

๓. เลือกจากข้อมูล กชช.๒ค

๔.๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

๑. เลือกจากคำขอของ สทบ.เขต ๑-๑๒

๒. เลือกตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

๔.๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง คัดเลือกตามลำดับดังนี้

๑. เลือกจากคำขอของ สทบ.เขต ๑-๑๒

๒. เลือกตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

๕.การยกเลิกโครงการ (กรณี งบเงินกู้)

จากการหารือท่านที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารพัสดุและการเงิน (นางสาวลักขณา ศรีไตรรัตน์รักษ์) ในกรณีการขอยกเลิกไม่ดำเนินงานโครงการ ด้วยสาเหตุแล้วแต่กรณีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถดำเนินการยกเลิกได้ ทั้งนี้ให้ ทบ.ดำเนินการดังนี้

๑. กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาลเกษตร ให้ ทบ. ขอแก้ไขสัญญาและคืนงบประมาณในส่วนที่จ้างเหมาก่อสร้างที่ยกเลิก โดยประเมินราคาให้ชัดเจน

๒. กรณีที่กรมดำเนินการเองในส่วนการเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้ ยุติการดำเนินงานและคืนงบประมาณในกิจกรรมที่เหลือ ที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ชัดเจน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. กรณีกรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบบ่อ ได้แก่ วัสดุท่อ และเครื่องสูบ ซึ่งถือว่าวัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าว กรมได้จัดซื้อสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว เป็นทรัพย์สินของกรม ถือว่าเป็นครุภัณฑ์คงค้าง คงเหลือจากการดำเนินโครงการสามารถเอาไปใช้ในกิจกรรมหรือภารกิจอื่นๆ ที่เร่งด่วนหรือจำเป็นของกรมได้ โดยจัดทำสรุปรายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เหลืออยู่ และมูลค่าของสิ่งของนั้นๆ เพื่อประกอบรายละเอียดในการชี้แจง และนำเรียนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบต่อไป

ตัวอย่างแบบฟอร์มกรณียกเลิก/เปลี่ยนแปลงสถานที่
หนังสือรับรองไม่ประสงค์ขอรับโครงการ

ที่บ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....
วันที่.....

เรื่อง ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต.....(จังหวัด.....)

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับบ้าน.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....พิกัด..... ZONE.....UTM E.....UTM N.....
ละติจูด.....ลองติจูด..... รหัสโครงการ.....

ในการนี้ ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องมาจากสาเหตุ

- ☐ พื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล(น้ำน้อย/น้ำเค็ม)
- ☐ ได้ดำเนินการแล้ว/ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น/ซ้ำซ้อน
- ☐ อื่น.....

ทั้งนี้ ได้รับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นที่เข้าใจดีแล้ว จึงยินยอมยกเลิกเข้าการร่วมโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....(ประธาน/ผู้นำกลุ่ม)
(.....)

ลงชื่อ.....(สมาชิกกลุ่ม)
(.....)

ลงชื่อ.....(สมาชิกกลุ่ม)
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน/ผู้รับรอง
(.....)
ตำแหน่ง.....
(ผู้นำท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
(หน่วยงาน อปท.)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(.....)
ตำแหน่ง.....

16 . ระเบียบและหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้

16.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558

หน้า ๑
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารโครงการเงินกู้ดังกล่าวเป็นไปโดยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“โครงการ” หมายความว่า แผนงานหรือโครงการภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการและใช้จ่ายเงินกู้

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุมัติหรือมอบหมายให้ดำเนินการตามโครงการ

“เงินกู้” หมายความว่า เงินที่กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อนำไปใช้จ่ายภายใต้โครงการ

ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

หน้า ๒
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๕ การบริหารโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และการรายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ดำเนินการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการและให้มีการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๖ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พิจารณาคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ พิจารณาคำขอใช้เงินสำรองจ่าย และพิจารณาคำขอใช้เงินเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ให้กรมบัญชีกลางรับฝากเงินกู้ไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง และจัดทำระบบบัญชีระบบการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๘ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการเปิดบัญชี และนำฝากเงินกู้ไว้ในบัญชี จัดทำระบบบริหารเงินสดและรายงานสถานะเงินกู้ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ ในกรณีที่โครงการใดต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยหรือกำหนดวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะเรื่อง

หมวด ๒
การดำเนินโครงการ

ข้อ ๑๑ การดำเนินโครงการให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดสรรวงเงินกู้ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

(๒) ให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยให้สำนักงบประมาณส่งข้อมูลตาม (๑) ให้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งประมาณการการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนให้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่าย

ข้อ ๑๒ การดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุให้ผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัย รวมทั้ง พิจารณาการอนุมัติการยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเริ่มดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการพัสดุได้ทันทีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินโครงการ แต่จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินกู้จากสำนักงบประมาณแล้ว

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงบประมาณกำหนด

หมวด ๓
การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้

ข้อ ๑๕ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนำเงินกู้ฝากกระทรวงการคลังในบัญชีเงินนอกงบประมาณที่กรมบัญชีกลาง โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน”

ข้อ ๑๖ การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ และหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

หน้า ๔
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมวด ๔
การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน

ข้อ ๑๗ เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลการดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการเพื่อสนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน และการประเมินผลโครงการ

(๒) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด

(๓) ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายเงิน

(๔) ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

หมวด ๕
การใช้เงินสำรองจ่าย และเงินเหลือจ่าย

ข้อ ๑๘ ให้สำนักงบประมาณและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะร่วมกันพิจารณากำหนดเงินกู้เป็นเงินสำรองจ่ายตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อจัดเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม

การใช้เงินสำรองจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ ๑๙ ในกรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับการจัดสรรเงินกู้และทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หากหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้เสนอขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินจากเงินเหลือจ่ายของโครงการนั้น หรือภายใต้วงเงินเหลือจ่ายทั้งหมดตามที่กระทรวงการคลังแจ้ง ในกรณีที่เงินเหลือจ่ายไม่เพียงพอให้ใช้เงินสำรองจ่าย

หน้า ๕
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒๐ เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการใดเสร็จสิ้นแล้ว หากมีเงินคงเหลือของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งคืนเข้าบัญชีตามข้อ ๑๕

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะปิดบัญชีเงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน และนำเงินที่เหลือในบัญชีดังกล่าวส่งคืนคลัง

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๑ การดำเนินการใดที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการตามระเบียบนี้ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และการดำเนินการต่อไปสำหรับโครงการนั้นให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

16.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๗๙

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามระเบียบที่อ้างถึง ข้อ ๖ ข้อ ๑๑ (๑) ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ กำหนดให้สำนักงบประมาณมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และพิจารณาคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งพิจารณาคำขอใช้เงินสำรองจ่ายและเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยให้สำนักงบประมาณมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ นั้น

เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน สำนักงบประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



01/สพ. 670/2558
เรียน ผอ.กม., ผอ.สค. และ สทบ.เขต 1-12
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(นายสุเทพ เรืองรองสรไกร)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
2 มิ.ย. 2558

สำนักกฎหมายและระเบียบ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๙๓
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส คุ้มค่า และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ ข้อ ๑๑ (๑) ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ สำนักงบประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดสรรเงินกู้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ การใช้เงินเหลือจ่ายของโครงการและการใช้เงินสำรองจ่ายตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฉบับนี้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฉบับนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย

ข้อ ๒ กรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ หรือกรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารกระดาษแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้เอกสารกระดาษที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการจัดให้มีผู้ประสานงาน โดยแจ้งรายชื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณทราบด้วย

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฉบับนี้ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องอื่นใดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการ ให้ผู้ประสานงานรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อสั่งการในการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงบประมาณโดยเร็ว

ข้อ ๔ กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะชะลอ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรี ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี

หมวด ๒
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำหนังสือแจ้งสำนักงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าว

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรายละเอียดโครงการไปจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมีคำยืนยันของหน่วยงานเจ้าของโครงการว่า ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสาระสำคัญถูกต้องตรงตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว รวมทั้งชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรายละเอียดของโครงการด้วย

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทำให้สาระสำคัญ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอต่อสำนักงบประมาณ

กรณีที่แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ตามวรรคหนึ่งยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ให้จัดทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่ โดยให้จัดส่งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีหนังสือแจ้งสำนักงบประมาณทุกครั้งที่มีการแก้ไข

ข้อ ๖ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้ตามข้อ ๕ แล้ว จะจัดส่งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ และมีหนังสือแจ้งการให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาส่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและกรมบัญชีกลาง

หมวด ๓
การจัดสรรเงินกู้และการใช้จ่ายเงินกู้

ข้อ ๗ เมื่อได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้จากสำนักงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินกู้พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อสำนักงบประมาณ

กรณีตามวรรคหนึ่ง สำหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้

(๑) รายการครุภัณฑ์ ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะและประมาณการราคา หรือผลการจัดหาของแต่ละรายการ เว้นแต่เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(๒) รายการที่ดิน ให้ระบุประมาณการราคา ขนาดพื้นที่ และแผนผังโดยสังเขปของที่ดินดังกล่าว รวมทั้งราคากลางที่ดินซึ่งกรมธนารักษ์เป็นผู้ประมาณการราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาดในบริเวณและระยะเวลาใกล้เคียง หรือรายละเอียดอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

(๓) รายการก่อสร้าง ให้ระบุประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบรูปรายการโดยสังเขป ราคากลาง หรือประมาณการราคา หรือรายละเอียดอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา เว้นแต่เป็นแบบรูปมาตรฐานของทางราชการ หรือแบบรูปรายการที่สำนักงบประมาณเคยให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว

(๔) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ข้อ ๘ เมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายของโครงการแล้ว จะจัดสรรเงินกู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำเอกสารตามแบบที่กำหนดส่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยมีหนังสือแจ้งการจัดสรรเงินกู้ดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาส่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายและได้รับการจัดสรรเงินกู้แล้ว ให้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามวงเงินและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด

ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แต่จะลงนามสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อได้รับการจัดสรรเงินกู้แล้ว

สำนักงบประมาณอาจกำหนดวิธีการจัดสรรเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้หรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่ากรอบวงเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามนัยข้อ ๗ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๐ การใช้จ่ายเงินกู้ให้ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม โปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่สำนักงบประมาณกำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้

(๒) งบดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้

(๓) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ตามรายการและวงเงินที่ได้รับจากการจัดสรรตามข้อ ๘

(๔) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ดังนี้

ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดในการจัดสรร

ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จำนวนเงินและรายละเอียดอื่นใดที่กำหนดในการจัดสรร ทั้งนี้ ให้นำความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

(๕) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ และให้เบิกจ่ายตามรายการและจำนวนเงินที่กำหนดในการจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทั้งนี้ ให้นำความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวด ๔
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้ดำเนินการได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน รวมทั้งจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ ความประหยัด ความคุ้มค่า และจะต้องไม่ทำให้สาระสำคัญ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง

ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๑ พร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณ

สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้เสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ก่อนเสนอต่อสำนักงบประมาณด้วย

ข้อ ๑๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการมีอำนาจแก้ไขรายละเอียดของโครงการที่ระบุไว้ในใบจัดสรรเงินกู้เฉพาะในกรณีการพิมพ์ข้อความคลาดเคลื่อน ตกหล่นไปจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฉบับนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

หมวด ๕
การใช้เงินสำรองจ่ายและเงินเหลือจ่าย

ข้อ ๑๕ การขอใช้เงินกู้ที่เป็นเงินสำรองจ่าย ให้ขอใช้ได้เฉพาะกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

(๒) กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่อาจดำเนินโครงการภายในวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินการตามนัยข้อ ๙ แล้ว

(๓) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มเติม

(๔) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม

การขอใช้เงินตาม (๒) (๓) และ (๔) หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีเงินเหลือจ่าย หน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่แจ้งวงเงินเหลือจ่ายของโครงการนั้นๆ ต่อสำนักงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกู้เพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างต่อไป

หมวด ๖
การรายงานผล

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อรายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือและจัดทำเอกสารส่งสำนักงบประมาณภายในวันศุกร์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน

17. การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

17.1 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 โดยขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานจากเดือนกันยายน 2558 เป็นเดือนตุลาคม 2558 เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเดิม และขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จำนวน 15 แห่ง ด้วยเหตุผลความจำเป็นจากพื้นที่ไม่มีศักยภาพ, พื้นที่ซ้ำซ้อน, ไม่มีสถานที่ก่อสร้างและเจ้าของพื้นที่ไม่ความต้องการเนื่องจากใช้ระบบประปาร่วมกับหมู่บ้านข้างเคียงแล้ว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2793 1047 โทรสาร 0 2793 1037

ที่ 05/ 588 วันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ. ผ่าน รอง อทบ. (สุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)

เรื่องเดิม

ตามที่ สพบ.ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) วงเงินงบประมาณ 713,600,000 บาท ตามหนังสือ ที่ 05/318 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการและการกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ได้ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้ตามแผนงานเดิม และในส่วนของสถานที่ดำเนินโครงการ สพบ.เขต 1-12 ได้ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ จำนวน 33 แห่ง

ข้อพิจารณา

สพบ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ใหม่ ตามเอกสารแนบ 1 และได้ส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ตามเอกสารแนบ 2

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ เป็นไปตามแผน เห็นควร พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติแผนปฏิบัติงาน
2. อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนจัดซื้อจัดจ้าง และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ตามข้อ 1, 2 ,3 และ 4

2. มอบหมาย กผ. สพ.สบก. และ สค.สบก.พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมชัย ทองบางพึ่ง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปิ่นจัย)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘

(นายปราณีต ร้อยบาง)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๖ พ.ค. 2558

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	ระยะเวลา											
					ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง								446	446				
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ								142	250	250	250		
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด									892				
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ									892				
5	สูบทดลองปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ								142	250	250	250		
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง								142	250	250	250		
7	ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง								142	250	250	250		
8	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	499,520,000	892	แห่ง										491		401	
9	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง								142	250	250	250		
10	ค่าเดินทางทางพัสดุ	178,400															
11	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	2,676,000															
12	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าตรวจรับงาน	2,230,000															
	รวม	713,600,000		บาท													

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดตัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า

6.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ระยะเวลา												รวมทั้งสิ้น
					ก.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	บ่อ								1,962,900	4,025,000	4,025,000	4,025,000		14,037,900
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ								14,200,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		89,200,000
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	บอ									37,797,500				37,797,500
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ									37,222,570				37,222,570
5	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บอ								1,192,800	2,100,000	2,100,000	2,100,000		7,492,800
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	บ่อ								191,700	337,500	337,500	337,500		1,204,200
7	ป้ายปักบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	บ่อ								92,300	162,500	162,500	162,500		579,800
8	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	499,520,000	892	ตัวอย่าง										278,960,000		224,560,000	499,520,000
9	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง								1,464,730	7,291,250	6,950,950	2,753,900		21,460,830
10	ค่าเช่นการทางหัสดุ	178,400		บาท								28,400	50,000	50,000	50,000		178,400
11	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	2,676,000		บาท								426,000	750,000	750,000	750,000		2,676,000
12	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าตรวจรับงาน	2,230,000		บาท								355,000	625,000	625,000	625,000		2,230,000
	รวม	713,600,000		บาท								22,913,830	115,361,320	314,960,950	35,803,900	224,560,000	713,600,000

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในหัวโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โทรทะเบง กรวดกัด บุนซีเมนต์ ฟันเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ พบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า

6.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	ลักษณะงาน (/) งานที่เสร็จภายในปี 2558	วิธีการ (/) จัดซื้อ	วิธีการ (/) จัดจ้าง	วิธีการ (/) สอบราคา	วิธีการ (/) ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) ไม่มี	แผนปฏิบัติการ: ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ: คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ: คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี2558 (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน: งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	แผนการจ่ายเงิน: งบนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
1)	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม) จำนวน 892 แห่ง																	
		1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 และ 2 แรงม้า	892	ชุด		/				/	/		พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	37,797,500.00		
		รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า	703	ชุด												28,612,100.00		@40,700 บาท
		รายการที่ 2 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 แรงม้า	189	ชุด												9,185,400.00		@48,600 บาท
		2) ท่อและอุปกรณ์														37,222,570.00		
		รายการที่ 1 ท่อกรุพีวีซีแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาดระบุ 150 มม.	15,031	ท่อน		/				/	/		พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	30,813,550.00		@ 2,050 บ.
		รายการที่ 2 ท่อเจาะร่องพีวีซีแข็ง แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาขนาดระบุ 150 มม	2,676	ท่อน		/				/	/		พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	5,726,640.00		@ 2,140 บ.
		รายการที่ 3 ฝาครอบท่อกันทรายพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.	892	อัน		/				/	/		พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	392,480.00		@ 440 บ.
		รายการที่ 4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดหิ้ว ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	892	กระป๋อง		/				/	/		พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	289,900.00		@ 325 บ.
		3) หอถังเหล็กพักน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 12.60 เมตร	892	ระบบ		/				/	/		พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	499,520,000.00		@ 560,000 บ.

ลายมือชื่อ_____ผู้จัดทำ

(นางสาวณกวรรณ กลิ่นรอง)

วิสวกรปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ_____ผู้รับผิดชอบ

(นายลมชัย ทองบางพึ่ง)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนใหม่							แผนเดิม							หมายเหตุ
ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สทบ.เขต	ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สทบ.เขต	
1	บ้านห้วยสลัก	21	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย	1	11	บ้านป่าแดงหลวง	11	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย	1	ซ้ำซ้อนกับแผน ปี 2559
2	บ้านเขื่อนแก้ว	9	ท่าสาย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	31	บ้านป่าตึง	6	ดงมหาวัน	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	1	ซ้ำซ้อนกับแผน ปี 2559
3	บ้านร่องลึก	13	สันกลาง	พาน	เชียงราย	1	32	บ้านใหม่ห่อหมวย	11	ดงมหาวัน	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย	1	ซ้ำซ้อนกับแผน ปี 2559
4	บ้านหินลาด	4	ขุนบ	บ้านโป่ง	ชัยภูมิ	5	179	บ้านหนองสามขา	5	หนองไผ่	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	5	ซ้ำซ้อนกับแผน ปี 2559
5	บ้านเทพนิมิตร	12	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ	5	180	บ้านป่าปอแดง	8	ภูแลนคา	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	5	ซ้ำซ้อนกับแผน ปี 2559
6	บ้านสิหม่หนองแคง	9	ขุนบ	บ้านโป่ง	ชัยภูมิ	5	181	บ้านห้วยเขือก	9	ท่าใหญ่	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	5	ไม่ต้องการ
7	บ้านบุ่งชัน	8	สระทอง	หนองทอง	บุรีรัมย์	5	373	บ้านแสลงโทน	4	แสลงโทน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5	พื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
8	บ้านบ่อหิน	14	ตะพง	เมืองระยอง	ระยอง	9	591	บ้านเขาชีปุ่ย	4	วังหว้า	แกลง	ระยอง	9	ซ้ำซ้อนกับแผน ปี 2559
9	บ้านคลองน้ำดำ	5	หนองไร่	ปลวกแดง	ระยอง	9	592	บ้านเขาคลองของ	6	หนองไร่	ปลวกแดง	ระยอง	9	ซ้ำซ้อนกับแผน ปี 2559
10	บ้านไทยเสรี	15	เขาไม้แก้ว	เขาไม้แก้ว	บึงกาฬ	10	614	บ้านโป่งเปือย	2	โป่งเปือย	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	10	ซ้ำซ้อนกับแผน ปี 2559
11	บ้านแจ้งสว่าง	15	เมืองแพะ	เขาพนมดงรัก	สุรินทร์	11	627	บ้านหนองคูมหนือ	12	ไพบูลย์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	11	ไม่มีสถานที่ก่อสร้างระบบประปา
12	บ้านหนองเตย	2	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	11	679	บ้านโพนทองพัฒนา	12	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	11	ทาง อบต. ขอเปลี่ยน
13	บ้านประอาง	3	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	11	691	บ้านโนนสว่าง	13	ผักแพว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	11	ไม่มีสถานที่ก่อสร้างระบบประปา
14	บ้านบางกรวยวาน	15	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	11	902	บ้านวารีรัตน์	5	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	11	ใช้ร่วมกับบ้านวารีรัตน์ หมู่ที่ 7
15	บ้านหนองอาเสร	16	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	11	904	บ้านนาเจริญ	9	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	11	ใช้ร่วมกับบ้านวารีรัตน์ หมู่ที่ 7

17.2 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 โดยขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานจากเดือนกันยายน 2558 เป็นเดือนธันวาคม 2558 เนื่องจากสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเดิม และปรับกิจกรรมขุดฝังและวางแนวท่อประปาให้ สทบ. เขต ดำเนินงานเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนของแนวการวางท่อในแต่ละพื้นที่ อาจส่งผลให้การส่งมอบระบบประปาล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร.๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑
ที่ ๐๒/ ๘๘๕ **วันที่** ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

เรียน อทบ.ผ่าน รอง อทบ.(สุวัฒน์)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ สพบ.ที่ ๐๕/๑๑๐๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกันฯ (เอกสารแนบ ๑)

๒. กผ. ได้ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็น ดังนี้

๒.๑ สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเดิมวางแผนการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายไว้ในเดือนพฤษภาคม -กันยายน ๒๕๕๘ จึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ค่าก่อสร้างระบบประปา ดำเนินการโดยจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา ซึ่งมีกิจกรรมในการขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา เป็นกิจกรรมที่ยังไม่มีความชัดเจนของแนวการวางท่อระบบประปาในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้าไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา และเป็นการตอบสนองนโยบายการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นของรัฐบาล เห็นควรปรับกิจกรรมขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาให้ สทบ.เขต ๑-๑๒ ดำเนินการเอง และจัดซื้อท่อระบบประปาและอุปกรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๓. เพื่อให้ดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นตามข้อเท็จจริงข้อที่ ๑ และ ๒ และเกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรพิจารณาขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนจัดซื้อ จัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ - ๕ ตามลำดับ ดังนี้

๓.๑ ปรับขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดือนพฤษภาคม -กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘

/๓.๒ ปรับเพิ่ม...

๓.๒ ปรับเพิ่มรายการค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา รวมวงเงินทั้งสิ้น ๓๘,๘๐๒,๐๐๐ บาท โอนให้ สทบ.เขต ๑-๑๒ ดำเนินการเอง และปรับเพิ่มรายการค่าท่อระบบประปาและอุปกรณ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๕๐,๓๙๘,๐๐๐ บาท โดยปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๘๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิม ๔๙๙,๕๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือค่าก่อสร้างระบบประปา วงเงิน ๔๑๐,๓๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ การปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างระบบประปาจากเดิม ๔๙๙,๕๒๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๑๐,๓๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มีการดำเนินกระบวนการจัดจ้างไว้แล้ว เห็นควรดำเนินการยกเว้นกระบวนการจัดจ้างเดิม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การปรับแผนดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้แผนงานเดิม ตามแผนงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน ๘๙๒ แห่ง วงเงิน ๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ทำให้เป้าหมายหรือสาระสำคัญของแผนงานโครงการเปลี่ยนไป และยังอยู่ในวงเงินประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๔. เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ได้อย่างคล่องตัวเหมาะสมยิ่งขึ้น บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงาน เห็นควรโอนจัดสรรงบประมาณ ให้กับ สทบ.เขต ๑-๑๒ (เอกสารแนบ ๖ และ ๗)

<u>ข้อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. อนุมัติปรับแผนฯ ตามข้อเท็จจริงที่ ๓

๒. อนุมัติโอนจัดสรรฯ ตามข้อเท็จจริงที่ ๔

๓. บัญชาให้ สบก.(สค.และ สพ.)/สพบ./กผ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายจิตรกร สุวรรณเลิศ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล

- อนุมัติ/ดำเนินการตามเสนอ
- สบก.(สค.และ สพ.) / สพบ./กผ. ดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
21/8/58

สค./สพ.
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาววิลาวัลย์ ไพยสะคราม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๒๑ ส.ค. 2558

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	ลักษณะงาน (/) งานที่เสร็จภายในปี 2558	วิธีการ (/) จัดซื้อ	วิธีการ (/) จ้าง	วิธีการ (/) สอบราคา	วิธีการ (/) ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) ไม่มี	แผนปฏิบัติการ ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	แผนการจ่ายเงิน งบนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
1)	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม) จำนวน 892 แห่ง																	
		1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 และ 2 แรงม้า	892	ชุด		/				/	/		พ.ค.-58	ส.ค.-58	ส.ค.-58	37,797,500.00		
		รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า	703	ชุด												28,612,100.00		@ 40,700 บาท
		รายการที่ 2 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2.0 แรงม้า	189	ชุด												9,185,400.00		@ 48,600 บาท
		2) ท่อและอุปกรณ์														37,222,570.00		
		รายการที่ 1 ท่อกรุพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาดระบุ 150 มม.	15,031	ท่อน		/				/	/		พ.ค.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	30,813,550.00		@ 2,050 บาท
		รายการที่ 2 ท่อเซาะร่องพีวีซีแข็ง แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาขนาดระบุ 150 มม.	2,676	ท่อน		/				/	/		พ.ค.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	5,726,640.00		@ 2,140 บาท
		รายการที่ 3 ฝาครอบท่อรับทรายพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.	892	อัน		/				/	/		พ.ค.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	392,480.00		@ 440 บาท
		รายการที่ 4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	892	กระป๋อง		/				/	/		พ.ค.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	289,900.00		@ 325 บาท
		3) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	892	ระบบ	/					/	/		ส.ค.-58	ก.ย.-58	ธ.ค.-58	410,320,000.00		@ 460,000 บาท
		4) ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์														50,398,000.00		
		4.1) ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์เพื่อระบบประปาบาดาล																
		รายการที่ 1 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 2 นิ้ว	223,000	ท่อน	/					/	/		ส.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	41,255,000.00		@ 185 บาท/ท่อน
		รายการที่ 2 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว	5,352	ท่อน	/					/	/		ส.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	224,784.00		@ 42 บาท/ท่อน
		รายการที่ 3 ข้อต่อสามทางลดพีวีซี ขนาด 2x1/2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ส.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	1,917,800.00		@ 43 บาท/อัน
		รายการที่ 4 ข้องอพีวีซี 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ส.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	1,159,600.00		@ 26 บาท/อัน
		รายการที่ 5 ฝาครอบพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ส.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	178,400.00		@ 4 บาท/อัน
		รายการที่ 6 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	5,352	กระป๋อง	/					/	/		ส.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	1,739,400.00		@ 325 บาท/กระป๋อง
		4.2) ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	1,784	ท่อน	/					/	/		ส.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	3,923,016.00		@ 2199 บาท/ท่อน

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาวดี พานทอง)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(นายสมชัย ทองบางพึ่ง)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง								392	250	250		
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ								392	250	250		
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด									892			
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ									892			
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง									892			
6	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ								392	250	250		
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง								392	250	250		
8	ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง								392	250	250		
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	410,320,000	892	แห่ง										491		401
10	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง												
11	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	38,802,000	892	แห่ง									142	250	250	250
12	ดำเนินการทางพัสดุ	178,400		บาท												
13	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	2,676,000		บาท												
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,230,000	892	แห่ง												
	รวม	713,600,000		บาท												

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดหัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ หบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

6.ปรับลดค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล จากวงเงิน 499,520,000 บาท เป็นวงเงิน 410,320,000 บาท คงเหลือเงิน 89,200,000 บาท โดยให้สหบ.เขต 1-12 ดำเนินการงานขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเอง คิดเป็นค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล จำนวน 38,802,000 บาท และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 50,396,000 บาท

7.กิจกรรมค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา

7.1 งานขุดฝัง ความกว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ราคาต่อหน่วย 15 บาท/ม.

7.2 ค่าวางท่อระบบประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ราคาต่อหน่วย 25 บาท/ม.

7.3 งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ค่าติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ8.5 ราคาต่อหน่วย 20 บาท/ม.

7.4 งานวางท่อลอดถนน ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 170 บาท/ม.

8.ค่าดำเนินการทางพัสดุ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	รวมทั้งสิ้น
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	บ่อ								5,987,900	4,025,000	4,025,000			14,037,900
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ								39,200,000	25,000,000	25,000,000			89,200,000
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ปอ								37,797,500					37,797,500
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ								37,222,570					37,222,570
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง									50,398,000				50,398,000
6	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ								3,292,800	2,100,000	2,100,000			7,492,800
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง								529,200	337,500	337,500			1,204,200
8	ป้ายบ่าสบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	ป้อ								254,800	162,500	162,500			579,800
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	410,320,000	892	แห่ง									225,860,000			184,460,000	410,320,000
10	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง								3,415,830	4,717,000	6,664,000	6,664,000		21,460,830
11	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	38,802,000	892	แห่ง										19,351,000	19,451,000		38,802,000
12	ดำเนินการทางพัสดุ	178,400		บาท								178,400					178,400
13	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	2,676,000		บาท								892,000	446,000	446,000	446,000	446,000	2,676,000
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,230,000		บาท								446,000	446,000	446,000	446,000	446,000	2,230,000
	รวม	713,600,000		บาท								129,217,000	313,492,000	58,532,000	27,007,000	185,352,000	713,600,000

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในหัวโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานลนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจั

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

6.ปรับลดค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล จากวงเงิน 499,520,000 บาท เป็นวงเงิน 410,320,000 บาท คงเหลือเงิน 89,200,000 บาท โดยให้สทบ.เขต 1-12 ดำเนินการงานขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเอง

คิดเป็นค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล จำนวน 38,802,000 บาท และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 50,398,000 บาท

7.กิจกรรมค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา

7.1 งานขุดฝัง ความกว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ราคาต่อหน่วย 15 บาท/ม.

7.2 ค่าวางท่อระบบประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ราคาต่อหน่วย 25 บาท/ม.

7.3 งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ค่าติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ8.5 ราคาต่อหน่วย 20 บาท/ม.

7.4 งานวางท่อลอดถนน ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 170 บาท/ม.

8.ค่าดำเนินการทางพัสดุ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบลงทุน รายการแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน	กิจกรรม																รวมเป็นเงิน
	จำนวนบ่อ	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์	ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	ค่าสูบทดลองปริมาณน้ำ	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ค่าป้ายปักบ่อน้ำบาดาล	ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	ค่าขนส่งการทางพัสดุ	ค่าติดตาม ประเมินผล/ประชุมโครงการ/ธนการประชาสัมพันธ์	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	
สทบ.1 (ลำปาง)	125	1,762,900	12,500,000				1,050,000		81,250		1,778,075	5,437,500		250,000	312,500	23,171,725
สทบ.2 (สุพรรณบุรี)	9	114,400	900,000				75,600		5,850		126,335	391,500		18,000	22,500	1,652,185
สทบ.3 (สระบุรี)	24	355,900	2,400,000				201,600		15,600		346,560	1,044,000		48,000	60,000	4,471,660
สทบ.4 (ขอนแก่น)	16	257,600	1,600,000				134,400		10,400		427,140	696,000		32,000	40,000	3,197,540
สทบ.5 (นครราชสีมา)	244	3,928,400	24,400,000				2,049,600		158,600		6,997,760	10,614,000		488,000	610,000	49,246,360
สทบ.6 (ตรัง)	90	1,449,000	9,000,000				756,000		58,500		1,939,850	3,915,000		180,000	225,000	17,523,350
สทบ.7 (กำแพงเพชร)	9	144,900	900,000				75,600		5,850		157,085	391,500		18,000	22,500	1,715,435
สทบ.8 (ราชบุรี)	5	68,300	500,000				42,000		3,250		49,975	217,500		10,000	12,500	903,525
สทบ.9 (ระยอง)	71	1,143,100	7,100,000				596,400		46,150		1,433,215	3,088,500		142,000	177,500	13,726,865
สทบ.10 (อุดรธานี)	24	386,400	2,400,000				201,600		15,600		660,460	1,044,000		48,000	60,000	4,816,060
สทบ.11 (อุบลราชธานี)	217	3,493,700	21,700,000				1,822,800		141,050		6,020,705	9,439,500		434,000	542,500	43,594,255
สทบ.12 (สงขลา)	58	933,800	5,800,000				487,200		37,700		1,525,670	2,523,000		116,000	145,000	11,568,370
รวมเขต	892	14,037,900	89,200,000				7,492,800	-	579,800	-	21,460,830	38,802,000	-	1,784,000	2,230,000	175,507,330
ควน.								1,204,200								1,204,200
สทบ.				37,797,500	37,222,570	50,398,000				410,320,000			178,400	892,000		536,808,470
ส่วนกลาง																-
รวม	892	14,037,900	89,200,000	37,797,500	37,222,570	50,398,000	7,492,800	1,204,200	579,800	410,320,000	21,460,830	38,802,000	178,400	2,676,000	2,230,000	713,600,000

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเนื้อเสี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานขนถาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดลัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/ธนการประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการครวจติดตาม, ประเมินและของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

6.ปรับลดค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล จากวงเงิน 499,520,000 บาท เป็นวงเงิน 410,320,000 บาท คงเหลือเงิน 89,200,000 บาท โดยให้ลงพท.เขต 1-12 ดำเนินการงานขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลออก

ลดเป็นค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล จำนวน 38,802,000 บาท และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 50,398,000 บาท

7.กิจกรรมค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา

7.1 งานขุดฝัง ความกว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ราคาต่อหน่วย 15 บาท/ม.

7.2 ค่าวางท่อระบบประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ราคาต่อหน่วย 25 บาท/ม.

7.3 งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ค่าติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ8.5 ราคาต่อหน่วย 20 บาท/ม.

7.4 งานวางท่อลอดถนน ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 170 บาท/ม.

8.ค่าดำเนินการทางพัสดุ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ

17.3 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 โดยขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานจากเดือนธันวาคม 2558 เป็นเดือนมิถุนายน 2559 เนื่องจากยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงต้องเริ่มกระบวนการจัดจ้างใหม่ ซึ่งต้องดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรี (วงเงินเกิน 100 ล้านบาท) รวมทั้งมีรายการท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์เพื่อระบบประปาบาดาลที่ได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมและยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางพัสดุ เป็นผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในกรอบเวลาเดิม

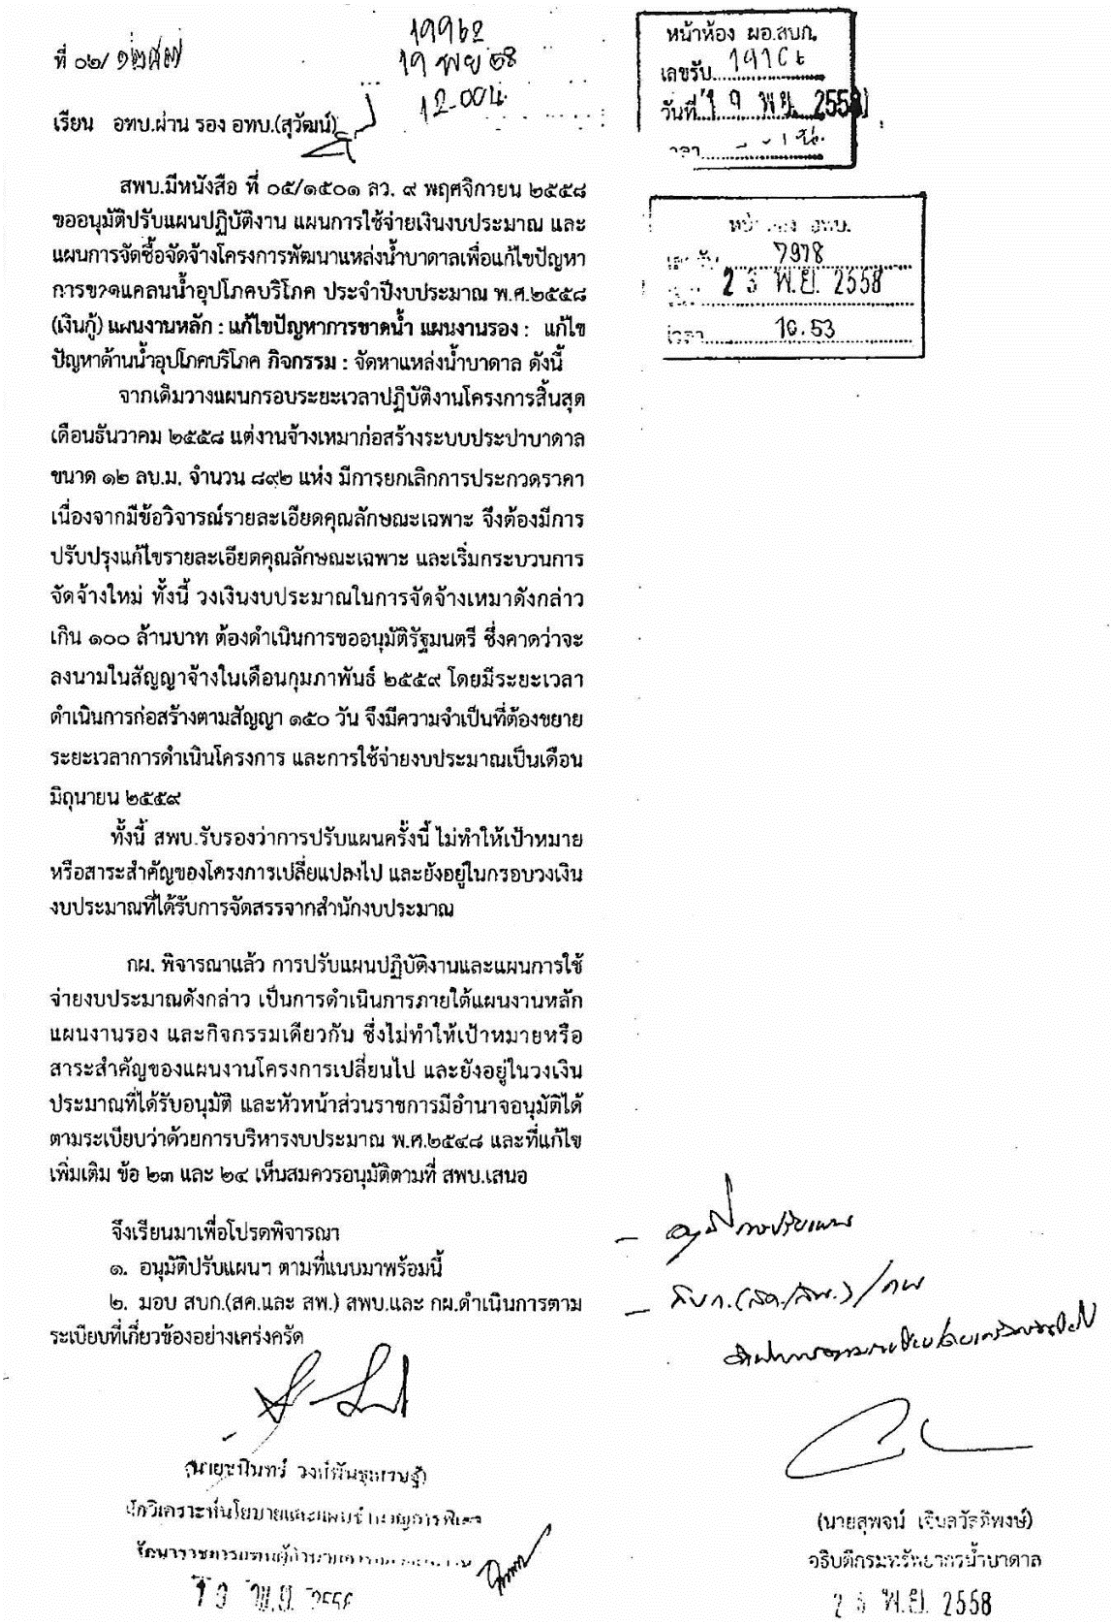

ที่ ๐๒/ ๑๒๘๘๗ 19962 19 พฤ 58 12-0014

เรียน อทบ.ผ่าน รอง อทบ.(สุวัฒน์)

สพบ.มีหนังสือ ที่ ๐๕/๑๕๐๑ ลว. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เงินกู้) แผนงานหลัก : แก้ไขปัญหาการขาดน้ำ แผนงานรอง : แก้ไขปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภค กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล ดังนี้

จากเดิมวางแผนกรอบระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ แต่งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๘๙๒ แห่ง มีการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีข้อวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเริ่มกระบวนการจัดจ้างใหม่ ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเหมาดังกล่าว เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ๑๕๐ วัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ สพบ.รับรองว่าการปรับแผนครั้งนี้ ไม่ทำให้เป้าหมายหรือสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป และยังอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

กผ. พิจารณาแล้ว การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานหลัก แผนงานรอง และกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งไม่ทำให้เป้าหมายหรือสาระสำคัญของแผนงานโครงการเปลี่ยนไป และยังอยู่ในวงเงินประมาณที่ได้รับอนุมัติ และหัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจอนุมัติได้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ และ ๒๔ เห็นสมควรอนุมัติตามที่ สพบ.เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติปรับแผนฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

๒. มอบ สบก.(สค.และ สพ.) สพบ.และ กผ.ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(นายสุพจน์ เชิบลวัรพิพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
23 พ.ย. 2558

หน้าห้อง ผอ.สบก.
เลขรับ 19906
วันที่ 19 พ.ย. 2558
เวลา ... น.

หน้าห้อง อทบ.
เลขรับ 7978
วันที่ 23 พ.ย. 2558
เวลา 10.53

3. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) ตามคำสั่งที่ 348/2558 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 ได้ดำเนินการประมาณราคากลางเป็นรายจังหวัด ส่งผลให้ใช้เวลาในการดำเนินงานนานกว่าแผนที่วางแผนไว้ รวมทั้งมีรายการท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์เพื่อระบบประปาบาดาล และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมจากการปรับแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการทางพัสดุ เป็นผลให้การดำเนินงานโครงการจะแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบเวลา นอกจากนี้วงเงินงบประมาณที่มากกว่า 100 ล้านบาท เกินอำนาจอธิบดี จึงต้องดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรี เป็นเหตุที่ส่งผลให้โครงการล่าช้าเช่นกัน

สพบ. มีความประสงค์ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 รายละเอียดดังนี้

1. แผนปฏิบัติงาน โดยขยายระยะเวลาปฏิบัติงานจากเดิมเดือนธันวาคม ปี 2558 เป็นเดือนกรกฎาคม ปี 2559 (เอกสารแนบ 1)
2. แผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 2)
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 3)

<u>ข้อพิจารณา</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
2. มอบหมาย กผ./ สพบ./ สค. สบก. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การปรับแผนดังกล่าว ไม่ทำให้เป้าหมายหรือสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป และยังอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(นายสมชัย ทองบางพึ่ง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

นายชาโนมาร์ วงศ์พันธุเศรษฐี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
19 ม.ค. 2558

สิ่งที่ 3

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	ลักษณะงาน (/) งานที่เสร็จภายในปี 2558	วิธีการ (/) จัดซื้อ	วิธีการ (/) จัดจ้าง	วิธีการ (/) สอบราคา	วิธีการ (/) ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) ไม่มี	แผนปฏิบัติการ ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	แผนการจ่ายเงิน งบนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
1)		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม) จำนวน 892 แห่ง																
		1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 และ 2.0 แรงม้า	892	ชุด		/				/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	37,797,500.00		
		รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า	703	ชุด												28,612,100.00		@ 40,700 บาท
		รายการที่ 2 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2.0 แรงม้า	189	ชุด												9,185,400.00		@ 48,600 บาท
		2) ท่อและอุปกรณ์														37,222,570.00		
		รายการที่ 1 ท่อกรุพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาดระบุ 150 มม.	15,031	ท่อน		/				/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	30,813,550.00		@ 2,050 บาท
		รายการที่ 2 ท่อเซาะร่องพีวีซีแข็ง แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาขนาดระบุ 150 มม.	2,676	ท่อน		/				/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	5,726,640.00		@ 2,140 บาท
		รายการที่ 3 ฝาครอบท่อรับทรายพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.	892	อัน		/				/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	392,480.00		@ 440 บาท
		รายการที่ 4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	892	กระป๋อง		/				/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	289,900.00		@ 325 บาท
		3) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	892	ระบบ	/					/	/		พ.ย.-59	ก.พ.-59	มิ.ย.-59	410,320,000.00		@ 460,000 บาท
		4) ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์														50,398,000.00		
		4.1) ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์เพื่อระบบประปาบาดาล																
		รายการที่ 1 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 2 นิ้ว	223,000	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	41,255,000.00		@ 185 บาท/ท่อน
		รายการที่ 2 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว	5,352	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	224,784.00		@ 42 บาท/ท่อน
		รายการที่ 3 ข้อต่อสามทางลดพีวีซี ขนาด 2x1/2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,917,800.00		@ 43 บาท/อัน
		รายการที่ 4 ข้องอพีวีซี 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,159,600.00		@ 26 บาท/อัน
		รายการที่ 5 ฝาครอบพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	178,400.00		@ 4 บาท/อัน
		รายการที่ 6 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	5,352	กระป๋อง	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,739,400.00		@ 325 บาท/กระป๋อง
		4.2) ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	1,784	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	3,923,016.00		@ 2199 บาท/ท่อน

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาวดี พานทอง)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสมชัย ทองบางพึ่ง)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ครั้งที่ 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ												รวมทั้งสิ้น
					ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59		
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง		1,962,900	4,025,000	4,025,000	4,025,000								14,037,900
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ		25,000,000	25,000,000	25,000,000	14,200,000								89,200,000
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด				37,797,500									37,797,500
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ				37,222,570									37,222,570
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง				50,398,000									50,398,000
6	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ			2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,192,800.00							7,492,800
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง			337,500	337,500	337,500	191,700.00							1,204,200
8	ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง			162,500	162,500	162,500	92,300.00							579,800
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	410,320,000	892	แห่ง									206,540,000		203,780,000		410,320,000
10	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง				3,415,830	4,717,000	6,664,000	6,664,000						21,460,830
11	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	38,802,000	892	แห่ง					7,760,400	7,760,400	7,760,400	7,760,400	7,760,400				38,802,000
12	ดำเนินการทางพัสดุ	178,400		บาท		76,000	102,400										178,400
13	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	2,676,000		บาท		267,600	267,600	267,600	267,600	267,600	267,600	267,600	267,600	267,600	267,600		2,676,000
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,230,000	892	แห่ง				280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	270,000		2,230,000
	รวม	713,600,000		บาท		27,306,500	31,995,000	161,006,500	33,850,000	16,448,800	14,972,000	8,308,000	214,848,000	547,600	204,317,600		713,600,000

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

6.ปรับลดค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล จากวงเงิน 499,520,000 บาท เป็นวงเงิน 410,320,000 บาท คงเหลือเงิน 89,200,000 บาท โดยให้สทบ.เขต 1-12 ดำเนินการงานขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเอง คิดเป็นค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล จำนวน 38,802,000 บาท และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 50,398,000 บาท

7.กิจกรรมค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา

7.1 งานขุดฝัง ความกว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ราคาต่อหน่วย 15 บาท/ม.

7.2 ค่าวางท่อระบบประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ราคาต่อหน่วย 25 บาท/ม.

7.3 งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ค่าติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ8.5 ราคาต่อหน่วย 20 บาท/ม.

7.4 งานวางท่อลอดถนน ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 170 บาท/ม.

8.ค่าดำเนินการทางพัสดุ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ

คำชี้แจงที่ 3

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ													
					มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง				142	250	250	250							
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ					250	250	250	142						
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด						892								
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ						892								
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง						892								
6	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ					250	250	250	142						
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง					250	250	250	142						
8	ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง					250	250	250	142						
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	410,320,000	892	แห่ง											449		443	
10	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง														
11	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	38,802,000	892	แห่ง														
12	ดำเนินการทางพัสดุ	178,400		บาท														
13	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	2,676,000		บาท														
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,230,000	892	แห่ง														
	รวม	713,600,000		บาท														

หมายเหตุ :

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ

6.ปรับลดค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล จากวงเงิน 499,520,000 บาท เป็นวงเงิน 410,320,000 บาท คงเหลือเงิน 89,200,000 บาท โดยให้สทบ.เขต 1-12 ดำเนินการงานขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเอง คิดเป็นค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล จำนวน 38,802,000 บาท และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 50,398,000 บาท

7.กิจกรรมค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา

7.1 งานขุดฝัง ความกว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ราคาต่อหน่วย 15 บาท/ม.

7.2 ค่าวางท่อระบบประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ราคาต่อหน่วย 25 บาท/ม.

7.3 งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ค่าติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ8.5 ราคาต่อหน่วย 20 บาท/ม.

7.4 งานวางท่อลอดถนน ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 170 บาท/ม.

8.ค่าดำเนินการทางพัสดุ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ



17.4 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4 โดยขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานจากเดือนมิถุนายน 2559 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่ สาเหตุจากไม่มีผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในพื้นที่ สทบ. เขต 12

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2793 1047 โทรสาร 0 2793 1037

ที่ 05/744 **วันที่** 23 มิ.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ. ผ่าน ผอ. กผ.

เรื่องเดิม

1. อทบ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการเงินกู้สำหรับแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 892 แห่ง วงเงินงบประมาณ 713,600,000 บาท ตามหนังสือ สพบ.ที่ 05/318 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

2. อทบ. ได้อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ สพบ.ที่ 05/588 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

3. อทบ. ได้อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ กผ.ด่วนที่สุด ที่ 02/885 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ข้อเท็จจริง

1. อทบ. ได้อนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 892 แห่ง รวม 12 เขต (โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน แผนงาน/ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาที่ผ่านการพิจารณา รวม 11 เขต เป็นเงินทั้งสิ้น 358,987,107.00 บาท (สามร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน) และอยู่ระหว่างรออนุมัติจาก รมว.ทส. เนื่องจากวงเงินงบประมาณมากกว่า 100 ล้านบาท ตามหนังสือ ทบ.ที่ ทส 0701/404 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และมีปัญหาล่าช้าจากการเสนอความเห็นเพื่อตอบข้อสงสัยรองปกท.ทส. (วรศาสน์ อภัยพงษ์) เรื่องการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 หรือไม่ และกรณีการพิจารณาผลผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 892 แห่ง รวม 12 เขต ซึ่ง ทบ. ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ทส. 0701/947 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559

ทบ. ได้ชี้แจงขั้นตอนการประกาศประกวดราคาเพิ่มเติม ตามหนังสือ ทส.0701/1440 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เนื่องจาก สบก.ทส. ได้ตรวจสอบเอกสารจาก ทบ. และพบว่า อทบ. เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 แต่ ทบ.ประกาศราคากลางทางเว็บไซต์ของ ทบ. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และ

ประกาศราคากลางทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดย ทบ.ชี้แจงว่า ได้ประกาศร่าง TOR พร้อมประกาศราคากลางลงเว็บไซต์ของ ทบ. ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และตรวจสอบพบว่ามีการระบุวันที่คลาดเคลื่อนเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ศทส. จึงได้ทำการปรับปรุงวันที่ในร่างประกาศ TOR เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 แต่ไม่ได้ทำการแก้ไขวันที่ในการประกาศราคากลาง ซึ่งตามข้อเท็จจริงวันที่ในการประกาศร่าง TOR และประกาศราคากลาง คือ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ต่อมา ปกท.ทส. มอบหมายให้ ทบ. มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ทส 0201.8/1975 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้รับรองขั้นตอนการทำงาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และข้อมูล log file ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโครงการฯ ว่าได้ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลาง, ประกาศเชิญชวน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ทบ. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และกรมบัญชีกลางมีหนังสือถึง ทบ. ตามหนังสือ กค 0421.4/21554 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 โดยกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสรุปว่า ทบ. ได้ดำเนินการจัดจ้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่ง ทบ. ได้ทำหนังสือชี้แจงถึง ปกท.ทส. แล้ว รายละเอียดตามหนังสือ ทส 0701/2191 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอ รมว.ทส. อนุมัติจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ซึ่ง สพบ. คาดการณ์ว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2559

2. สำหรับรายการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 ซึ่งไม่มีผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำเป็นต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง

3. การดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จไม่ทันตามกรอบเวลาเดิมในเดือนมีนาคม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการหลายแห่ง จึงจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สพบ. จึงมีความประสงค์ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้

1) แผนปฏิบัติงาน ขยายระยะเวลาจากเดิม เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 (เอกสารแนบ 1)
2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 2)
3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 3)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

2. มอบหมาย กผ./ สพบ./ สบก.(สพ., สค.)/ สทบ.1-12 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การปรับแผนดังกล่าว ไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป และยังอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงานเดิม							แผนปฏิบัติงานใหม่																				รวม
					ปีงบประมาณ พ.ศ.2558			ปีงบประมาณ พ.ศ.2559				พ.ศ.2558	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559													ปีงบประมาณ พ.ศ.2560					
					ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58	พ.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58		ก.ย. 58	พ.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง	142	250	250	250				100	100	50	50	100	100	100	100	42	75	75									
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ	142	250	250	250				262	20	20	70	20	80	50	80	80	80	130									
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด		892								892																	
4	วัสดุห่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ		892							892																		
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง														892													
6	สูบทดสอบปริมาณน้ำ (Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ	142	250	250	250					132	100	100	100	100	100	100	70	70	20									
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง	142	250	250	250					150	150	150	150	150	100	42												
8	ป้ายปักบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง	142	250	250	250					250	250	250	142															
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	410,320,000	892	แห่ง				491		401																					
10	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง		142	250	250	250																		420		472		
11	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	38,802,000	892	แห่ง																											
12	ดำเนินการทางพัสดุ	178,400		บาท																											
13	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง	2,676,000		บาท																											
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,230,000	892	แห่ง																											
	รวม	713,600,000		บาท	18,264,100	110,952,900	313,492,000.0	38,532,000	231,467,000	892,000	713,600,000	28,891,900	46,383,100	7,033,100	43,160,900	22,696,600	12,549,800	7,234,600	20,935,800	8,285,600	5,589,400	16,666,800	8,574,200	8,574,200	8,574,200	201,774,200	8,574,200	225,701,000	32,400,400	713,600,000

หมายเหตุ : ปรับแผน ครั้งที่ 4

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในกรอบโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานขนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนซีเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและอัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ, ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง

6.ปรับลดค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล จากวงเงิน 499,520,000 บาท เป็นวงเงิน 410,320,000 บาท คงเหลือเงิน 89,200,000 บาท โดยให้สทบ.เขต 1-12 ดำเนินการขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเอง

ติดเป็นค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล จำนวน 38,802,000 บาท และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 50,398,000 บาท

7.กิจกรรมค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา

7.1 งานขุดฝัง ความกว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ราคาต่อหน่วย 15 บาท/ม.

7.2 ค่าวางท่อระบบประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ราคาต่อหน่วย 25 บาท/ม.

7.3 งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ค่าติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ8.5 ราคาต่อหน่วย 20 บาท/ม.

7.4 งานวางท่อลอดถนน ท่อเหล็กเกลียวตลอดสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 170 บาท/ม.

8.ค่าดำเนินการทางพัสดุ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	ลักษณะงาน (/) งานที่เสร็จภายในปี 2558	วิธีการ (/) จัดซื้อ	วิธีการ (/) จัดจ้าง	วิธีการ (/) สอบราคา	วิธีการ (/) ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) ไม่มี	แผนปฏิบัติการ ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (บาท)	แผนการจ่ายเงิน งบนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
1)	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม) จำนวน 892 แห่ง																	
		1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 และ 2.0 แรงม้า	892	ชุด	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	37,797,500.00		
		รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า	703	ชุด												28,612,100.00		@ 40,700 บาท
		รายการที่ 2 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2.0 แรงม้า	189	ชุด												9,185,400.00		@ 48,600 บาท
		2) ท่อและอุปกรณ์														37,222,570.00		
		รายการที่ 1 ท่อกรุพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาดระบุ 150 มม.	15,031	ท่อน	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	30,813,550.00		@ 2,050 บาท
		รายการที่ 2 ท่อเซาะร่องพีวีซีแข็ง แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาขนาดระบุ 150 มม.	2,676	ท่อน	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	5,726,640.00		@ 2,140 บาท
		รายการที่ 3 ฝาครอบท่อรับทรายพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.	892	อัน	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	392,480.00		@ 440 บาท
		รายการที่ 4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	892	กระป๋อง	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	289,900.00		@ 325 บาท
		3) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	892	ระบบ	/					/	/		ต.ค.-58	ส.ค.-59	ม.ค.-60	410,320,000.00		@ 460,000 บาท
		4) ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์														50,398,000.00		
		4.1) ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์เพื่อระบบประปาบาดาล																
		รายการที่ 1 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 2 นิ้ว	223,000	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	41,255,000.00		@ 185 บาท/ท่อน
		รายการที่ 2 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว	5,352	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	224,784.00		@ 42 บาท/ท่อน
		รายการที่ 3 ข้อต่อสามทางลดพีวีซี ขนาด 2x1/2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,917,800.00		@ 43 บาท/อัน
		รายการที่ 4 ข้องอพีวีซี 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,159,600.00		@ 26 บาท/อัน
		รายการที่ 5 ฝาครอบพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	178,400.00		@ 4 บาท/อัน
		รายการที่ 6 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	5,352	กระป๋อง	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,739,400.00		@ 325 บาท/กระป๋อง
		4.2) ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	1,784	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	3,923,016.00		@ 2199 บาท/ท่อน

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาวดี พานทอง)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559												ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					รวมทั้งสิ้น
					ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง	2,416,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	805,000	805,000	805,000	1,610,000	461,900	750,000	1,555,000								14,037,900
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ	26,299,900	4,200,000	4,500,000	8,000,000	2,000,000	6,000,000	1,400,000	17,700,000	6,500,000	2,000,000	6,000,000							4,600,100	89,200,000
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด		9,144,840		28,534,770														117,890	37,797,500
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ		30,522,770																6,699,800	37,222,570
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง				3,045,120	18,738,600	4,573,750	3,557,300											20,483,230	50,398,000
6	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ		840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	537,600	537,600	537,600								7,492,800
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง				1,074,820			116,630											12,750	1,204,200
8	ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง					195,000	195,000	189,800												579,800
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	410,320,000	892	แห่ง															193,200,000		217,120,000		410,320,000
10	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง							100,000	150,000	150,000	1,640,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,776,830		21,460,830
11	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	38,802,000	892	แห่ง							100,000	500,000	500,000	500,000	5,314,000	5,314,000	5,314,000	5,314,000	5,314,000	5,314,000	5,318,000		38,802,000
12	ดำเนินการทางพัสดุ	178,400		บาท	76,000				20,000	20,000	20,000	20,000.00	22,400.00										178,400
13	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง	2,676,000		บาท	100,000	65,490	83,100	56,190	48,000	66,050	55,870	65,800	63,700	61,800	251,200	251,200	251,200	251,200	251,200	251,200	251,170	251,630	2,676,000
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,230,000	892	แห่ง					50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	2,230,000
	รวม	713,600,000		บาท	28,891,900	46,383,100	7,033,100	43,160,900	22,696,600	12,549,800	7,234,600	20,935,800	8,285,600	5,589,400	16,666,800	8,574,200	8,574,200	8,574,200	201,774,200	8,574,200	225,701,000	32,400,400	713,600,000

หมายเหตุ : ปรับแผนครั้งที่ 4

1.ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในรหัสโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนผง กรวดคัด ปูนพิเมนต์ หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินเหลือจ่ายของ ทบ. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลของแผนงาน/โครงการ, ประชุมโครงการ, ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง

6.ปรับลดค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล จากวงเงิน 499,520,000 บาท เป็นวงเงิน 410,320,000 บาท คงเหลือเงิน 89,200,000 บาท โดยให้สทบ.เขต 1-12 ดำเนินการงานขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเอง คิดเป็นค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล จำนวน 38,802,000 บาท และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 50,398,000 บาท

7.กิจกรรมค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปา

7.1 งานขุดฝัง ความกว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ราคาต่อหน่วย 15 บาท/ม.

7.2 ค่าวางท่อระบบประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ราคาต่อหน่วย 25 บาท/ม.

7.3 งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ค่าติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ8.5 ราคาต่อหน่วย 20 บาท/ม.

7.4 งานวางท่อลอดถนน ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 170 บาท/ม.

8.ค่าดำเนินการทางพัสดุ ให้เบิกเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ

แผนจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 892 แห่ง

ลำดับ	ขั้นตอน	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60
1	ขออนุมัติจ้างเหมา									
2	ลงนามในสัญญา									
3	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล									
4	ตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่าย									
5	จัดทำรายงาน									
กรณี ดำเนินการจัดจ้างใหม่สำหรับ สทบ. เขต 12										
1	ขออนุมัติ TOR และประมาณราคา (BOQ) ใหม่									
2	ประกาศร่าง TOR และราคากลาง									
3	รอวิจารณ์ร่าง TOR และราคากลาง, ตอบข้อวิจารณ์									
4	ขายแบบ									
5	ยื่นเอกสารประกวดราคา									
6	พิจารณาผลการประกวดราคา									
7	ขออนุมัติจ้างเหมา									
8	ลงนามในสัญญา									
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล									
10	ตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่าย									
11	จัดทำรายงาน									

17.5 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน เนื่องจากพื้นที่บางแห่งไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ สาเหตุจากไม่มีศักยภาพน้ำ, ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานอื่นแล้ว และมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง และพื้นที่บางแห่งหมดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการ จำนวน 91 แห่ง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการขอความความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอต่อสำนักงบประมาณ และสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำก่อนเสนอต่อสำนักงบประมาณ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร.๐ ๒๗๙๓ ๑๐๔๔ โทรสาร ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๓๗

ที่ ๐๕/๔๓๖ **วันที่** ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน อทบ. ผ่าน รอง อทบ. สุวัฒน์ ผ่าน ผอ.กผ.

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๘๙๒ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ ทบ. ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๑.๑ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๔ กรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์ที่จะชะลอ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๑.๒ หมวด ๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

ข้อ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๒. จากการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๙๒ แห่ง ลักษณะการดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาบาดาล เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการหมู่บ้านที่ไม่มีประปา พบปัญหาอุปสรรคต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ หรือยกเลิกดำเนินโครงการ รวมถึงแก้ไขรายชื่อสถานที่ในกรณีการพิมพ์ข้อความคลาดเคลื่อน ตกหล่นไปจากที่ได้รับอนุมัติ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๒.๑ ปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการในสถานที่แห่งเดิมได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล พื้นที่/กลุ่มผู้ใช้น้ำยังไม่พร้อมในการบริหารจัดการโครงการ พื้นที่เดิมได้ดำเนินการโดยใช้เงินจากแหล่งอื่น หรือหน่วยงานอื่นดำเนินการให้แล้ว มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๔๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒ พื้นที่เดิมหมดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่เดิมมีประปาและน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอแล้ว พื้นที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล พื้นที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาความสงบในพื้นที่ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๙๔ รายการ ทั้งนี้ ยุติการดำเนินงาน และคืนงบประมาณในกิจกรรมที่เหลือ ที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ชัดเจน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๓ เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่มีประปาหรือหมู่บ้านที่มีการขยายตัวของชุมชน ระบบประปาเดิมรองรับได้ไม่ทั่วถึง ยังคงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ตามข้อเท็จจริงที่ ๑ เห็นควรพิจารณาดำเนินการนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนสถานที่ และยกเลิกสถานที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ตามข้อเท็จจริงที่ ๒ (๒.๑) และ (๒.๒)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. ลงนามในหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. มอบหมายให้ สพบ.ประสานคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเสนอความเห็นเพื่อแก้ไขสัญญาจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

๓. มอบหมายให้ กผ./สพบ./สบก.(สค./สพ.)/ศทส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร.๐ ๒๗๔๓ ๑๐๔๔ โทรสาร ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๓๗

ที่ ๐๕/๔๐๓ **วันที่** ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแก้ไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน ผอ.กผ.

ตามหนังสือ สพบ. ที่ ๐๕/๘๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ซึ่ง สพบ. ได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๙๔ รายการ นั้น เนื่องจากมีการขอแก้ไขข้อมูลการยกเลิกโครงการฯ จาก สทบ. เขต ๑ ลำปาง จากเดิมขอยกเลิก รวม ๒๔ รายการ แก้ไขเป็น ๒๑ รายการ ทำให้รายการยกเลิกโครงการเปลี่ยนแปลงจาก ๙๔ รายการ เป็น ๙๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สพบ. จึงขอส่งรายละเอียดประกอบการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

รายละเอียดประกอบการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ 2

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

กรณียกเลิกโครงการ

รายการเดิม					รายการใหม่			
ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	จำนวน(แห่ง)	จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	จำนวน(แห่ง)	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	09007C1001410012	บ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	1	800,000				ซ้ำซ้อน
2	09007C1001410013	บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	1	800,000				ซ้ำซ้อน
3	09007C1001410025	บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1	800,000				ซ้ำซ้อน
4	09007C1001410026	บ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1	800,000				ซ้ำซ้อน
5	09007C1001410037	บ้านห้วยข้มใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
6	09007C1001410040	บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
7	09007C1001410045	บ้านห้วยไจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
8	09007C1001410056	บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
9	09007C1001410065	บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
10	09007C1001410073	บ้านปากนาย หมู่ที่ 17 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
11	09007C1001410078	บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
12	09007C1001410079	บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
13	09007C1001410080	บ้านห้วนสาวแลว หมู่ที่ 8 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	1	800,000				ซ้ำซ้อน
14	09007C1001410081	บ้านสกาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน	1	800,000				ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ
15	09007C1001410082	บ้านสกาดเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน	1	800,000				ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ
16	09007C1001410083	บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
17	09007C1001410086	บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
18	09007C1001410109	บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
19	09007C1001410110	บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
20	09007C1001410118	บ้านแม่วะศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
21	09007C1001410124	บ้านปู หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
22	09007C1001410135	บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
23	09007C1001410138	บ้านเกาะแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
24	09007C1001410180	บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
25	09007C1001410232	บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
26	09007C1001410263	บ้านยางน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเมือ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
27	09007C1001410265	บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
28	09007C1001410266	บ้านเหล่าม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน

รายการเดิม					รายการใหม่			
ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	จำนวน(แห่ง)	จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	จำนวน(แห่ง)	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
29	09007C1001410267	บ้านนางเกา หมู่ที่ 10 ตำบลตอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
30	09007C1001410268	บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลตอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
31	09007C1001410269	บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลตอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
32	09007C1001410272	บ้านกะเตียว หมู่ที่ 6 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
33	09007C1001410283	บ้านตาสอน หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
34	09007C1001410286	บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลนะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
35	09007C1001410291	บ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
36	09007C1001410302	บ้านกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
37	09007C1001410304	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
38	09007C1001410307	บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ
39	09007C1001410315	บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองยะ อำเภอลำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
40	09007C1001410321	บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
41	09007C1001410323	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ
42	09007C1001410325	บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
43	09007C1001410330	บ้านเตาแดก หมู่ที่ 6 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
44	09007C1001410339	บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
45	09007C1001410342	บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
46	09007C1001410365	บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
47	09007C1001410366	บ้านบวรรัตน์ หมู่ที่ 11 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
48	09007C1001410379	บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	1	800,000				ซ้ำซ้อน
49	09007C1001410417	บ้านพงสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
50	09007C1001410455	บ้านสวนจีน หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
51	09007C1001410462	บ้านวังไทร หมู่ที่ 7 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
52	09007C1001410511	บ้านหนองจิกกรี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	1	800,000				ซ้ำซ้อน
53	09007C1001410520	บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
54	09007C1001410522	บ้านคลองเสาธง หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	1	800,000				ซ้ำซ้อน
55	09007C1001410610	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	1	800,000				ซ้ำซ้อน
56	09007C1001410611	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	1	800,000				ซ้ำซ้อน
57	09007C1001410834	บ้านหนองหินใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
58	09007C1001410835	บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
59	09007C1001410836	บ้านสาวอ หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
60	09007C1001410837	บ้านเจ๊ะยอ หมู่ที่ 3 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
61	09007C1001410838	บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายการเดิม					รายการใหม่			
ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	จำนวน(แห่ง)	จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	จำนวน(แห่ง)	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
62	09007C1001410839	บ้านตำเสา หมู่ที่ 6 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
63	09007C1001410840	บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 5 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
64	09007C1001410841	บ้านกะดูนง หมู่ที่ 2 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
65	09007C1001410842	บ้านบางขุด หมู่ที่ 1 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
66	09007C1001410843	บ้านจะมาแก๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
67	09007C1001410844	บ้านกีแยมัส หมู่ที่ 4 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
68	09007C1001410845	บ้านบูเกะ หมู่ที่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
69	09007C1001410846	บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
70	09007C1001410847	บ้านโคกมือบา หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
71	09007C1001410848	บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
72	09007C1001410849	บ้านสะหริง หมู่ที่ 1 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
73	09007C1001410850	บ้านบูเกะกือจิ หมู่ที่ 12 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
74	09007C1001410851	บ้านบูเกะตาโมง หมู่ที่ 7 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
75	09007C1001410857	บ้านบาตง หมู่ที่ 3 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ซ้ำซ้อน
76	09007C1001410859	บ้านแกแมเก้า หมู่ที่ 9 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
77	09007C1001410860	บ้านบูเก๊ะมูนิง หมู่ที่ 4 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
78	09007C1001410861	บ้านบลูกาฮีเลตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ซ้ำซ้อน
79	09007C1001410862	บ้านบลูกาฮีเล หมู่ที่ 6 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ซ้ำซ้อน
80	09007C1001410863	บ้านบาโงฮาแซ หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
81	09007C1001410864	บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
82	09007C1001410865	บ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
83	09007C1001410866	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ซ้ำซ้อน
84	09007C1001410867	บ้านอีนอ หมู่ที่ 3 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ซ้ำซ้อน
85	09007C1001410868	บ้านตะแม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ซ้ำซ้อน
86	09007C1001410869	บ้านบูเก๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	1	800,000				ซ้ำซ้อน
87	09007C1001410873	บ้านออก หมู่ที่ 3 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
88	09007C1001410874	บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
89	09007C1001410877	บ้านเกาะหม้อแกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	1	800,000				ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
90	09007C1001410891	บ้านหนองยูง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
91	09007C1001410892	บ้านทุ่งทะนาน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	1	800,000				ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดประกอบการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ

รายการเดิม					รายการใหม่			
ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	09007C1001410129	บ้านสอนจันทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	1	800,000	บ้านประจันตะคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
2	09007C1001410134	บ้านอ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	800,000	บ้านคลัง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	800,000	ไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง
3	09007C1001410157	บ้านห้วยคณฑา หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	1	800,000	บ้านโคกปรง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
4	09007C1001410165	บ้านหนองแสงใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	1	800,000	บ้านหนองแสงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
5	09007C1001410166	บ้านคำชมภู หมู่ที่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	800,000	บ้านหนองป่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
6	09007C1001410186	บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
7	09007C1001410196	บ้านโคกยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านดงยาง หมู่ที่ 10 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
8	09007C1001410216	บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
9	09007C1001410220	บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
10	09007C1001410224	บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 13 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
11	09007C1001410225	บ้านโคกจราบ หมู่ที่ 8 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านขนาดมอญใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
12	09007C1001410229	บ้านแยง หมู่ที่ 3 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
13	09007C1001410230	บ้านธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านโพนแคน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
14	09007C1001410235	บ้านเพชรจังวา หมู่ที่ 7 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
15	09007C1001410244	บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
16	09007C1001410262	บ้านประวิทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านอาฬึก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
17	09007C1001410264	บ้านพิงพวย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
18	09007C1001410274	บ้านสกอร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 10 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
19	09007C1001410279	บ้านอำปึล หมู่ที่ 6 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านหนองพิมานไต้ หมู่ที่ 8 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ซ้ำซ้อน
20	09007C1001410352	บ้านละเบิก หมู่ที่ 13 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	บ้านกลองตุง หมู่ที่ 11 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
21	09007C1001410374	บ้านถนน หมู่ที่ 11 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	1	800,000	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัม	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
22	09007C1001410381	บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	1	800,000	บ้านหนองเพิก หมู่ที่ 5 ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
23	09007C1001410398	บ้านฟากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	1	800,000	บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลลุมปุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
24	09007C1001410449	บ้านตลาดบ้านตูล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	800,000	บ้านยางด้วน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	800,000	ซ้ำซ้อน
25	09007C1001410473	บ้านท่าสูงบน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	800,000	บ้านควนโถะ หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	1	800,000	ซ้ำซ้อน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) รายงานผลบันทึกรับรอง

รายการเดิม					รายการใหม่			
ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเงิน (บาท)	รายการ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
26	09007C1001410517	บ้านหนองจิกเภา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	1	800,000	บ้านไดรังใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
27	09007C1001410566	บ้านรำพัน หมู่ที่ 5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	1	800,000	บ้านสะท้อน หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
28	09007C1001410615	บ้านบึงกาฬเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	1	800,000	บ้านเหล่าเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	1	800,000	ไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง
29	09007C1001410621	บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	1	800,000	บ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	1	800,000	ซ้ำซ้อน
30	09007C1001410639	บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	1	800,000	บ้านนาห่อม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	1	800,000	ซ้ำซ้อน
31	09007C1001410658	บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1	800,000	บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	1	800,000	ซ้ำซ้อน
32	09007C1001410662	บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	1	800,000	บ้านสะอาดสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	1	800,000	ซ้ำซ้อน
33	09007C1001410700	บ้านรุง หมู่ที่ 1 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านตาสุ หมู่ที่ 6 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
34	09007C1001410701	บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านชำแระกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
35	09007C1001410705	บ้านชำม่วง2 หมู่ที่ 6 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
36	09007C1001410706	บ้านกระมอล หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านราษีพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
37	09007C1001410707	บ้านตาชุน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านหนองผักไหม หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
38	09007C1001410720	บ้านสวงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
39	09007C1001410735	บ้านหนองอารี หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านขะยอม หมู่ที่ 9 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
40	09007C1001410736	บ้านลาวเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านน้อยผักหม หมู่ที่ 14 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
41	09007C1001410737	บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านตาตวด หมู่ที่ 16 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
42	09007C1001410764	บ้านหนองหาน หมู่ที่ 12 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านดอนชุมป่ายาง หมู่ที่ 20 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
43	09007C1001410767	บ้านไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านขุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน
44	09007C1001410778	บ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลตูม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
45	09007C1001410792	บ้านอีสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	บ้านหนองกระดัน หมู่ที่ 8 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1	800,000	ซ้ำซ้อน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

มติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กนช. เห็นชอบตามที่ ทบ. เสนอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้ ทบ.เปลี่ยนแปลงสถานที่ จำนวน 45 แห่ง และยกเลิกโครงการ จำนวน 91 แห่ง ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง แสดงในตารางที่ 3 และ รายละเอียดการยกเลิกโครงการ จำนวน 91 แห่ง แสดงในตารางที่ 4

รายงานการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

ผู้เข้าประชุม

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา — ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

๒. รองศาสตร์จารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร — รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
แทน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

๓. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข — รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
แทน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)

๔. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย — รองประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี

๕. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง — รองประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี

๖. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ — รองประธานกรรมการ
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
แทน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

๗. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา — กรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๘. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ — กรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ — กรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายปรเมธี วิมลศิริ — กรรมการ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา — กรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

/๑๒. นายสัญชัย...

๑๒. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน	กรรมการ
๑๓. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กรรมการ
๑๕. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๑๖. นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	กรรมการ
๑๗. นายตนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรรมการ
๑๘. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ	กรรมการ
๑๙. นายปราโมทย์ ไม้กลัด	กรรมการ
๒๐. นายกิจจา ผลภาษี	กรรมการ
๒๑. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ
๒๒. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการ

๑. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี
๒. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. นายธนวัตน์ จารุพงษ์สกุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายอำพน กิตติอำพน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พลเอก จิระศักดิ์ ชลประสพ	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
๒. พลเอก วิลาศ อรุณศรี	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓. พลเอก กฤษฎา อารีรัชตกุล	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๔. พลโท ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์	เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
๕. พลโท นักรบ บุญบัวทอง	รองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๖. พลตรี อนุชา ยันตรปกรณ์	รองเสนาธิการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๗. พลตรี วิทยา ขันธอุบล	รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร
๘. พลตรี วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู	รองเจ้ากรมการทหารช่าง

/๙. นายเสริมยศ...

๙. นายเสริมยศ สมมั่น	รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๑. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย	อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๑๒. นายชลธิศ สุรัสวดี	อธิบดีกรมป่าไม้
๑๓. นายธัญญา เนติธรรมกุล	อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๔. นายทองเปลว กองจันทร์	รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา
๑๕. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์	รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ
๑๖ นางอรัญญา เพียงสถิตย์	รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๗. นายวิวัฒน์ โสเจยยะ	รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
๑๘. นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์	หัวหน้าผู้ตรวจกรมทรัพยากรน้ำ
๑๙. นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์	ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
๒๐. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล	รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว
๒๑. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๒. พันเอก จินตมัย ชีกว้าง	ผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๒๓. พันเอก พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์	ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๒๔. นายอนันต์ แก้วกำเนิด	ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ สำนักงบประมาณ
๒๕. นายธนา สุวัฑฒน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
๒๖. นายชยันต์ เมืองสง	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
๒๗. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล	ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน
๒๘. นายประพิศ จันทร์มา	ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน
๒๙. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
๓๐. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ	ผู้อำนวยการสำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
๓๑. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
๓๒ นายจงคล้าย วรพงศ์ธร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
๓๓. นายสว่าง กองอินทร์	ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓๔. นายธนิตย์ หนูยิ้ม	ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓๕. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๖. นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

/๓๗. นางจรรยา...

ประชุม กนช. ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓๘. นางจรรยา ไตรรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
๓๙. นายมงคล หลักเมือง	ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
๔๐. นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข	ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
๔๑. นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส	ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
๔๒. นางสุนทรี มิ่งประยูร	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรน้ำ
๔๓. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร	ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
๔๔. นายคณพศ วรรณดี	รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ
๔๕. พันเอก ดวงทิพย์ ติณเวส	รองผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๔๖. นายสุทัศน์ วีสกุล	รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
๔๗. ดร.พงษ์จักรินทร์ ดาวรพงษ์	สำนักงานเลขานุการ กรุงเทพมหานคร
๔๘. นายณทศพล จันทร์ลอย	หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
๔๙. นายกิตติศักดิ์ บริบูรณ์เกษตร	ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕๐. นายวิโรจน์ ธีระแนว	ผู้อำนวยการส่วนพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๕๑. นายอนุชิต แตงอ่อน	ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์ สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๕๒. นายชลธร ชำนาญคิด	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สำนักอุทยาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๕๓. นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม	ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ กรมป่าไม้
๕๔. นายชุติเดช กมนณชนุตย์	ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
๕๕. นายสุรเจตน์ บุญญาอรุณเนตร	ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสนก.
๕๖. นายธัชชัย แสนเสนา	หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๕๗. นายเรือง จันทร์มหเสถียร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕๘. นายน้อง เจริญนาค	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ
๕๙. นายพิษณุ วรนารถ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

/๖๐. นายบุญชุบ...

ประชุม กนช. ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖๐. นายบุญชุบ ส่งตระกูลศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖๑. นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน
๖๒. นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว	หัวหน้าฝ่ายแผนงานที่ ๒ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กองแผนงาน กรมชลประทาน
๖๓. นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย	หัวหน้าฝ่ายแผนงานที่ ๔ ส่วนแผนงาน กองแผนงาน กรมชลประทาน
๖๔. นางสาวชลาลัย แจ่มผล	นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา
๖๕. นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๖๖. นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร	นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๖๗. นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน
๖๘. นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ	วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมชลประทาน
๖๙. นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงศ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ กรมชลประทาน
๗๐. นางกัลยา ศานติทรรศน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๗๑. นางสาวจรรย์งาม จาบกัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๗๒. พันเอก ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์	คณะทำงานนายกรัฐมนตรี
๗๓. พันเอกนิมิตต์ สุวรรณรัฐ	คณะทำงานนายกรัฐมนตรี
๗๔. นางสาวสิริกมล อุดมทร	คณะทำงานนายกรัฐมนตรี
๗๕. พันโทหญิงอรอนงค์ ห้วงประพันธ์	คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี
๗๖. พันตรีหญิงคณิชชา ธีระเดชพงศ์	คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการ กระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗๗. นายอมร อาชาเพ็ชร	ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗๘. นางสาววรนุช พงษ์ดี	ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี/กระทรวงมหาดไทย
๗๙. นายชัยพร ชุติศิลป์	ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘๐. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า การประชุมวันนี้ต้องการทราบความก้าวหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่าเกิดประโยชน์ในพื้นที่จริงมากน้อยเพียงใด เช่น ระบบประปาหมู่บ้านได้มีการจ่ายน้ำให้กับประชาชนแล้วรึยัง ระบบส่งน้ำได้มีการส่งน้ำไปยังพื้นที่แล้วรึยัง

/รวมถึง...

วาระที่ ๔.๖ ขอยกเลิกรายการ และเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงาน และขยายระยะเวลาดำเนินการการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ฝ่ายเลขานุการ กนช. นำเรียนที่ประชุมว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยนำข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗,๔๙๐ หมู่บ้าน แต่ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ คือ ๑) พื้นที่ตามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๒) พื้นที่ไม่มีศักยภาพและคุณภาพน้ำบาดาล ๓) ไม่มีผู้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นที่สาธารณะในการดำเนินโครงการ ๔) ปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๕) ปัญหาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง พื้นที่รับผิดชอบของ สทบ.เขต ๑๒ (พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (เงินกู้)) จำนวน ๘๙๒ แห่ง วงเงิน ๗๑๓.๖๐๐ ล้านบาท แผนงานหลัก : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แผนงานรอง : แก้ไขปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภค กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล โดยวางแผนกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการและการใช้จ่ายไว้ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการตามขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ แต่ประสบปัญหาในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานเดิมได้ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวไปจนสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่เดิมได้จำนวน ๙๑ แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน ๔๕ แห่ง ไปดำเนินการในพื้นที่ใหม่ทดแทน โดยการปรับเปลี่ยนสถานที่ยังคงอยู่ในจังหวัดเดียวกันภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล แต่การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๔ ข้อ ๑๑ และ ๑๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่ทำให้สาระสำคัญ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอ พร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก่อนเสนอต่อสำนักงบประมาณ

๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๘๓๖ แห่ง วงเงิน ๑,๔๖๘.๘๐๐ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ประสบปัญหาในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานเดิมได้ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการ จำนวน

/๕๐ แห่ง...

๕๐ แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน ๔๕๐ แห่ง ไปดำเนินการในพื้นที่ใหม่ทดแทน โดยการปรับเปลี่ยนสถานที่ยังคงอยู่ในจังหวัดเดียวกันและพื้นที่บางส่วนอยู่ในเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล เสนอสำนักงบประมาณแต่สำนักงบประมาณให้ความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หากจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกำหนด จะต้องเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาก่อน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ส่งมอบงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สามารถบริหารจัดการและสั่งการหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๘๙๒ แห่ง ในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวไปจนสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงาน ๔๕ แห่ง และยกเลิก ๙๑ แห่ง (งบเงินกู้) ตามข้อ ๑ และเห็นชอบปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงาน ๔๕๐ แห่ง และยกเลิก ๕๐ แห่ง (งบปกติ) ตามข้อ ๒

เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเสนอว่า โครงการที่หน่วยงานราชการไม่สามารถดำเนินการในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย จึงเสนอให้มีการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง จะสามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการเข้าไปดำเนินการได้

ประธานกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระบุพื้นที่เขตชลประทานให้ชัดเจนว่าอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง และพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง ซึ่งพื้นที่นอกเขตชลประทานจะต้องดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการผลิต และให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสนอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสั่งการของประธานไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๕.๑ ศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอประธานในที่ประชุม เรื่อง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อให้มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลรวมที่เป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพหลักรับไปดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ

/วาระที่ ๕.๒...

วาระที่ ๕.๒ ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๑. โครงการพระราชดำริที่เป็นโครงการขนาดกลาง ขอให้ปรับแผนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ หากยังไม่แล้วเสร็จก็ขยายระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ต่อไป

๒. การแก้ปัญหาเรื่องน้ำต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง (แหล่งเก็บกักน้ำ) กลางทาง (ระบบกระจายน้ำ) และปลายทาง (ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ) โดยแบ่งดำเนินการเป็น ๔ ระยะ ในระยะที่ ๑ ขอให้ดำเนินการ ๑+๔ (ปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๔ ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๗๕-๒๕๗๙ ต้องมีเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละระยะให้ชัดเจน พร้อมแผนงานและงบประมาณต้องการให้การบริหารจัดการน้ำแต่ละโครงการเป็นลักษณะแบบการบูรณาการและเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในครั้งต่อไป

๓. โครงการขนาดใหญ่ที่ติดปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ปรับเป็นโครงการย่อย ๆ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ ของรัฐบาลชุดนี้

๔. ขอให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

๕. ขอให้ทุกส่วนราชการคำนึงถึงความต้องการประชาชนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำว่าต้องมีระบบการกระจายน้ำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน มีน้ำชั่นคงในภาคการผลิต

๖. การบริหารจัดการน้ำควรอยู่ภายใต้กรอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของประธาน

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

(นางสาวฐิติชญาน์ ศิลปเสถียรกิจ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายคณพศ วรรณดี)
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านระบบจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุม กนช. ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตารางที่ 3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง

ลำดับที่	รายการเดิม	รายการใหม่	ความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง
1	บ้านสอนจันทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	บ้านประจันตะคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
2	บ้านอ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	บ้านคลัง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง
3	บ้านห้วยคณฑา หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	บ้านโคกปรง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
4	บ้านหนองแสงใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านหนองแสงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
5	บ้านคำชมภู หมู่ที่ 7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านหนองป่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
6	บ้านตาเมียง หมู่ที่ 12 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
7	บ้านโคกยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	บ้านดงยาง หมู่ที่ 10 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
8	บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
9	บ้านสวายตาพึง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	บ้านขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
10	บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 13 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	บ้านดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
11	บ้านโคกจราบ หมู่ที่ 8 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	บ้านขนาดมอญใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
12	บ้านแยง หมู่ที่ 3 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	บ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
13	บ้านธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	บ้านโพนแคน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
14	บ้านเพชรจังวา หมู่ที่ 7 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	บ้านบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
15	บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
16	บ้านประวิทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	บ้านอาทึก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
17	บ้านพิงพวย หมู่ที่ 4 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
18	บ้านสกอร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 10 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
19	บ้านอำปึล หมู่ที่ 6 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	บ้านหนองพิมานใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
20	บ้านละเบิก หมู่ที่ 13 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	บ้านกลองตุง หมู่ที่ 11 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
21	บ้านถนน หมู่ที่ 11 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
22	บ้านหนองนาโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านหนองเพิก หมู่ที่ 5 ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
23	บ้านฟากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล

ลำดับที่	รายการเดิม	รายการใหม่	ความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง
24	บ้านตลาดบ้านตูล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	บ้านยางด้วน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ซ้ำซ้อน
25	บ้านท่าสูงบน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	บ้านควนโถะ หมู่ที่ 10 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	ซ้ำซ้อน
26	บ้านหนองจิกเภา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	บ้านไดรังใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
27	บ้านรำพัน หมู่ที่ 5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	บ้านสะท้อน หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
28	บ้านบึงกาฬเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	บ้านเหล่าเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	ไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง
29	บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ซ้ำซ้อน
30	บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	บ้านนาห่อม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ซ้ำซ้อน
31	บ้านโนนสระพังยาง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ซ้ำซ้อน
32	บ้านป่าสุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	บ้านสะอาดสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ซ้ำซ้อน
33	บ้านรุง หมู่ที่ 1 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านตาสุ หมู่ที่ 6 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
34	บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านชำแระกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
35	บ้านชำม่วง2 หมู่ที่ 6 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
36	บ้านกระมอล หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านราษีพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
37	บ้านตาซุน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านหนองผักไหม หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
38	บ้านสวงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
39	บ้านหนองอารี หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านขะยอม หมู่ที่ 9 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
40	บ้านลาวเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านน้อยผักหม หมู่ที่ 14 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
41	บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านตาตวด หมู่ที่ 16 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
42	บ้านหนองหาน หมู่ที่ 12 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านดอนชุมป่ายาง หมู่ที่ 20 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
43	บ้านไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านขุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน
44	บ้านหนองแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
45	บ้านอีสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	บ้านหนองกระดัน หมู่ที่ 8 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน

ตารางที่ 4 รายละเอียดการยกเลิกโครงการ จำนวน 91 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ความจำเป็นในการขอยกเลิก
1	บ้านทุ่งเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	ซ้ำซ้อน
2	บ้านศรีป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	ซ้ำซ้อน
3	บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ตำบลแม้ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	ซ้ำซ้อน
4	บ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 5 ตำบลแม้ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	ซ้ำซ้อน
5	บ้านห้วยอ้มใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
6	บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
7	บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
8	บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
9	บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
10	บ้านป่ากนาย หมู่ที่ 17 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
11	บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
12	บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
13	บ้านห้วนสาวแลว หมู่ที่ 8 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	ซ้ำซ้อน
14	บ้านสกาดกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน	ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ
15	บ้านสกาดเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน	ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ
16	บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
17	บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
18	บ้านแม่เย็นนอก หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
19	บ้านแม่เย็นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
20	บ้านแม่วะศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
21	บ้านปู หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
22	บ้านคลองหนึ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
23	บ้านเกาะแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
24	บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
25	บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
26	บ้านยางน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
27	บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
28	บ้านเหล่าม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
29	บ้านนางเภา หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
30	บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
31	บ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
32	บ้านกะเตียว หมู่ที่ 6 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
33	บ้านตาสอน หมู่ที่ 11 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
34	บ้านยางเก่า หมู่ที่ 13 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
35	บ้านสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
36	บ้านกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
37	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
38	บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ
39	บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
40	บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
41	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ
42	บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
43	บ้านเตาแดก หมู่ที่ 6 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
44	บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
45	บ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
46	บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน

ลำดับที่	รายการ	ความจำเป็นในการขอยกเลิก
47	บ้านบวรรัตน์ หมู่ที่ 11 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	ซ้ำซ้อน
48	บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	ซ้ำซ้อน
49	บ้านพงสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
50	บ้านสวนจีน หมู่ที่ 9 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
51	บ้านวังไทร หมู่ที่ 7 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
52	บ้านหนองจิกกรี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	ซ้ำซ้อน
53	บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
54	บ้านคลองเสาธง หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	ซ้ำซ้อน
55	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	ซ้ำซ้อน
56	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	ซ้ำซ้อน
57	บ้านหนองหินใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
58	บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
59	บ้านสาวอ หมู่ที่ 8 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
60	บ้านเจ๊ะยอ หมู่ที่ 3 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
61	บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
62	บ้านตำเสา หมู่ที่ 6 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
63	บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 5 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
64	บ้านกะดูนง หมู่ที่ 2 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
65	บ้านบางขุด หมู่ที่ 1 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
66	บ้านจะมาแก๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
67	บ้านกีแยมัส หมู่ที่ 4 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
68	บ้านบูเกะ หมู่ที่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
69	บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
70	บ้านโคกมือบา หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
71	บ้านปะลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
72	บ้านสะหริ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
73	บ้านบูเกะกือจิ หมู่ที่ 12 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
74	บ้านบูเกะตาโมง หมู่ที่ 7 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
75	บ้านบาตง หมู่ที่ 3 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ซ้ำซ้อน
76	บ้านแกแมเก๊า หมู่ที่ 9 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ลำดับที่	รายการ	ความจำเป็นในการขอยกเลิก
77	บ้านบูเก๊ะมูนิง หมู่ที่ 4 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
78	บ้านบลูกาอีเลตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ซ้ำซ้อน
79	บ้านบลูกาฮีเล หมู่ที่ 6 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ซ้ำซ้อน
80	บ้านบาโงอาแซ หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
81	บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
82	บ้านอาแว หมู่ที่ 6 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
83	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ซ้ำซ้อน
84	บ้านอีนอ หมู่ที่ 3 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ซ้ำซ้อน
85	บ้านตะแม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ซ้ำซ้อน
86	บ้านบูเก๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	ซ้ำซ้อน
87	บ้านออก หมู่ที่ 3 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
88	บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
89	บ้านเกาะหม้อแกง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
90	บ้านหนองยูง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล
91	บ้านทุ่งทะนาน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล

17.6 ขออนุมัติปรับแผนงาน ครั้งที่ 5 โดยขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเดือนกันยายน 2560

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2793 1047 โทรสาร 0 2793 1037

ที่ 05/64 **วันที่** 12 มิ.ย. 2560

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

1. อทบ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการเงินกู้สำหรับแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 892 แห่ง วงเงินงบประมาณ 713,600,000 บาท ตามหนังสือ สพบ.ที่ 05/318 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

2. อทบ. ได้อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สพบ.ที่ 05/588 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิมเดือนสิงหาคม 2558 มาเป็นเดือนกันยายน 2558

3. อทบ. ได้อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ กผ.ด่วนที่สุด ที่ 02/885 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิมเดือนกันยายน 2558 มาเป็นเดือนธันวาคม 2558

4. สพบ. ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ตามหนังสือ สพบ.ที่ 05/1501 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 โดยขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิมเดือนธันวาคม 2558 มาเป็นเดือนกรกฎาคม ปี 2559 และ อทบ. อนุมัติการปรับแผน ตามหนังสือ กผ. ที่ 02/1287 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

5. สพบ. ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ตามหนังสือ สพบ.ที่ 05/744 ลงวันที่ 23 มิ.ย 2559 โดยขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิมเดือนกรกฎาคม ปี 2559 มาเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

6. สพบ. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามหนังสือ สพบ.ที่ 05/832 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยขอปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการ จำนวน 45 แห่ง และขอยกเลิกโครงการ จำนวน 91 แห่ง

7. หนังสือ กรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0628/ว67 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559

ข้อเท็จจริง

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 หมวด 4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ข้อ 14 การเปลี่ยนแปลงโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี: (เอกสารแนบ 1)

2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กนช.เห็นชอบตามที่ ทบ.ได้ขอยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่เดิมได้ จำนวน 91 แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง และขยายระยะเวลาดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไปจนสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2560: และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ฯ (เอกสารแนบ 2)

ปัจจุบัน การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ. เขต 1-11 อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วในบางส่วน แต่เนื่องจากมีบางพื้นที่ที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขอปรับเปลี่ยนสถานที่และยกเลิกโครงการ ส่งผลให้ทาง สทบ. เขต ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาลได้ อีกทั้งในพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ. เขต 12 ซึ่งได้ยกเลิกการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติ มีความจำเป็นต้องหาผู้รับจ้างใหม่ และสทบ. เขต 12 ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการจำนวน 34 แห่ง คงเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลใหม่อีกครั้ง จำนวน 24 แห่ง แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างต่อได้ตามแผนงานเดิม และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เพื่อเตรียมการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุให้พร้อมตามบัญชาของ อทบ. สพบ. จึงได้ขออนุมัติแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร และ อทบ. ได้อนุมัติแบบมาตรฐานแล้วตามหนังสือ สพบ. ที่ 05/1519 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (เอกสารแนบ 3) และ อทบ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) ตามคำสั่งที่ 603/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (เอกสารแนบ 4) เรียบร้อยแล้ว ภายหลังได้รับการอนุมัติยกเลิกโครงการจากคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลต่อไป

3. สพบ. มีความประสงค์จะขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้

1) แผนปฏิบัติงาน ขยายระยะเวลาจากเดิม เป็นเดือนกันยายน ปี 2560 (เอกสารแนบ 5)
2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 6)
3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 7)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

2. มอบหมาย กผ./ สพบ./ สบก.(สพ., สค.)/ สทบ.1-12 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การปรับแผนดังกล่าว ไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป และยังอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

เรียน อพ.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการ
ใช้จ่าย และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(เรืองสวัสดิ์)
นักวิชาการน้ำบาดาล
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติ
ดำเนินการตามเสนอ
13 ม.ค. 2560
(นายสุพจน์ ไชวิจิตรมณีชัยกุล)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรียน กพม. / คุณศุภาเดช
☑ ทราบ ☑ พิจารณาดำเนินการ
☐ รวมเรื่อง ☐ เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
☐ .....

สค./สพ.
เพื่อดำเนินการต่อไป ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
16 ม.ค. 2560

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
16 ม.ค. 2560

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559												ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560												รวมทั้งสิ้น
					ก.ย. 58	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย. 60	
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง	2,616,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	805,000	805,000	805,000	1,610,000	461,900	750,000	1,555,000															14,037,900
2	เจาะน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ	26,299,900	4,200,000	4,300,000	6,000,000	2,000,000	6,000,000	1,400,000	17,700,000	6,500,000	2,000,000	6,000,000														4,606,100	89,200,000
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด		9,144,840		28,554,770																						117,890	37,797,500
4	โซลาร์เซลล์และอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ		30,509,770																								6,699,800	37,222,570
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง				3,045,120	18,738,600	4,573,150	3,557,300																			20,483,230	50,398,000
6	สูบทดสอบบ่อน้ำบาดาล(Pumping Test)	7,692,800	892	บ่อ		860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	840,000	337,600	337,600	337,600																7,692,800
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง				1,074,820			116,630																			12,750	1,204,200
8	บ่อสังเกตุน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง					193,000	193,000	193,800																				579,800
9	ก่อสร้างอาคารประกอบบาดาล	416,320,000	892	แห่ง																		193,200,000		190,440,000					15,840,000	15,640,000	416,320,000
10	ค่าธรรมเนียมไฟฟ้าปักเสาพาดสายและหม้อแปลงไฟฟ้า	21,440,830	892	แห่ง							100,000	158,000	193,000	1,643,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	950,830				21,440,830
11	ค่าอุปกรณ์และการติดตั้งระบบประปาบาดาล	38,800,000	892	แห่ง							100,000	500,000	593,000	930,000	5,314,000	5,314,000	5,314,000	5,314,000	5,314,000	5,314,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,392,000				38,800,000
12	ค่าเป็นการพาณิชย์	178,400		บาท	76,000				20,000	20,000	20,000	20,000	22,400																	178,400
	ค่าติดตามประเมินผลประชุมโครงการและการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กรมฯ กำหนด	2,676,000		บาท	100,000	65,490	83,100	36,190	98,000	66,250	55,870	65,800	65,700	61,900	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	140,000			2,676,000
	เป็นงบเงินทดรองจ่าย																													
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบก่อสร้าง	2,230,000	892	แห่ง					50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	130,000		2,230,000
	รวม	713,500,000		บาท	28,891,900	46,583,100	7,053,100	43,160,900	22,696,600	12,569,800	7,234,600	20,955,800	8,285,600	5,589,400	16,443,600	8,353,000	8,353,000	8,353,000	8,353,000	8,353,000	2,506,000	2,506,000	2,506,000	195,706,000	2,506,000	192,976,830	1,586,000	1,658,000	13,347,000	37,683,770	713,600,000

หมายเหตุ : ปรับแผนครั้งที่ 5

1.ค่าใช้จ่ายตามการถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรมในหัวโครงการ

2.ค่าใช้จ่ายในการแทงหน่วยน้ำบาดาล สามารถถัวจ่ายกันได้ รวมและมีผลประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างหมอแทงสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยละเอียด เกรดคัด บูชสีแกส์ ทีมงาน และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

3.ค่าใช้จ่ายหรือผลจากการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ทร. (ส่วนกลาง)

4.ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้เป็นไปตามค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเก็บตัวอย่างน้ำและวัสดุวิทยาศาสตร์

5.ค่าติดตามประเมินผลประชุมโครงการและการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจติดตาม, ประเมินผลงานแผนงานโครงการ, ประชุมโครงการ, ตรวจรับงานจ้างซ่อมท่อสร้าง

6.บริเวณค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล อาจวงเงิน 499,320,000 บาท เป็นเงิน 410,320,000 บาท คงเหลือเป็น 89,200,000 บาท โดยใช้สอยงบ)-(2 ค่าเป็นการบรรจุหลักและวางแผนท่อระบบประปาบาดาลและ

ติดเป็นค่าอุปกรณ์และการแผนท่อระบบประปาบาดาล จำนวน 38,802,000 บาท และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 50,398,000 บาท

7.กิจกรรมค่าอุปกรณ์และการแผนท่อระบบประปา

7.1 ขนอุปกรณ์ ความกว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ราคาต่อหน่วย 15 บาท/ม.

7.2 ค่าวางท่อระบบประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ราคาต่อหน่วย 25 บาท/ม.

7.3 งานติดตั้งอุดจาบน้ำ ค่าติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ8.5 ราคาต่อหน่วย 20 บาท/ม.

7.4 งานวางท่อลอดถนน ท่อเหล็กเจาะสำรวจลึกเกิน ขนาด 3 นิ้ว ราคาต่อหน่วย 170 บาท/ม.

8.ค่าดำเนินการทางวิชาการ ให้เป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการติดตาม

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / รายการ	จำนวน	(หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (/) งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	ลักษณะงาน (/) งานที่เสร็จภายในปี 2558	วิธีการ (/) จัดซื้อ	วิธีการ (/) จ้าง	วิธีการ (/) สอบราคา	วิธีการ (/) ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว (/) ไม่มี	แผนปฏิบัติการ: ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ: คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	แผนปฏิบัติการ: คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน: งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	แผนการจ่ายเงิน: งบนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
1)	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม) จำนวน 892 แห่ง																	
		1) เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 และ 2.0 แรงม้า	892	ชุด	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	37,797,500.00		
		รายการที่ 1 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า	703	ชุด												28,612,100.00		@ 40,700 บาท
		รายการที่ 2 เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2.0 แรงม้า	189	ชุด												9,185,400.00		@ 48,600 บาท
		2) ท่อและอุปกรณ์														37,222,570.00		
		รายการที่ 1 ท่อกรุพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาดระบุ 150 มม.	15,031	ท่อน	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	30,813,550.00		@ 2,050 บาท
		รายการที่ 2 ท่อเจาะร่องพีวีซีแข็ง แบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาขนาดระบุ 150 มม.	2,676	ท่อน	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	5,726,640.00		@ 2,140 บาท
		รายการที่ 3 ฝาครอบท่อรับทรายพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.	892	อัน	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	392,480.00		@ 440 บาท
		รายการที่ 4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	892	กระป๋อง	/					/	/		ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	289,900.00		@ 325 บาท
		3) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	892	ระบบ	/					/	/							
		- เขต 1-11	834										ต.ค.-58	ก.ย.-59	ก.พ.-60	383,640,000.00		@ 460,000 บาท
		- เขต 12	24										มี.ค.-60	พ.ค.-60	ส.ค.-60	11,040,000.00		@ 460,000 บาท
		4) ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์														50,398,000.00		
		4.1) ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์เพื่อระบบประปาบาดาล																
		รายการที่ 1 ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ขนาด 2 นิ้ว	223,000	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	41,255,000.00		@ 185 บาท/ท่อน
		รายการที่ 2 ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว	5,352	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	224,784.00		@ 42 บาท/ท่อน
		รายการที่ 3 ข้อต่อสามทางลดพีวีซี ขนาด 2x1/2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,917,800.00		@ 43 บาท/อัน
		รายการที่ 4 ข้องอพีวีซี 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,159,600.00		@ 26 บาท/อัน
		รายการที่ 5 ฝาครอบพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว	44,600	อัน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	178,400.00		@ 4 บาท/อัน
		รายการที่ 6 น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งชนิดข้น ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม	5,352	กระป๋อง	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	1,739,400.00		@ 325 บาท/กระป๋อง
		4.2) ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	1,784	ท่อน	/					/	/		ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	3,923,016.00		@ 2198 บาท/ท่อน

แผนจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. สทบ. เขต 12 สงขลา จำนวน 24 แห่ง

ภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกโครงการ จำนวน 34 แห่ง

ลำดับ	ขั้นตอน	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	ก.ย.-60	วันทำการ
1	จัดทำและขออนุมัติ TOR และประมาณราคา (BOQ)	—								15
2	ประกาศร่าง TOR และราคากลาง		—							5
3	รอวิจารณ์ร่าง TOR และราคากลาง, ตอบข้อวิจารณ์		—							10
4	จัดทำและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		—							5
5	ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอ เสนอราคา			—						10
6	รับข้อเสนอและพิจารณาผลการประกวดราคา			—						10
7	ขออนุมัติจ้างเหมา			—						10
8	จัดทำสัญญา				—					15
9	ดำเนินการก่อสร้าง				—	—	—	—		90
10	ตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่าย							—	—	30
11	จัดทำรายงาน								—	30

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นเดือนกันยายน 2560

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานเลขานุการ กนช. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๓
ที่ ทส ๐๖๒๘/ว ๑๘ **วันที่** ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ตามที่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมฯ นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทาง E-mail nwrc.center@gmail.com และ nisara_s9@hotmail.com ผู้ประสานงาน นางสาวปิยะพร อริยขจร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๓ , ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๐ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวรศาสน์ อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีการพิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและข้อสั่งการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ประธานมอบนโยบายและสั่งการ ดังนี้

๑.๑ ชมเชยการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา สามารถแก้ไขสถานการณ์และวางแผนการบริหารจัดการน้ำที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ดี การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติด้านภัยแล้งถึงจะเหลือน้อย ก็ยังประสบปัญหาแล้งอยู่

๑.๒ ในปี ๒๕๖๐ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนงานที่ชัดเจนทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน มีการวางแผนและการปฏิบัติงานในเชิงรุก ให้ดำเนินการโครงการขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการได้ในระยะแรก หรือปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม รวมทั้งระบบกระจายน้ำ ระบบส่งน้ำที่เสียหาย ส่วนโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการต่อให้จัดทำเป็นแผนในระยะยาว ทั้งนี้ให้คำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ โดยพิจารณางบประมาณในหน่วยงานของตนเองก่อน หากไม่เพียงพอหรือไม่มีงบประมาณทางรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้

๑.๓ การควบคุมการบริหารจัดการน้ำ ให้มีศูนย์บริหารจัดการน้ำ ป่าไม้ และที่ดิน ที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ป่าไม้ ที่ดิน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลมาไว้ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ป่าไม้ และที่ดิน เพื่อเป็นเสมือนศูนย์บรรเทาภัยพิบัติ

๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน หรือผู้นำองค์กรที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการน้ำ เปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการน้ำให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การดำเนินการโครงการสำเร็จลุล่วงโดยเร็ว สามารถบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนได้มากที่สุด ดั่งพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราลงกรณ์ที่ทรงย้ำว่าประชาชนต้องผ่อนคลายจากความทุกข์

๑.๕ ให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทานทบทวนแก้ไขปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงการประกันภัยทางการเกษตรเชื่อมโยงกับ Agri-map และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรโดยกระบวนการแปรรูป รวมถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน การเวนคืนที่ดินสามารถชดเชยได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมถึงการเพาะปลูกที่อาศัยน้ำฝนให้จัดแบ่งแผนที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน

๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำกับภาคประชาชน ถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันว่ามีสถานะเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงตรงไหน เพื่อที่ประชาชนจะได้เตรียมการรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยให้การบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานและในพื้นที่ที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง

๑.๗ เร่งดำเนินการจัดหาประปาหมู่บ้านในส่วนที่เหลือ ๔๖๙ แห่งให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙ หากมีปัญหาและอุปสรรค ต้องหาวิธีการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

๑.๘ การรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙ ต้องรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย

๑.๙ การขอใช้พื้นที่ หากติดปัญหาข้อกฎหมายและเป็นโครงการเร่งด่วนให้นำเข้าคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) พิจารณา

๑.๑๐ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ให้หาแนวทางที่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ให้ถึงพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้ได้

๑.๑๑ ให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนการรองรับน้ำท่วมที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนี้

๒. เรื่องเพื่อทราบ ๖ เรื่อง

๒.๑ รับทราบ สถานการณ์น้ำและการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำ ต้องประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายถึงระดับหมู่บ้าน โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อประชาชนจะได้เตรียมรับทุกสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นได้ทัน

๒.๒ รับทราบ การติดตามรายงานผลการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๑ ต้องเร่งรัดจัดหาประปาหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้านตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

๒.๓ รับทราบ ผลการดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ ให้มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเชิงคุณภาพด้วย

๒.๔ รับทราบ การเสนอความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในปี ๒๕๕๙ เสนอจำนวน ๑๓ เรื่อง และในปี ๒๕๖๐ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) จำนวน ๔ เรื่อง

๒.๕ รับทราบ สาระสำคัญและความก้าวหน้าของ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เสนอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน

๒.๖ รับทราบ การจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของหน่วยงานและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้ รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ โดยแบ่งเป็น ๔ หมวดหลัก ได้แก่ ๑) การกักเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ และระบบการระบายน้ำในแต่ละสภาพภูมิประเทศ ๒) ข้อมูลสถานการณ์น้ำ จำแนกเป็นรายภูมิภาคและความเชื่อมโยงในการใช้น้ำร่วมกัน ๓) การดำเนินการของรัฐบาลทั้งที่เป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จำแนกเป็นปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งและมาตรการระยะยาวที่มีความยั่งยืน ๔) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการแก้ไขการบริหารจัดการน้ำ

๓. เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา ๕ เรื่อง

๓.๑ รับทราบ สถานภาพความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๕ กลุ่มโครงการ การขอใช้พื้นที่ป่าไม้สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หากติดปัญหาข้อกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้นำเข้าคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป

ประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยให้กรมชลประทานไปดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ เห็นชอบในหลักการแนวคิดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศ ๓ กลุ่มหลัก โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาแนวคิดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไปใช้ในการประกอบการจัดทำผังน้ำของประเทศ

๓.๓ ความก้าวหน้าแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานได้เสนอแผนเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวที่สำคัญ ๙ แผนงาน ดังนี้ ๑) แผนการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ๒) แผนคลองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (ชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย) ๓) แผนการพัฒนาคลองระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ ๓ ๔) แผนงานปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก ๕) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ๖) แผนงานการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ๗) แผนงานคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ๘) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน ๙) แผนงานพื้นที่รับน้ำนอง โดยมี ๗ แผนงานที่มีความชัดเจนขององค์ประกอบ กรอบวงเงิน ๒๒๘,๑๐๐ ล้านบาท และได้พิจารณาเป็นโครงการย่อยที่มีความพร้อมและไม่ติดปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ กรอบวงเงิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท ตามมติที่ประชุม กนช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแผนงานและงบประมาณโครงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการแผนการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๙ แผนงาน โดยให้เร่งดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายคลองชลประทานเดิม ๒๓ คลองตามแผนการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง และปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสักเป็นคลองส่งน้ำคู่ขนานคลองระบายน้ำตามแผนคลองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก (ชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย) ก่อน

๒. สำหรับงบประมาณที่เสนอ มีบางโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมากและต้องผูกพันงบประมาณหลายปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณของประเทศ จึงขอให้กรมชลประทานไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามลำดับความสำคัญและงบประมาณทั้ง ๙ แผนงาน และนำมาเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๓. เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)) กระทรวงมหาดไทย ร่วมดำเนินการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จัดที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากจนที่บุกรุกเขตคลองเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตะวันออกตอนล่าง

๓.๔ การขอขยายระยะเวลาดำเนินการและขยายกรอบวงเงินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมชลประทานขอความเห็นชอบ ดังนี้ (๑) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก ๙ ปี (๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) เป็น ๑๔ ปี (๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) โดยคงวงเงินเดิม ๑๐,๕๐๐ ล้านบาท (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก ๘ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๖๔) โดยคงวงเงินเดิม ๔,๘๐๐ ล้านบาท (๓) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จาก ๖ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เป็น ๑๑ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๖๕) โดยคงวงเงินเดิม ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และ (๔) ขอเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปราจีนบุรี จากวงเงินเดิม ๘,๓๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๙,๐๗๘ ล้านบาท และขยายระยะเวลาจากเดิม ๙ ปี (๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) เป็น ๑๓ ปี (๒๕๕๓ - ๒๕๖๓)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กรมชลประทานเสนอ และไปดำเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๕ การขยายระยะเวลาดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอความเห็นชอบ ดังนี้ (๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (๒) โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (๓) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสนอ และไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. เรื่องเพื่อพิจารณา ๘ เรื่อง

๔.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาการกลั่นกรองแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฝ่ายเลขานุการ กนช.ได้นำเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของโครงการ โดยมี ๔ ขั้นตอน คือ (๑) ขั้นตอนที่ ๑ การกลั่นกรองแผนงาน/โครงการแบบรายหน่วยงาน (๒) ขั้นตอนที่ ๒ การกลั่นกรองแผนงานโครงการตามลักษณะงาน (๓) ขั้นตอนที่ ๓ การกลั่นกรองแผนงานโครงการบูรณาการสอดรับกันอย่างเป็นระบบครบวงจร (๔) ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามประเมินผลโครงการเพื่อนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ กลไกลการจัดทำโดยใช้คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการและกลั่นกรองและบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการและงบประมาณ นำหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการไปดำเนินการ และแต่งตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการในแต่ละกลุ่ม ทั้ง ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มโทรมาตร (สถานีตรวจวัด) และแผนที่ ๒) กลุ่มแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ๓) กลุ่มอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และน้ำใต้ดิน ๔) กลุ่มบรรเทาแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำแล้ง น้ำท่วม ๕) กลุ่มบริหารจัดการและศึกษาวิจัย ดำเนินการตามปฏิทินการจัดทำแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ แต่เนื่องจากอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน ๔ คณะมีความซ้ำซ้อน เพื่อให้คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความเป็นเอกภาพ และมีอำนาจในการดำเนินการตั้งแต่การวิเคราะห์แผนงานโครงการ เชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรน้ำ และเป็นกลไกการจัดทำแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ควรมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ ชื่อของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินโครงการและประชาสัมพันธ์ที่ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ"

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้มีการกลั่นกรองแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยให้พิจารณาด้าน Area base ควบคู่การพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาดำเนินการ และเห็นชอบในการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และชื่อคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คณะตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

๔.๒ การปฏิรูปการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ ตามที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสังคมเสนอให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้เพิ่มหมวดที่ ๔ ลงในระเบียบเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ซึ่งในอนาคตจะมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... จะครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนในรูปแบบขององค์กรผู้ใช้น้ำ

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนำข้อเสนอการปฏิรูปการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศไปพิจารณาควบคู่กับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

๔.๓ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ประจำปี ๒๕๖๐ กองทัพบกได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ โครงการในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก บรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำแล้งให้กับประชาชนกว่า ๒๙,๑๐๐ ครัวเรือน กระจายน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร ประมาณ ๒,๖๐๐ ไร่ และเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ประมาณ ๓.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๒๓๙.๕๙๓๕ ล้านบาท

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้กองทัพบกดำเนินการโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือกองทัพบก-มูลนิธิอุทกพัฒน์) ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒ โครงการ ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด งบประมาณจำนวน ๒๓๙.๕๙๓๕ ล้านบาท ส่วนงบประมาณให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๔ แผนพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ กรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ (๑) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์มีปัญหาการบุกรุก บึงตื้นเขิน และความต้องการน้ำมากขึ้น (๒) บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร มีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ตันดินปิดล้อมบึงทำให้ขาดการเชื่อมโยงทางน้ำ (๓) กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา มีตะกอนตื้นเขินและความต้องการน้ำเพิ่มขึ้น (๔) หนองหาร จังหวัดสกลนคร มีปัญหาตะกอนทำให้ตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ไม่มีทางน้ำเพื่อเชื่อมโยงและระบายน้ำส่งผลต่อคุณภาพน้ำ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรมเจ้าท่า จังหวัดของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศตามขั้นตอนต่อไป

๔.๕ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากปริมาณน้ำหลากที่ไหลผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีมากกว่าศักยภาพในการระบายน้ำของลำน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงทำให้เกิดอุทกภัยเป็นปัญหาทุกปี กรมชลประทานจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างคลองผันน้ำอ้อมตัวเมืองเพื่อศักยภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลและปรับปรุงคลองธรรมชาติเดิมให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแผนงานการดำเนินงาน ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๕) กรอบวงเงิน ๙,๕๘๐ ล้านบาท ด้วยโครงการที่มีการลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดำเนิน

โครงการ แต่ต้องให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาและตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเป็นโครงการพระราชดำริและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่อไป โดยให้นำข้อสังเกตของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๔.๖ โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลุ่มน้ำเลยมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย ๑,๓๓๒ ล้าน ลบ.ม. แต่สามารถเก็บกักน้ำได้ ๘๕.๔๓ ล้าน ลบ.ม. (๗.๕๕%) จึงเกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อยู่เป็นประจำ แนวทางแก้ไขปัญหา ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๑ แห่ง เพื่อเก็บน้ำในลำน้ำได้ ๖ ล้าน ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๗๒,๕๐๐ ไร่ กรมชลประทานจึงขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักจังหวัดเลย แผนงาน ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖) กรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ด้วยโครงการที่มีการลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการ แต่ต้องให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาและตรวจสอบแผนปฏิบัติการ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานดำเนินโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการต่อไป โดยให้นำข้อสังเกตของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๔.๗ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัม ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง ความคืบหน้าโครงการซื้อไฟฟ้าต่างประเทศและร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) กรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทานรับไปเตรียมการวางแผนในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำน้ำจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ศึกษาแนวทางเลือกผันน้ำไว้จำนวน ๖ แนวทาง คือ ๑) ระบบท่อผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม ๒-ระบบท่อ EAST WATER ๒) ระบบท่อผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม ๒-อ่างฯ ประแสร์ ๓) ระบบท่อผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม ๑-ระบบท่อ EAST WATER ๔) ระบบท่อผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม ๑-อ่างฯ ประแสร์ ๕) คลองผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม ๑-แม่น้ำระยอง ๖) คลองผันน้ำ+ท่อผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม ๑-แม่น้ำระยอง ปรากฏว่าแนวทางที่ ๒ ระบบท่อผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม ๒-อ่างฯ ประแสร์ เป็นแนวทางที่คุ้มทุนที่สุด ดังนั้นการวางแผนการใช้น้ำจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสตึงนัมต้องมีการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำภายในประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการนำน้ำจากเขื่อนสตึงนัมมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคตะวันออก การดำเนินการภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดตราด และการพัฒนาอื่น ๆ ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อกำหนดแนวทางเลือกที่เหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการที่เสนอ และ

๑. มอบหมายกรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพหลักในการทบทวนและศึกษาวางแผนการใช้น้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงกำหนดแนวทางการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนังที่เหมาะสม ระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน จังหวัดตราด และการพัฒนาอื่นๆ ในปัจจุบันและอนาคต

๒. มอบหมายกรมชลประทานวางแผนการใช้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำภายในประเทศเพิ่มเติมของพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อให้การใช้น้ำในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. ให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทานประสานงานกับกระทรวงพลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบต่อไป

๔.๘ การทบทวนและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำตามภารกิจถ่ายโอน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมพัฒนาที่ดิน โครงการชลประทานขนาดเล็ก โดยกรมชลประทาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขอบเขตการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติฯ ดังกล่าว แต่เมื่อถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป ปรากฏว่าไม่มีงบประมาณในการซ่อมบำรุง ประกอบกับขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลโครงการที่ได้รับการถ่ายโอน ฝ่ายเลขานุการ กนช. เสนอแนวทางการซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ส่วนราชการได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพชำรุดทั้งหมด แจ้งให้ส่วนราชการที่ถ่ายโอนทราบ เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการออกแบบเพื่อซ่อมแซม พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาและประมาณการงบประมาณในการดำเนินการ และเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง) ในการซ่อมแซมต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ กนช. เป็นเจ้าภาพในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำตามภารกิจถ่ายโอน และนำข้อสรุปเรียนนายกรัฐมนตรีโดยด่วน

๕. เรื่องอื่นๆ ๑ เรื่อง

๕.๑ รับทราบ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำภาคใต้ จำนวน ๑๑๓ แห่ง และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและนำผลการแก้ไขมารายงานที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้ง

.....

17.7 ขออนุมัติปรับแผนโอนจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้ สทบ. เขต 12

เนื่องจากต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่อีกครั้ง ซึ่งหากดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding อีกครั้ง อาจจะไม่ทันตามกำหนดเวลาโครงการ อีกทั้งพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสถานการณ์ความไม่สงบ จึงเห็นควรให้ สทบ.เขต 12 ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2793 1046 โทรสาร 0 2793 1045

ที่ 05/ 171 **วันที่** 13 ก.พ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

1. อทบ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) วงเงินงบประมาณ 713,600,000 บาท ตามหนังสือ สพบ. ที่ 05/318 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558

2. สพบ.ได้มีหนังสือ ที่ 05/832 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

3. หนังสือ กรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0628/ว67 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559

ข้อเท็จจริง

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน

2. ตามแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) วงเงินงบประมาณ 713,600,000 บาท สพบ.มีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 892 แห่ง รวม 12 เขต ในวงเงินงบประมาณ 410,320,000 บาท (สี่ร้อยสิบล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงได้ประกาศยกเลิกและจำเป็นต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้งเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สทบ. เขต 12 จึงขอยกเลิกสถานที่ดำเนินการที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 32 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 29 แห่ง ยะลา 2 แห่ง ปัตตานี 1 แห่ง และยกเลิกสถานที่ดำเนินการที่

ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล ในพื้นที่จังหวัดสตูล รวม 2 แห่ง คงเหลือสถานที่ที่สามารถก่อสร้างระบบประปาบาดาลได้ รวม 24 แห่ง

4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กนช.เห็นชอบตามที่ ทบ.ได้ขอยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่เดิมได้ จำนวน 91 แห่ง และปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง: และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ฯ

5. เนื่องจากการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ. เขต 12 จำเป็นต้องจัดจ้างใหม่อีกครั้ง สพบ. พิจารณาแล้วเห็นว่าหากดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคา e - bidding อีกครั้ง อาจจะไม่ทันตามกำหนดเวลาโครงการ อีกทั้งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสถานการณ์รุนแรง จึงเห็นควรให้ สทบ. เขต 12 เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ เนื่องจากวิธีเดิมไม่ได้ผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 38 วรรค 2 ในกรณีไม่มีผู้เสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น เพื่อดำเนินการโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23(8) หรือ ข้อ 24(6) แล้วแต่กรณีก็ได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ในพื้นที่รับผิดชอบของ สทบ. เขต 12 แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ สพบ. มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลจากส่วนกลางให้ สทบ. เขต 12 จำนวน 24 แห่ง แห่งละ 460,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,040,000 บาท

6. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ 5 และเกิดประโยชน์สูงสุด สพบ. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และแผนโอนจัดสรรงบประมาณให้ สทบ. เขต 12 แยกเป็นรายแห่งตามรหัสงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

/ข้อพิจารณา....

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติตามข้อเท็จจริงที่ 5

2. มอบหมายให้ สพบ./ สบก.(สค/สพ.)/กผ./สทบ. เขต 12 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพันธ์ศักดิ์ ธีรปัญญาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

(นางอรัญญา เพื่องสวัสดิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๐

อนุมัติ/ดำเนินการตามเสนอ

06 ก.พ. 2560
(นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบลงทุน รายการแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน	กิจกรรม															รวมเป็นเงิน
	จำนวนบ่อ	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์	ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	ค่าดำเนินการทางพัสดุ	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	
สทบ.1 (ลำปาง)	125	1,762,400	12,500,000				1,050,000		81,250		1,778,075	5,437,500		250,000	312,500	23,171,725
สทบ.2 (สุพรรณบุรี)	9	114,400	900,000				75,600		5,850		124,335	391,500		18,000	22,500	1,652,185
สทบ.3 (สระบุรี)	24	355,900	2,400,000				201,600		15,600		346,560	1,044,000		48,000	60,000	4,471,660
สทบ.4 (ขอนแก่น)	16	257,600	1,600,000				134,400		10,400		427,140	696,000		32,000	40,000	3,197,540
สทบ.5 (นครราชสีมา)	244	3,928,400	24,400,000				2,049,600		158,600		6,997,760	10,614,000		488,000	610,000	49,246,360
สทบ.6 (ตรัง)	90	1,449,000	9,000,000				756,000		58,500		1,939,850	3,915,000		180,000	225,000	17,523,350
สทบ.7 (กำแพงเพชร)	9	144,900	900,000				75,600		5,850		157,085	391,500		18,000	22,500	1,715,435
สทบ.8 (ราชบุรี)	5	68,300	500,000				42,000		3,250		49,975	217,500		10,000	12,500	903,525
สทบ.9 (ระยอง)	71	1,143,100	7,100,000				596,400		46,150		1,433,215	3,088,500		142,000	177,500	13,726,865
สทบ.10 (อุดรธานี)	24	386,400	2,400,000				201,600		15,600		660,460	1,044,000		48,000	60,000	4,816,060
สทบ.11 (อุบลราชธานี)	217	3,493,700	21,700,000				1,822,800		141,050		6,020,705	9,439,500		434,000	542,500	43,594,255
สทบ.12 (สงขลา)	58	933,800	5,800,000				487,200		37,700	11,040,000	1,525,670	2,523,000		116,000	145,000	22,608,370
รวมเขต	**892**	**14,037,900**	**89,200,000**				**7,492,800**	**-**	**579,800**	**11,040,000**	**21,460,830**	**38,802,000**	**-**	**1,784,000**	**2,230,000**	**186,627,330**
กวน.								1,204,200								1,204,200
สพบ.				37,797,500	37,222,570	50,398,000				399,280,000			178,400	892,000		525,768,470
ส่วนกลาง																-
รวม	**892**	**14,037,900**	**89,200,000**	**37,797,500**	**37,222,570**	**50,398,000**	**7,492,800**	**1,204,200**	**579,800**	**410,320,000**	**21,460,830**	**38,802,000**	**178,400**	**2,676,000**	**2,230,000**	**713,600,000**

หมายเหตุ : ปรับแผนโอนจัดสรรค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลให้ สทบ. เขต 12

1.โอนกิจกรรมค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลในส่วนของสทบ. เขต 12 จากสทบ.ให้ สทบ. เขต 12 จำนวน 24 แห่งๆและ 460,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 11,040,000 บาท

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

งบลงทุน รายการแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สทบ.เขต	ธรณีภาค	ปี 2558 กิจกรรมที่ 1 ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์อุทกธรณี (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 2 ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม. (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ (สทบ.)	กิจกรรมที่ 4 ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์ (สทบ.)	กิจกรรมที่ 5 ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 6 ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ (กรม.)	กิจกรรมที่ 7 ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 8 ค่าป้าย ประกอบน้ำบาดาล (สทบ.)	กิจกรรมที่ 9 ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 10 ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 11 ค่าขุดพังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 12 ค่าดำเนินการพาพิจิตุ (สทบ.)	กิจกรรมที่ 13 ค่าติดตามประเมินผลประชุมโครงการ/ผลสรประชาสัมพันธ์ (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 14 ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ+ตู้ควบคุมมาตรต่อวัว (สทบ. เขต)	รวมปี 2558 เป็นเงิน	ปี 2559 กิจกรรมที่ 2 ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม. (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 9 ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล (สทบ.)	(สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 10 ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 11 ค่าขุดพังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล (สทบ. เขต)	กิจกรรมที่ 13 ค่าติดตามประเมินผลประชุมโครงการประชาสัมพันธ์ (สทบ. เขต)	รวมปี 2559เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
1	09000TC1001410835	บ้านบางแก	5	โคกชุมแสง	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
2	09000TC1001410836	บ้านสาวอ	8	โคกชุมแสง	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
3	09000TC1001410837	บ้านเนียะหม	3	โคกชุมแสง	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
4	09000TC1001410838	บ้านเขาลานสัน	6	โคกชุมแสง	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
5	09000TC1001410839	บ้านคำแลา	6	ยะลาล	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
6	09000TC1001410840	บ้านคำเสริก	5	ยะลาล	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
7	09000TC1001410841	บ้านกงสูนน	2	ยะลาล	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
8	09000TC1001410842	บ้านบากรุ	1	ยะลาล	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
9	09000TC1001410843	บ้านระมานีร	3	ยะลาล	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
10	09000TC1001410844	บ้านโต๊ะแย๊ด	4	ยะลาล	สะเดา	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
11	09000TC1001410845	บ้านภูเกาะ	5	ปูยิหม	สุไหงโก-ลก	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
12	09000TC1001410846	บ้านปักปาลา	5	ไอบีด	สาคิบ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
13	09000TC1001410847	บ้านไทรเมียบา	4	ไอบีด	สาคิบ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
14	09000TC1001410848	บ้านประสูตร	3	ไอบีด	สาคิบ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
15	09000TC1001410849	บ้านมะหวิ้ง	1	ไอบีด	สาคิบ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
16	09000TC1001410850	บ้านภูเกาะจิงจิ	12	ปูลิก	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
17	09000TC1001410851	บ้านภูเกาะเกาะ	7	ปูลิก	เจาะไอร้อง	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
18	09000TC1001410852	บ้านภูเก็ะบูเลง	11	ต้นทอรมัก	ระแงะ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000		460,000	7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
19	09000TC1001410853	บ้านต้นทอรมัก	1	ต้นทอรมัก	ระแงะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650		660,000	21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
20	09000TC1001410854	บ้านโล๊ะมะนะ	10	ต้นทอรมัก	ระแงะ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000		460,000	7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
21	09000TC1001410855	บ้านบ่วน	2	ต้นทอรมัก	ระแงะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650		460,000	21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
22	09000TC1001410856	บ้านไทย	3	ต้นทอรมัก	ระแงะ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000		460,000	7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
23	09000TC1001410857	บ้านบาดง	3	บาดง	รือเสาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
24	09000TC1001410858	บ้านแกแอ	4	ต้นทอรมัก	ระแงะ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000		460,000	7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
25	09000TC1001410859	บ้านแกแอเก้า	9	ต้นทอรมัก	ระแงะ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
26	09000TC1001410860	บ้านภูเก็ะบูเก้า	4	มะรือโบตก	ระแงะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
27	09000TC1001410861	บ้านบญาเลียะวันตก	8	บาดง	รือเสาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
28	09000TC1001410862	บ้านบญาลิล	6	บาดง	รือเสาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
29	09000TC1001410863	บ้านบาโมมาเซ	6	ต้นทอรมัก	ระแงะ	นราธิวาส	12	2	16,100		40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650			21,665		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
30	09000TC1001410864	บ้านบริมิ	7	ลาไนอ	รือเสาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
31	09000TC1001410865	บ้านตาบา	6	มะรือโบตก	ระแงะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
32	09000TC1001410866	บ้านสันติสุข	2	บาดง	รือเสาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
33	09000TC1001410867	บ้านอีแล	3	ลาไนอ	รือเสาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
34	09000TC1001410868	บ้านทดแม้	1	บาดง	รือเสาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
35	09000TC1001410869	บ้านภูเก๊ะ	7	บาดง	รือเสาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
36	09000TC1001410870	บ้านอุโบะบือซา	1	อุโบะรือซา	จ้อะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650		460,000	21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
37	09000TC1001410871	บ้านบือเระ	1	บาเระโส์	บาเจาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	40,700	37,935	56,500	8,400	1,350	650		460,000	21,665		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
38	09000TC1001410872	บ้านดินทะ	4	บาเระโส์	บาเจาะ	นราธิวาส	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650		460,000	13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
39	09000TC1001410873	บ้านออก	3	จาบี	ยะลา	ยะลา	12	2	16,100		48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650			13,765		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
40	09000TC1001410874	บ้านไว้	4	จาบี	ยะลา	ยะลา	12	2	16,100		48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650			13,765		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
41	09000TC1001410875	บ้านบาโด	3	บุโบ	เมืองยะลา	ยะลา	12	2	16,100		48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650			13,765		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000		460,000	7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
42	09000TC1001410876	บ้านบัลเจ๊ะอูตู	6	บุโบ	เมืองยะลา	ยะลา	12	2	16,100		48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650			13,765		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000		460,000	7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
43	09000TC1001410877	บ้านบาเระหมื่องแกะ	6	ท่าข้าช้า	หนองจิก	ปัตตานี	12	2	16,100		48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650			13,765		200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000		7,500	43,500	1,000	612,000	800,000
44	09000TC1001410878	กองพลทหารราบที่15 บ้านปะเหลง		ปะเหลง	หนองจิก	ปัตตานี	12	2	16,100		48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	53,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	241,000	100,000		407,000	7,500	43,500	1,000	559,000	800,000
45	09000TC1001410879	บ้านบางมะรวด	3	ปากพญา	ปากพยูน	พัทลุง	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
46	09000TC1001410880	บ้านตวน	6	เขาย่อยเหนือ	ควนขนุน	พัทลุง	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
47	09000TC1001410881	บ้านทดแม้ยะ	13	พนางตุง	ควนขนุน	พัทลุง	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
48	09000TC1001410882	บ้านดินงา	1	เขาเปียรหิ	สทิงพระ	สงขลา	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
49	09000TC1001410883	บ้านทราก	4	บ้านทราก	บางกล่ำ	สงขลา	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
50	09000TC1001410884	บ้านคูู	1	บ้านทราก	บางกล่ำ	สงขลา	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
51	09000TC1001410885	บ้านเสียบ	1	ท่าข้าช้าง	บางกล่ำ	สงขลา	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
52	09000TC1001410886	บ้านปากหรัง	1	ระแม้	สิงหนคร	สงขลา	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
53	09000TC1001410887	บ้านท่าหิน	6	ท่าหิน	สทิงพระ	สงขลา	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
54	09000TC1001410888	บ้านพรวน	8	ท่าหิน	สทิงพระ	สงขลา	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
55	09000TC1001410889	บ้านไร่ใสสี	1	ควนสตอ	ควนเนียง	สตูล	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
56	09000TC1001410890	บ้านโต๊ะเจ๊ะตูสา	1	ปากน้ำ	สตูล	สตูล	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
57	09000TC1001410891	บ้านหลวงสูง	8	ป่าแฝด	สตูล	สตูล	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
58	09000TC1001410892	บ้านทุ่งหยาน	3	ทุ่งบุหรี่	ทุ่งหว้า	สตูล	12	1	16,100	100,000	48,600	37,935	56,500	8,400	1,350	650	460,000		13,765		200	1,000	1,000	2,500	748,000				7,500	43,500	1,000	52,000	800,000
รวม									933,800	2,900,000	2,526,500	2,200,230	3,277,000	487,200	78,300	37,700	5,520,000	7,873,000	1,090,670	0	11,600	58,000	58,000	145,000	27,197,800	2,900,000	10,120,000	3,167,000	435,000	2,523,000	58,000	19,203,000	46,400,000
รวม (ตามกิจกรรม)									933,800	2,900,000	2,526,500	2,200,230	3,277,000	487,200	78,300	37,700	5,520,000	7,873,000	1,090,670	0	11,600	58,000	58,000	145,000	27,197,800	2,900,000	10,120,000	3,167,000	435,000	2,523,000	58,000	19,203,000	46,400,000

หมายเหตุ : ปรับแผนโอนจัดสรรค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลฯ เขต 12 จากส่วนกลางให้ สทบ. เขต 12 จำนวน 24 แห่งๆละ 460,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 11,040,000 บาท

1.โอนกิจกรรมค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลฯ ส่วนของ สทบ. เขต 12 จากส่วนกลางให้ สทบ. เขต 12 จำนวน 24 แห่งๆละ 460,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 11,040,000 บาท

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) รายงานผลปีงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17.8 ขออนุมัติปรับแผนงาน ครั้งที่ 6 โดยขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ สทบ. เขต 1, 3, 5, 7, 9 และ 11

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2793 1046 โทรสาร 0 2793 1037

ที่ 05/1369 **วันที่** 25 ส.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

1. บันทึกข้อความ กผ. ด่วนที่สุด ที่ 02/885 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 อทบ. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

2. บันทึกข้อความ สพบ. ด่วนที่สุด ที่ 05/1308 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อทบ. อนุมัติโอนจัดสรรเพิ่มเติมกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ให้ สทบ.เขต 1, 3, 5, 7, 9 และ 11 จำนวน 29 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 968,443.67 บาท

ข้อเท็จจริง

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน (เอกสารแนบ 1)

2. สพบ. ได้รับการประสานจาก สทบ. เขต 1, 3, 5, 7, 9, และ 11 กรณีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ที่ได้รับโอนจัดสรรให้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ รวมจำนวน 29 แห่ง เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นวงเงิน 684,035.00 บาท และประมาณการที่ กฟภ. ประมาณให้ รวมเป็นวงเงิน 1,826,730.30 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,142,695.30 บาท (เอกสารแนบ 2) จึงเห็นควรปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย

3. เพื่อให้การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นไปตามข้อเท็จจริง ที่ 1 และ 2 เห็นควรพิจารณาขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และ 4 ตามลำดับ ดังนี้

/3.1 ปรับเพิ่ม...

3.1 ปรับเพิ่มค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า ตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2558 วงเงิน 806,637.53 บาท และตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2559 วงเงิน 161,806.14 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 968,443.67 บาท โอนให้ สทบ. เขต 1, 3, 5, 7, 9, และ 11 โดยปรับลดวงเงินค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์, ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์, ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์, ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล ตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2558 วงเงิน 806,637.53 บาท และค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล ตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2559 วงเงิน 161,806.14 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 968,443.67 บาท จากเดิมตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2558 วงเงิน 10,998,965.00 บาท และตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2559 วงเงิน 6,440,000.00 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 17,438,965.00 บาท คงเหลือค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์, ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์, ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์, ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล ตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2558 วงเงิน 10,192,327.27 บาท และตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2559 วงเงิน 6,278,193.86 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 16,470,521.13 บาท (เอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ งบประมาณปรับลดวงเงินค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์, ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์,ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์และค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล นั้น เป็นงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณแล้ว และการปรับแผนดังกล่าวยังอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการและยังอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

3.2 เพื่อให้ ทบ. สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน เห็นควรโอนจัดสรรงบประมาณให้กับ สทบ. เขต 1, 3, 5, 7, 9, และ 11 ตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2558 วงเงิน 806,637.53 บาท และตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2559 วงเงิน 161,806.14 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 968,443.67 บาท (เอกสารแนบ 4)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติปรับแผน ตามข้อเท็จจริงที่ 3.1
2. อนุมัติโอนจัดสรร ตามข้อเท็จจริงที่ 3.2
3. มอบหมายให้ สบก.(สค.)/ สพบ./ กผ./ สทบ. เขต 1, 3, 5, 7, 9, และ 11 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน อผ.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ข้อ 1, 2
และมอบหมายให้ปฏิบัติ
ข้อ 3 ต่อไป

(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐

(นายมณเฑียร จงจินากูล)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

อนุมัติ/ดำเนินการตามเสนอ

- 4 ก.ย. 2560

(นายสุพจน์ ไตวิจักษณ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อม

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	สถานที่ตั้ง	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เขต	ค่าขยายเขตไฟฟ้าที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้า(บาท)	เกินงบประมาณ (บาท)
								งบปี 2558 งบประมาณ	งบปี 2559 งบประมาณ	รวม		
1	09007C1001410015	บ้านเวียงได้	3	เวียง	เชียงแสน	เชียงราย	1	7,315	7,500	14,815.00	132,000.00	117,185.00
2	09007C1001410029	บ้านท่าสันกลาง	14	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย	1	7,315	7,500	14,815.00	47,213.98	32,398.98
3	09007C1001410047	บ้านแก่งปันเค้า	10	แม่นะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	7,315	7,500	14,815.00	138,680.00	123,865.00
4	09007C1001410090	บ้านป่างพริก	3	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	1	5,515	7,500	13,015.00	130,340.00	117,325.00
5	09007C1001410122	บ้านบนทุ่ง	9	ทุ่งยั้ว	วังเหนือ	ลำปาง	1	5,515	7,500	13,015.00	69,661.00	56,646.00
6	09007C1001410123	บ้านแม่ทรายเงิน	2	ทุ่งยั้ว	วังเหนือ	ลำปาง	1	5,515	7,500	13,015.00	89,240.00	76,225.00
7	09007C1001410137	บ้านหอย	1	บ้านหอย	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี	3	7,315	7,500	14,815.00	29,324.79	14,509.79
8	09007C1001410247	บ้านหนองคู	6	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5	21,665	7,500	29,165.00	38,122.16	8,957.16
9	09007C1001410256	บ้านเสม็ด	13	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5	21,665	7,500	29,165.00	60,226.22	31,061.22
10	09007C1001410270	บ้านระไซร์	10	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5	21,665	7,500	29,165.00	36,636.12	7,471.12
11	09007C1001410273	บ้านเบาะอุ่น	8	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5	21,665	7,500	29,165.00	68,160.03	38,995.03
12	09007C1001410334	บ้านห้วยราช	9	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5	21,665	7,500	29,165.00	42,867.47	13,702.47
13	09007C1001410350	บ้านตาเตาะ	9	โชคบารมี	ปราสาท	สุรินทร์	5	21,665	7,500	29,165.00	42,630.58	13,465.58
14	09007C1001410367	บ้านโคกกระโดน	9	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5	21,665	7,500	29,165.00	37,825.77	8,660.77
15	09007C1001410385	บ้านไพบูลย์	9	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5	21,665	7,500	29,165.00	41,895.84	12,730.84
16	09007C1001410404	บ้านดอนพยอม	5	หายโศก	พุทไธสง	บุรีรัมย์	5	13,765	7,500	21,265.00	47,848.43	26,583.43
17	09007C1001410512	บ้านดอนเพชร	20	แม่ลิน	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	7	13,465	7,500	20,965.00	31,208.64	10,243.64
18	09007C1001410539	บ้านนาบุญ	18	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	9	13,465	7,500	20,965.00	58,171.27	37,206.27
19	09007C1001410626	บ้านไผ่ใหญ่	8	ไผ่ใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	11	21,665	7,500	29,165.00	92,790.12	63,625.12
20	09007C1001410638	บ้านโนนสร้างคำ	15	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	11	21,665	7,500	29,165.00	134,529.75	105,364.75
21	09007C1001410651	บ้านก้างปลา	6	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	11	21,665	7,500	29,165.00	76,376.49	47,211.49
22	09007C1001410655	บ้านดอนน้ำสร้าง	4	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	11	21,665	7,500	29,165.00	44,535.25	15,370.25
23	09007C1001410664	บ้านหนองแซ	13	ช้า	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	11	21,665	7,500	29,165.00	55,635.28	26,470.28
24	09007C1001410739	บ้านประอางเหนือ	11	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	11	21,665	7,500	29,165.00	48,776.91	19,611.91
25	09007C1001410790	บ้านหนองเมย	9	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	11	21,665	7,500	29,165.00	38,507.48	9,342.48
26	09007C1001410814	บ้านเจ้าทุ่ง	9	ทุ่งสว้าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	13,765	7,500	21,265.00	81,413.32	60,148.32
27	09007C1001410826	บ้านโคกเพ็ก	9	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	11	13,765	7,500	21,265.00	39,871.12	18,606.12
28	09007C1001410827	บ้านไพรี่ศรี	10	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	11	13,765	7,500	21,265.00	35,250.79	13,985.79
29	09007C1001410832	บ้านห่องเป็อย	8	อีเซ	ไพรีศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	11	13,765	7,500	21,265.00	36,991.49	15,726.49
		รวม						466,535.00	217,500.00	684,035.00	1,826,730.30	1,142,695.30

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

งบลงทุน รายการแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(แผนการจัดสรรงบประมาณใหม่)

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สทน.เขต	ปี 2558															ปี 2559						รวมเป็นเงิน
							กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3	กิจกรรมที่ 4	กิจกรรมที่ 5	กิจกรรมที่ 6	กิจกรรมที่ 7	กิจกรรมที่ 8	กิจกรรมที่ 9	กิจกรรมที่ 10	กิจกรรมที่ 12	กิจกรรมที่ 13		กิจกรรมที่ 14	รวมปี 2558 เป็นเงิน	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 9	กิจกรรมที่ 10	กิจกรรมที่ 11	กิจกรรมที่ 13	รวมปี 2559 เป็นเงิน	
							ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์	ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	ค่าอุทกธรณีปริมาณน้ำ	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	ค่าป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าดำเนินการทางพัสดุ	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์		ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง			ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าขุดลิ่งและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์		
							สทน. เขต	สทน. เขต	สทน.	สทน.	สทน.	สทน. เขต	กวน.	สทน. เขต	สทน.	สทน. เขต	สทน.	สทน. เขต	สทน.	สทน. เขต		สทน. เขต	สทน.	สทน. เขต	สทน. เขต	สทน. เขต		
1	บ้านเรียงได้	3	เวียง	เชียงแสน	เชียงราย	1	16,100		40,590.00	42,874	34,188.18	8,400	1,350	650		39,147.82	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	428,428.00	39,072.00	43,500	1,000	612,000	800,00
2	บ้านท่าสันกลาง	14	ดงมะดะ	แม่ลาว	เชียงราย	1	16,100		40,590.00	42,874	34,188.18	8,400	1,350	650		39,147.82	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	459,433.84	8,066.16	43,500	1,000	612,000	800,00
3	บ้านแก่งเป็นเต็ว	10	แม่นะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	16,100	100,000	40,590.00	42,874	34,188.18	8,400	1,350	650	416,154.00	82,993.82	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
4	บ้านปางพริก	3	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	1	10,000		48,385.40	42,874	34,188.18	8,400	1,350	650		37,652.42	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	428,428.00	39,072.00	43,500	1,000	612,000	800,00
5	บ้านบนทุ่ง	9	ทุ่งฮั้ว	วังเหนือ	ลำปาง	1	10,000	100,000	48,385.40	42,874	34,188.18	8,400	1,350	650	416,118.00	81,334.42	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
6	บ้านแม่ทรายเงิน	2	ทุ่งฮั้ว	วังเหนือ	ลำปาง	1	10,000	100,000	48,385.40	42,874	34,188.18	8,400	1,350	650	416,195.00	81,257.42	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
7	บ้านหอย	1	บ้านหอย	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี	3	16,100	100,000	40,590.00	42,874	51,511.21	8,400	1,350	650	460,000.00	21,824.79	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
8	บ้านหนองลู	6	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5	16,100		40,590.00	31,107	54,480.84	8,400	1,350	650		30,622.16	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
9	บ้านเสม็ด	13	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5	16,100		40,590.00	31,107	32,722.28	8,400	1,350	650		52,380.72	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	459,654.50	7,845.50	43,500	1,000	612,000	800,00
10	บ้านระไชร์	10	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5	16,100		40,590.00	31,107	55,966.88	8,400	1,350	650		29,136.12	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000.00	7,500.00	43,500	1,000	612,000	800,00
11	บ้านเบาะอุ่น	8	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5	16,100		40,590.00	31,107	32,832.28	8,400	1,350	650		52,270.72	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	451,610.69	15,889.31	43,500	1,000	612,000	800,00
12	บ้านหัวยราย	9	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5	16,100		40,590.00	31,107	49,735.53	8,400	1,350	650		35,367.47	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000.00	7,500.00	43,500	1,000	612,000	800,00
13	บ้านตาเตาะ	9	โชคบาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	5	16,100	100,000	40,590.00	31,107	49,972.42	8,400	1,350	650	460,000.00	35,130.58	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
14	บ้านโคกกระโดน	9	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5	16,100		40,590.00	31,107	54,777.23	8,400	1,350	650		30,325.77	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000.00	7,500.00	43,500	1,000	612,000	800,00
15	บ้านโพนูลย์	9	บ้านโพธ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5	16,100	100,000	40,590.00	31,107	50,707.16	8,400	1,350	650	460,000.00	34,395.84	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
16	บ้านดอนหยอม	5	หายโคก	พุทไธสง	บุรีรัมย์	5	16,100	100,000	48,385.40	31,107	36,959.17	8,400	1,350	650	460,000.00	40,348.43	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
17	บ้านดอนเพชร	20	แม่สิน	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	7	16,100	100,000	40,590.00	37,831	54,670.36	8,400	1,350	650	460,000.00	23,703.64	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
18	บ้านนาบุญ	18	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	9	16,100	100,000	40,590.00	37,831	33,411.64	8,400	1,350	650	454,296.09	50,671.27	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
19	บ้านไผ่ใหญ่	8	ไผ่ใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	11	16,100		40,590.00	31,107	33,544.78	8,400	1,350	650		51,558.22	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	426,268.10	41,231.90	43,500	1,000	612,000	800,00
20	บ้านโนนสร้างค้ำ	15	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	11	16,100		40,590.00	31,107	33,544.78	8,400	1,350	650		51,558.22	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	421,689.00	45,811.00	43,500	1,000	612,000	800,00
21	บ้านก้างปลา	6	หนองไม้	วังม่วง	สระบุรี	11	16,100		40,590.00	31,107	33,544.78	8,400	1,350	650		51,558.22	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	442,681.73	24,818.27	43,500	1,000	612,000	800,00
22	บ้านดอนน้ำลร้าง	4	เมืองใหม	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	11	16,100		40,590.00	31,107	48,067.75	8,400	1,350	650		37,035.25	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000.00	7,500.00	43,500	1,000	612,000	800,00
23	บ้านหนองแข้	13	ช้า	เมืองครีสะเกษ	ศรีสะเกษ	11	16,100	100,000	40,590.00	31,107	36,967.72	8,400	1,350	650	460,000.00	48,135.28	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
24	บ้านประอางเหนือ	11	ปราสาทเยย	โพธบิง	ศรีสะเกษ	11	16,100		40,590.00	31,107	43,826.09	8,400	1,350	650		41,276.91	200	1,000	1,000	2,500	188,000	100,000	460,000.00	7,500.00	43,500	1,000	612,000	800,00
25	บ้านหนองแยง	9	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	11	16,100	100,000	40,590.00	31,107	54,095.52	8,400	1,350	650	460,000.00	31,007.48	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
26	บ้านเจ้าทุ่ง	9	ทุ่งสว้าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	16,100	100,000	48,385.40	31,107	33,544.78	8,400	1,350	650	429,849.50	73,913.32	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
27	บ้านโคกเพ็ก	9	โนนเพ็ก	ทุ่งพ้อ	ศรีสะเกษ	11	16,100	100,000	48,385.40	31,107	44,936.48	8,400	1,350	650	460,000.00	32,371.12	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
28	บ้านโพธิ์ศรี	10	โนนเพ็ก	ทุ่งพ้อ	ศรีสะเกษ	11	16,100	100,000	48,385.40	31,107	49,556.81	8,400	1,350	650	460,000.00	27,750.79	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
29	บ้านท่องเปี่ยย	8	ยิง	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	11	16,100	100,000	48,385.40	31,107	47,816.11	8,400	1,350	650	460,000.00	29,491.49	200	1,000	1,000	2,500	748,000			7,500.00	43,500	1,000	52,000	800,00
รวมทั้งสิ้น							448,600	1,500,000	1,239,473.20	997,920	1,222,321.68	243,600	39,150	18,850	6,732,612.59	1,273,172.53	5,800	29,000	29,000	72,500	13,852,000	1,400,000	6,278,193.86	379,306.14	1,261,500	29,000.00	9,348,000	23,200,000.00

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) รายงานผลบันทึกระบบ

รายงานผลบันทึกระบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติโอนจัดสรรเพิ่มเติมกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	เขต	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2558								งบประมาณ ปี พ.ศ. 2559	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	ยอดโอนจัดสรรเพิ่มเติมกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า		
			ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์ (1)	ค่าเครื่องสูบน้ำ(2)	ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์(3)	ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล(4)	ค่าคิดตามประสิทธิผล(5)	ค่าดำเนินการทางหัตถุ (6)	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (7)	รวม	ค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ที่ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2558	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2559	รวม
			คงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ	(บาท)			
1	09007C1001410015	1	9,411.00	110.00	22,311.82	-	1,000.00			32,832.82	31,572.00	117,185.00	31,832.82	31,572.00	63,404.82
2	09007C1001410029	1	9,411.00	110.00	22,311.82	-	1,000.00			32,832.82	31,572.00	32,398.98	31,832.82	566.16	32,398.98
3	09007C1001410047	1	9,411.00	110.00	22,311.82	43,846.00	-			75,678.82	-	123,865.00	75,678.82		75,678.82
4	09007C1001410090	1	9,411.00	214.60	22,311.82	-	1,000.00			32,937.42	31,572.00	117,325.00	31,937.42	31,572.00	63,509.42
5	09007C1001410122	1	9,411.00	214.60	22,311.82	43,882.00	360.00			76,179.42	-	56,646.00	75,819.42		75,819.42
6	09007C1001410123	1	9,411.00	214.60	22,311.82	43,805.00	360.00			76,102.42	-	76,225.00	75,742.42		75,742.42
7	09007C1001410137	3	9,411.00	110.00	23,210.00	24,953.14	54.00			57,738.14	-	14,509.79	14,509.79	-	14,509.79
8	09007C1001410247	5	6,828.00	110.00	23,777.72	-	-			30,715.72	35,517.88	8,957.16	8,957.16	-	8,957.16
9	09007C1001410256	5	6,828.00	110.00	23,777.72	-	-			30,715.72	35,517.88	31,061.22	30,715.72	345.50	31,061.22
10	09007C1001410270	5	6,828.00	110.00	23,777.72	-	953.00			31,668.72	35,517.88	7,471.12	7,471.12	-	7,471.12
11	09007C1001410273	5	6,828.00	110.00	23,777.72	-	953.00			31,668.72	35,517.88	38,995.03	30,605.72	8,389.31	38,995.03
12	09007C1001410334	5	6,828.00	110.00	23,777.72	-	952.00			31,667.72	35,517.88	13,702.47	13,702.47	-	13,702.47
13	09007C1001410350	5	6,828.00	110.00	23,777.72	48,003.70	532.00			79,251.42	-	13,465.58	13,465.58	-	13,465.58
14	09007C1001410367	5	6,828.00	110.00	23,777.72	-	952.00			31,667.72	35,517.88	8,660.77	8,660.77	-	8,660.77
15	09007C1001410385	5	6,828.00	110.00	23,777.72	50,898.16	-	87.80		81,701.68	-	12,730.84	12,730.84	-	12,730.84
16	09007C1001410404	5	6,828.00	214.60	23,777.72	51,180.54	952.00	87.80		83,040.66	-	26,583.43	26,583.43	-	26,583.43
17	09007C1001410512	7	8,304.00	110.00	22,535.84	41,504.89	1,000.00	87.80		73,542.53	-	10,243.64	10,243.64	-	10,243.64
18	09007C1001410539	9	8,304.00	110.00	23,088.36	39,781.93	610.00	87.80		71,982.09	-	37,206.27	37,206.27	-	37,206.27
19	09007C1001410626	11	6,828.00	110.00	22,955.22	-	1,000.00	83.80		30,977.02	38,311.00	63,625.12	29,893.22	33,731.90	63,625.12
20	09007C1001410638	11	6,828.00	110.00	22,955.22	-	1,000.00	83.80		30,977.02	38,311.00	105,364.75	29,893.22	38,311.00	68,204.22
21	09007C1001410651	11	6,828.00	110.00	22,955.22	-	1,000.00	83.80		30,977.02	38,311.00	47,211.49	29,893.22	17,318.27	47,211.49
22	09007C1001410655	11	6,828.00	110.00	22,955.22	-	1,000.00	83.80		30,977.02	38,311.00	15,370.25	15,370.25	-	15,370.25
23	09007C1001410664	11	6,828.00	110.00	22,955.22	38,311.00	-	83.80		68,288.02	-	26,470.28	26,470.28	-	26,470.28
24	09007C1001410739	11	6,828.00	110.00	22,955.22	-	1,000.00	83.80		30,977.02	38,311.00	19,611.91	19,611.91	-	19,611.91
25	09007C1001410790	11	6,828.00	110.00	22,955.22	38,311.00	1,000.00			69,204.22	-	9,342.48	9,342.48	-	9,342.48
26	09007C1001410814	11	6,828.00	214.60	22,955.22	38,311.00	1,000.00		145.00	69,453.82	-	60,148.32	60,148.32		60,148.32
27	09007C1001410826	11	6,828.00	214.60	22,955.22	38,311.00	1,000.00		800.00	70,108.82	-	18,606.12	18,606.12		18,606.12
28	09007C1001410827	11	6,828.00	214.60	22,955.22	38,311.00	1,000.00		800.00	70,108.82	-	13,985.79	13,985.79		13,985.79
29	09007C1001410832	11	6,828.00	214.60	22,955.22	38,311.00	1,000.00		800.00	70,108.82	-	15,726.49	15,726.49		15,726.49
	รวม		219,045.00	4,026.80	669,212.02	617,721.37	20,678.00	854.00	2,545.00	1,534,082.19	499,378.28	1,142,695.30	806,637.53	161,806.14	968,443.67

17.9 ขออนุมัติปรับแผนงาน ครั้งที่ 7 โดยขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานจากเดือนกันยายน 2560 เป็นเดือนกันยายน 2561 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นชอบให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดือนกันยายน 2560 เป็นเดือนกันยายน 2561 และเห็นชอบในหลักการให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ โดยใช้เงินคงเหลือจากการดำเนินงานรายการเดิมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 45 แห่ง เพื่อไปดำเนินการในพื้นที่ใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2793 1047 โทรสาร 0 2793 1037

ที่ 05/ 1456 **วันที่** 29 ส.ค. 2561

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

1. สพบ. ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามบันทึกข้อความ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ 05/64 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง การขยายเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) โดยขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิมเป็นเดือนกันยายน ปี 2560

2. หนังสือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1400/ว150 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

3. ใบเสนองาน ส่วนประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขรับ 2556 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ซึ่งรวมรายการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการที่มีแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการดำเนินงาน สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562) โดยเห็นควรให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เสร็จตามแผนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนดไว้

ข้อเท็จจริง

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กนช. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานจากเดือนกันยายน 2560 เป็นเดือนกันยายน 2561 และเห็นชอบในหลักการให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

/โดยให้ใช้เงิน...

โดยให้ใช้เงินคงเหลือจากการดำเนินงานรายการเดิมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 45 แห่ง งบประมาณ 7,201,151.18 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) และสำนักงบประมาณได้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและจัดสรรรหัสงบประมาณสำหรับพื้นที่เปลี่ยนแปลง 45 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/2541 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

2. เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ได้รับอนุมัติ สพบ. มีความประสงค์จะขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามรายละเอียดดังนี้

1) แผนปฏิบัติงาน ขยายระยะเวลาจากเดิม เป็นเดือนกันยายน ปี 2561 (เอกสารแนบ 1)

2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 2)

3) แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการจำนวน 45 แห่ง (เอกสารแนบ 3 และ 4)

4) แผนการจัดสรรงบประมาณ แผนโอนจัดสรรงบประมาณ กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ (เอกสารแนบ 5 และ 6)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

2. มอบหมาย สพบ. /กผ./ สบก.(สพ., สค.)/ สทบ.1-12 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การปรับแผนดังกล่าว ไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป และยังอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(นายกุศล โชติรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนบ 1

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงานเดิม										แผนปฏิบัติงานใหม่															
					พ.ศ.2558	ปีงบประมาณ พ.ศ.2559				ปีงบประมาณ พ.ศ.2560				รวม	พ.ศ.2558	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560	พ.ศ.2561												รวม
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง																									14,037,900
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ																									89,200,000
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด																									37,797,500
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ																									37,222,570
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง																									50,398,000
6	สูบทดสอบบริมาณน้ำ (Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ																									7,492,800
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง																									1,204,200
8	ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง																									579,800
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	410,320,000	892	แห่ง																									410,320,000
10	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง																									21,460,830
11	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	38,802,000	892	แห่ง																									38,802,000
12	ค่าเดินการทางพัสดุ	178,400		บาท																									178,400
13	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง	2,676,000		บาท																									2,676,000
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,230,000	892	แห่ง																									2,230,000
	รวม	713,600,000		บาท	28,891,900	550,684,250	41,860,000	0	0	19,212,000	200,718,000	197,068,830	60,688,770	1,099,123,750	28,891,900	190,539,000	256,659,400								56,158,343	10,862,775	18,253,662	152,234,920	713,600,000

หมายเหตุ : ปรับแผน ขยายระยะเวลาดำเนินการเป็น กันยายน 2561

เอกสารแนบ 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบ 713,600,000 บาท รายการ แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				รวมทั้งสิ้น
								มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	14,037,900	892	แห่ง	2,416,000	10,900,720					721,180	14,037,900
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	89,200,000	892	บ่อ	26,299,900	51,624,580					11,275,520	89,200,000
3	เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	37,797,500	892	ชุด		37,679,610					117,890	37,797,500
4	วัสดุท่อและอุปกรณ์	37,222,570	892	บ่อ		30,522,770					6,699,800	37,222,570
5	ท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	50,398,000	892	แห่ง		29,914,770					20,483,230	50,398,000
6	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	7,492,800	892	บ่อ		5,369,000					2,123,800	7,492,800
7	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,204,200	892	ตัวอย่าง		1,140,400					63,800	1,204,200
8	ป้ายปากบ่อน้ำบาดาล	579,800	892	แห่ง		403,650					176,150	579,800
9	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	410,320,000	892	แห่ง		10,808,100	218,700,200	56,158,343	10,862,775	18,253,662	95,536,920	410,320,000
10	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	21,460,830	892	แห่ง		10,362,000	2,731,000				8,367,830	21,460,830
11	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	38,802,000	892	แห่ง			33,193,800				5,608,200	38,802,000
12	ดำเนินการทางพัสดุ	178,400		บาท	76,000	102,400						178,400
13	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง	2,676,000		บาท	100,000	986,000	1,590,000					2,676,000
14	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	2,230,000	892	แห่ง		725,000	444,400				1,060,600	2,230,000
	รวม	713,600,000		บาท	28,891,900	190,539,000	256,659,400	56,158,343	10,862,775	18,253,662	152,234,920	713,600,000

หมายเหตุ : ปรับแผน ขยายระยะเวลาดำเนินการเป็น กันยายน 2561

เอกสารแนบ 3

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ	จำนวน	หน่วยนับ	พ.ศ.2561												
					พ.ศ.2561												รวม
					ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	520,200.00	45	แห่ง													520,200.00
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	3,599,761.30	45	บ่อ													3,599,761.30
3	สูบทดสอบปริมาณน้ำ (Pumping Test)	328,000.00	45	บ่อ													328,000.00
4	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล		45	แห่ง													
5	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	850,549.19	45	แห่ง													850,549.19
6	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	1,680,111.60	45	แห่ง													1,680,111.60
7	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสาร ประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง	120,108.86	45	แห่ง													120,108.86
8	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	102,420.23	45	แห่ง													102,420.23
	รวม	7,201,151.18		บาท												7,201,151.18	7,201,151.18

หมายเหตุ : ขยายระยะเวลาดำเนินงานเป็นก้นยายน 2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1	สำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	520,200.00	45	แห่ง	520,200.00	520,200.00
2	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 150 มม.	3,599,761.30	45	บ่อ	3,599,761.30	3,599,761.30
3	สูบทดสอบปริมาณน้ำ(Pumping Test)	328,000.00	45	บ่อ	328,000.00	328,000.00
4	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	850,549.19	45	แห่ง	850,549.19	850,549.19
5	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	1,680,111.60	45	แห่ง	1,680,111.60	1,680,111.60
6	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงานจ้างเหมา	120,108.86	45	แห่ง	120,108.86	120,108.86
7	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	102,420.23	45	แห่ง	102,420.23	102,420.23
	รวม	**7,201,151.18**		**บาท**	**7,201,151.18**	**7,201,151.18**

หมายเหตุ : ขยายระยะเวลาดำเนินงานเป็นกันยายน 2561

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบลงทุน รายการแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน	กิจกรรม								รวมเป็นเงิน
	จำนวนบ่อ	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	
สทบ.2 (สุพรรณบุรี)	2	25,800.00	165,000.00	16,000.00	18,015.00	87,000.00	4,010.26	5,000.00	320,825.26
สทบ.3 (สระบุรี)	1				5,000.00		2,000.00	2,420.23	9,420.23
สทบ.4 (ขอนแก่น)	2								0.00
สทบ.5 (นครราชสีมา)	18				287,763.75	727,111.60	35,598.60	45,000.00	1,095,473.95
สทบ.6 (ตรัง)	2								0.00
สทบ.7 (กำแพงเพชร)	1								0.00
สทบ.9 (ระยอง)	1				20,965.00	43,500.00	2,000.00	2,500.00	68,965.00
สทบ.10 (อุดรธานี)	1				21,265.00		2,000.00	2,500.00	25,765.00
สทบ.11 (อุบลราชธานี)	17	262,800.00	1,670,000.00	136,000.00	492,803.02	735,500.00	34,000.00	42,500.00	3,373,603.02
รวมเขต	**45**	**288,600.00**	**1,835,000.00**	**152,000.00**	**845,811.77**	**1,593,111.60**	**79,608.86**	**99,920.23**	**4,894,052.46**
สพบ.		231,600.00	1,764,761.30	176,000.00	4,737.42	87,000.00	40,500.00	2,500.00	2,307,098.72
รวม	**45**	**520,200.00**	**3,599,761.30**	**328,000.00**	**850,549.19**	**1,680,111.60**	**120,108.86**	**102,420.23**	**7,201,151.18**

หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง

แผ่นที่ 1/2

รายละเอียดแผนการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการ แผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 45 รายการ (กรณี ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ)

กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	สถานที่ตั้ง					สทน.เขต	กิจกรรม สำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล																รวมทั้งสิ้น
								1 สำรวจธรณีฟิสิกส์/ขุดทดรูณี		2 ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.		3 ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ		4 ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า		5 ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล		6 ค่าจัดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์		7 ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงาน ก่อสร้าง/ค่าตรวจรับงาน		
		สถานที่ใหม่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		สทน.เขต	สทน.	สทน.เขต	สทน.	สทน.เขต	สทน.	สทน.เขต	สทน.	สทน.เขต	สทน.	สทน.เขต	สทน.	สทน.เขต	สทน.		
1	0907/C1001410941	บ้านประดับละศิริ	6	นาขอม	ไพศาลี	นครสวรรค์	2	10,000.00		65,000.00		8,000.00		5,000.00		43,500.00		2,010.26		2,500.00		136,010.26
2	0907/C1001410942	บ้านคลัง	7	บ้านคลัง	บางมัน	พระนครศรีอยุธยา	2	15,800.00		100,000.00		8,000.00		13,015.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		185,815.00
3	0907/C1001410943	บ้านโคกประ	7	โคกประ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	3		10,000.00		63,000.00		8,000.00	5,000.00				2,000.00		2,420.23		90,420.23
4	0907/C1001410944	บ้านหนองแจงใหม่	3	สำราญใต้	สามชัย	กาฬสินธุ์	4				57,932.55											57,932.55
5	0907/C1001410945	บ้านหนองป่าอ้อย	1	สำห้วยหลัว	ฆมเล็ง	กาฬสินธุ์	4				60,018.80											60,018.80
6	0907/C1001410946	บ้านปลักพัฒนา	9	ประทัดบุ	ประสาท	สุรินทร์	5		10,000.00		68,335.00		8,000.00	21,665.00		40,007.20		1,598.60	1,000.00	2,500.00		153,105.80
7	0907/C1001410947	บ้านคยาง	10	ผักไหม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	5		10,000.00		70,873.60		8,000.00	21,665.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		156,045.80
8	0907/C1001410948	บ้านโคกสนบุรณ์	4	ศรีสุข	สำโรงทาบ	สุรินทร์	5		10,000.00		75,966.60		8,000.00	21,665.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		161,138.80
9	0907/C1001410969	บ้านขนม	3	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		85,149.10		8,000.00	21,665.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		170,321.30
10	0907/C1001410950	บ้านดินแดง	13	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,270.00		40,006.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,860.60
11	0907/C1001410951	บ้านขนาดแออยู่ใต้	16	ตาตุม	สังขะ	สุรินทร์	5		10,000.00		65,286.60		8,000.00	21,665.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		150,458.80
12	0907/C1001410952	บ้านดงแดง	14	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	10,685.00		40,006.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,278.40
13	0907/C1001410953	บ้านโพนแดน	7	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	10,685.00		40,006.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,278.40
14	0907/C1001410954	บ้านบัวโคก	1	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,090.00		40,006.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,683.40
15	0907/C1001410955	บ้านผางเก่า	6	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,285.00		40,010.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,881.60
16	0907/C1001410956	บ้านอาพัก	4	บ้านอ้อ	จอมพระ	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,415.00		40,002.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		136,004.40
17	0907/C1001410957	บ้านด้อ	5	หนองยะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,815.00		40,006.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		136,408.40
18	0907/C1001410958	บ้านหนองบริอ	10	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	5		10,000.00		64,086.60		8,000.00	15,695.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		146,781.60
19	0907/C1001410959	บ้านหนองพิมานใต้	8	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	10,665.00		40,010.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,261.60
20	0907/C1001410960	บ้านกลองตุง	11	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	5		10,000.00		67,283.60		8,000.00	10,878.75		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		141,671.55
21	0907/C1001410961	บ้านหนองม่วง	7	ยายเผือวัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	5		10,000.00		67,803.75		8,000.00	21,665.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		156,468.75
22	0907/C1001410962	บ้านหนองเพียก	5	สลวด	ชำนิ	บุรีรัมย์	5		10,000.00		65,831.55		8,000.00	20,885.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		150,223.75
23	0907/C1001410963	บ้านหนองตะเคียน	8	สุมปุก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5		10,000.00		66,783.55		8,000.00	21,405.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		151,695.75
24	0907/C1001410964	บ้านยางด้วน	7	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	6				58,308.30											58,308.30
25	0907/C1001410965	บ้านควนโถ	10	แหลม	ทัวไทร	นครศรีธรรมราช	6				59,406.90											59,406.90
26	0907/C1001410966	บ้านไตร้งใต้	5	ห้วยร่วม	ตะเข้ราย	พิจิตร	7		10,000.00		80,000.00		8,000.00		4,737.42		43,500.00		2,500.00		2,500.00	151,237.42
27	0907/C1001410967	บ้านสะพ้อน	4	ขันพยอม	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	9		15,800.00		100,000.00		8,000.00	20,965.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		193,765.00
28	0907/C1001410968	บ้านเหล่าเงิน	10	เหล่าทอง	โพธิ์ศัย	ร้อยเอ็ด	10		15,800.00		100,000.00		8,000.00	21,265.00			43,500.00	2,000.00	1,000.00	2,500.00		194,065.00
29	0907/C1001410969	บ้านมือ	9	นาสีเจ	มังสามสิบ	อุบลราชธานี	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
30	0907/C1001410970	บ้านนาห่อม	9	หนองขาม	มังสามสิบ	อุบลราชธานี	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
31	0907/C1001410971	บ้านหนองนกเขียน	2	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
32	0907/C1001410972	บ้านสะอาดสมัคคี	3	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
33	0907/C1001410973	บ้านตาลุ	6	ไผ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
34	0907/C1001410974	บ้านจำนะกลาง	10	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
35	0907/C1001410975	บ้านสว่าง	6	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
36	0907/C1001410976	บ้านราษีพัฒนา	2	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
37	0907/C1001410977	บ้านหนองผักไหม	15	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
38	0907/C1001410978	บ้านใบเสาวัลย์	18	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
39	0907/C1001410979	บ้านระยอม	9	ปลายาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
40	0907/C1001410980	บ้านน้ำอ้อยพัฒนา	14	ปลายาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
41	0907/C1001410981	บ้านตาหวด	16	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
42	0907/C1001410982	บ้านตอนชุมป่าชาง	20	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
43	0907/C1001410983	บ้านชุมค่า	22	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
44	0907/C1001410984	บ้านหนองแม	8	คู	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	11	10,000.00		70,000.00		8,000.00		26,163.02		39,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		159,163.02
45	0907/C1001410985	บ้านหนองกระดัน	8	ควนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
รวมทั้งสิ้น								288,600.00	231,600.00	1,835,000.00	1,764,761.30	152,000.00	176,000.00	845,811.77	4,737.42	1,593,111.60	87,000.00	79,608.86	40,500.00	99,920.23	2,500.00	7,901,151.18

แผ่นที่ 2/2

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) รายละเอียดโครงการ

ต่อมาสำนักงบประมาณได้โอนเปลี่ยนแปลงรายการและจัดสรรรหัสงบประมาณใหม่สำหรับพื้นที่เปลี่ยนแปลง 45 แห่ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สำหรับพื้นที่เปลี่ยนแปลง จำนวน 45 แห่ง

ที่ นร 0701/ 2541

ถึง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักงบประมาณขอส่ง

	งวดที่	ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	ลงวันที่
1. ใบโอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	.....	.....	4063	22 ส.ค. 2561
2. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	2	6,7	8463, 8464	22 ส.ค. 2561
3. รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	2	6,7	8463, 8464	22 ส.ค. 2561

มาเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. 0 2273 9223

โทรสาร 0 2618 5217

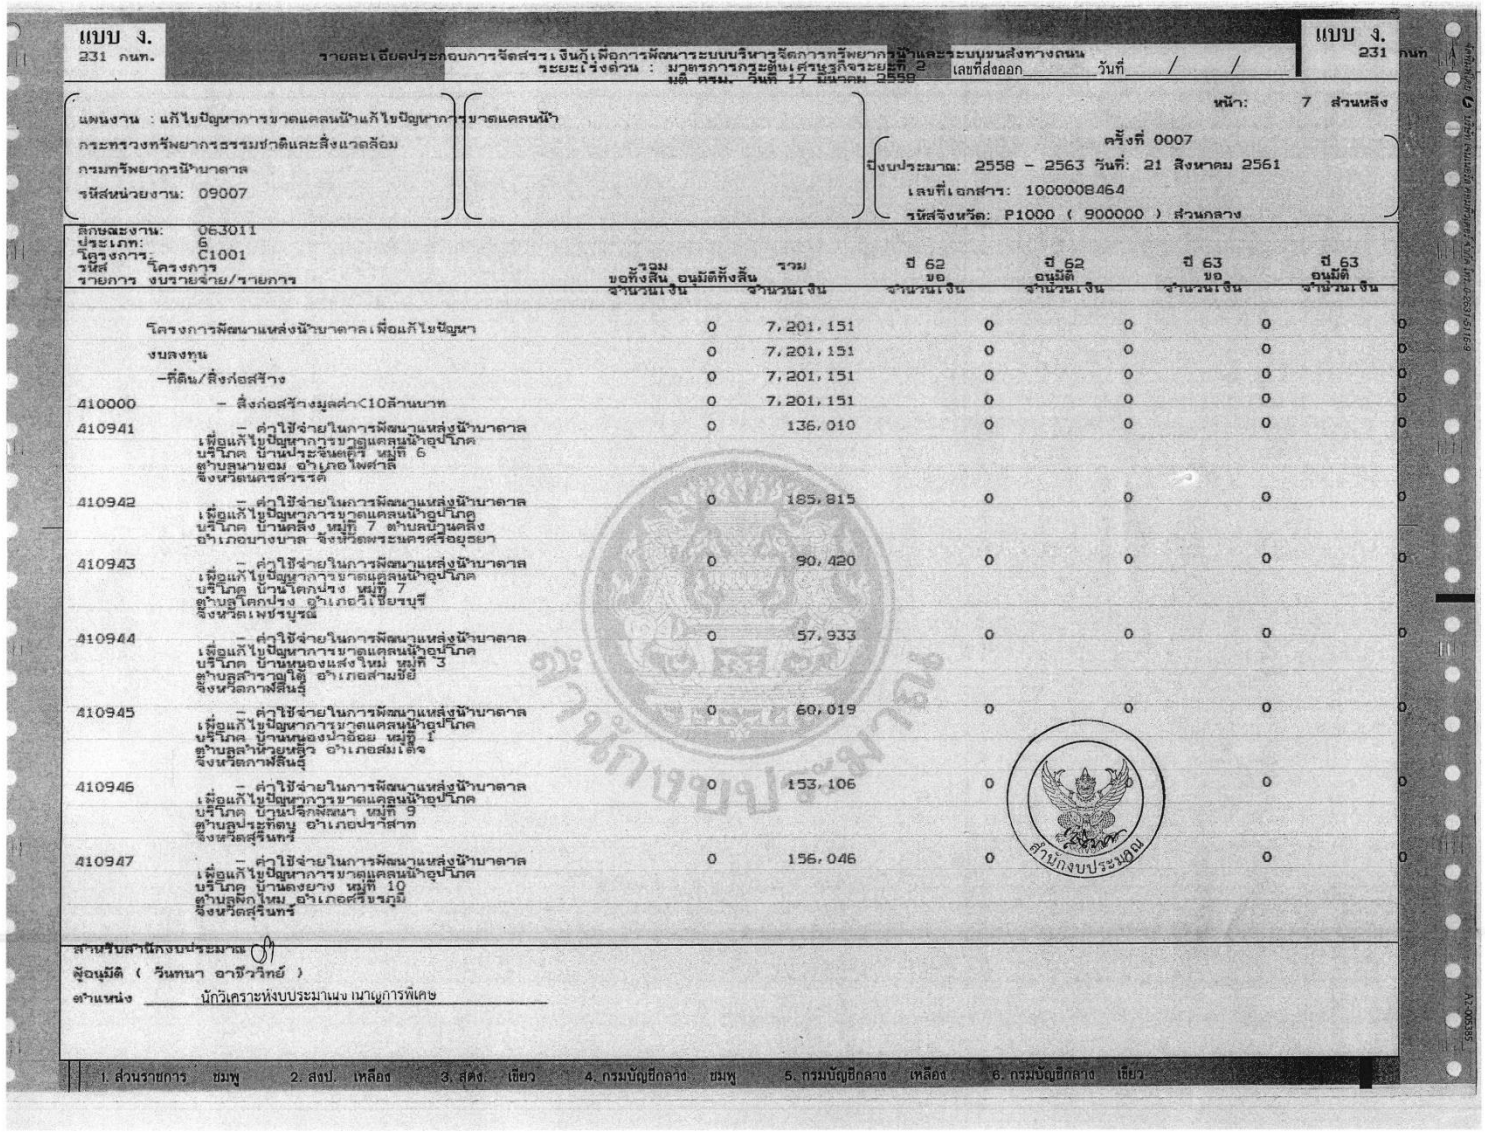

แบบ จ. 231 กนท.

รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน
ระยะไร่ง่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 เลขที่ส่งออก วันที่ / /
มติ ครม. วันที่ 17 มีนาคม 2558

แบบ จ. 231 กนท

หน้า: 7 ส่วนหลัง

แผนงาน : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยงาน: 09007

ครั้งที่ 0007
ปีงบประมาณ: 2558 - 2563 วันที่: 21 สิงหาคม 2561
เลขที่เอกสาร: 1000008464
รหัสจังหวัด: P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะงาน: 063011
ประเภท: 6
โครงการ: C1001

รหัสรายการ	โครงการ งบรายจ่าย/รายการ	รวมขอทั้งสิ้น จำนวนเงิน	รวมอนุมัติทั้งสิ้น จำนวนเงิน	ปี 62 ขอ จำนวนเงิน	ปี 62 อนุมัติ จำนวนเงิน	ปี 63 ขอ จำนวนเงิน	ปี 63 อนุมัติ จำนวนเงิน	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหา	0	7,201,151	0	0	0		0
	งบลงทุน	0	7,201,151	0	0	0		0
	-ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0	7,201,151	0	0	0		0
410000	- สิ่งก่อสร้างมูลค่า<10ล้านบาท	0	7,201,151	0	0	0		0
410941	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านประจันตคีรี หมู่ที่ 6 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	0	136,010	0	0	0		0
410942	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านคลัง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	185,815	0	0	0		0
410943	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านใตกปาง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	0	90,420	0	0	0		0
410944	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านหนองแส่งใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	0	57,933	0	0	0		0
410945	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านหนองบ่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	0	60,019	0	0	0		0
410946	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านปรีกพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	0	153,106	0	0	0		0
410947	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านดงยาง หมู่ที่ 10 ตำบลผักไหม อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	0	156,046	0	0	0		0

สำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (วันทนา อาชีววิทย์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

1. ส่วนราชการ ชมพู 2. สงป. เหลือง 3. สคง. เขียว 4. กรมบัญชีกลาง ชมพู 5. กรมบัญชีกลาง เหลือง 6. กรมบัญชีกลาง เขียว

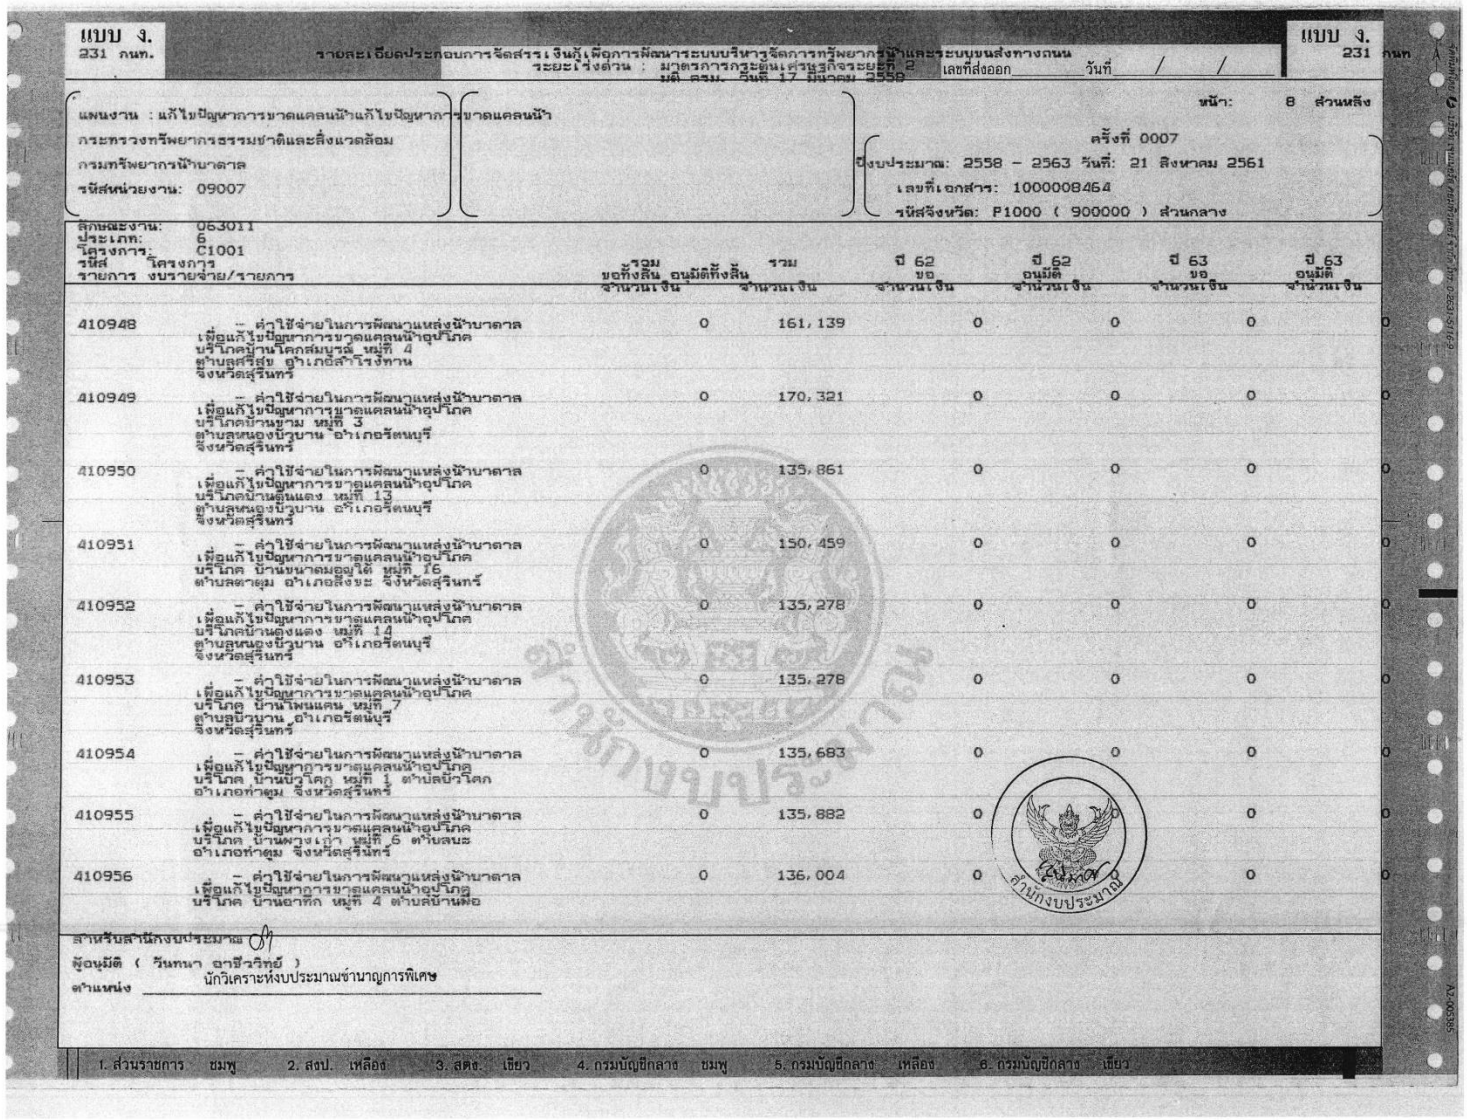

แบบ จ.
231 กนท.

รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 เลขที่ส่งออก วันที่ / /
มติ ครม. วันที่ 17 มีนาคม 2559

แบบ จ.
231 กนท

แผนงาน : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยงาน: 09007

หน้า: 8 ส่วนหลัง
ครั้งที่ 0007
ปีงบประมาณ: 2558 – 2563 วันที่: 21 สิงหาคม 2561
เลขที่เอกสาร: 1000008464
รหัสจังหวัด: P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะงาน: 063011
ประเภท: 6
โครงการ: C1001

รหัส	โครงการ รายการ งบรายจ่าย/รายการ	รวม ขอทั้งสิ้น จำนวนเงิน	รวม อนุมัติทั้งสิ้น จำนวนเงิน	ปี 62 ขอ จำนวนเงิน	ปี 62 อนุมัติ จำนวนเงิน	ปี 63 ขอ จำนวนเงิน	ปี 63 อนุมัติ จำนวนเงิน	
410948	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	0	161,139	0	0	0		0
410949	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคบ้านขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	0	170,321	0	0	0		0
410950	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคบ้านตูมแดง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	0	133,861	0	0	0		0
410951	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนามอูโต๊ หมู่ที่ 16 ตำบลตาอุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0	150,459	0	0	0		0
410952	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคบ้านดูงแดง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	0	135,278	0	0	0		0
410953	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านโพนแคน หมู่ที่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	0	135,278	0	0	0		0
410954	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0	135,683	0	0	0		0
410955	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านพวงเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลนอ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0	135,882	0	0	0		0
410956	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านอาทึก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพือ	0	136,004	0	0	0		0

สำหรับสำนักงบประมาณ
ผู้อนุมัติ (วันทนา อาชีวิทย์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

1. ส่วนราชการ ชมพู 2. สงป. เหลือง 3. สตง. เขียว 4. กรมบัญชีกลาง ชมพู 5. กรมบัญชีกลาง เหลือง 6. กรมบัญชีกลาง เขียว

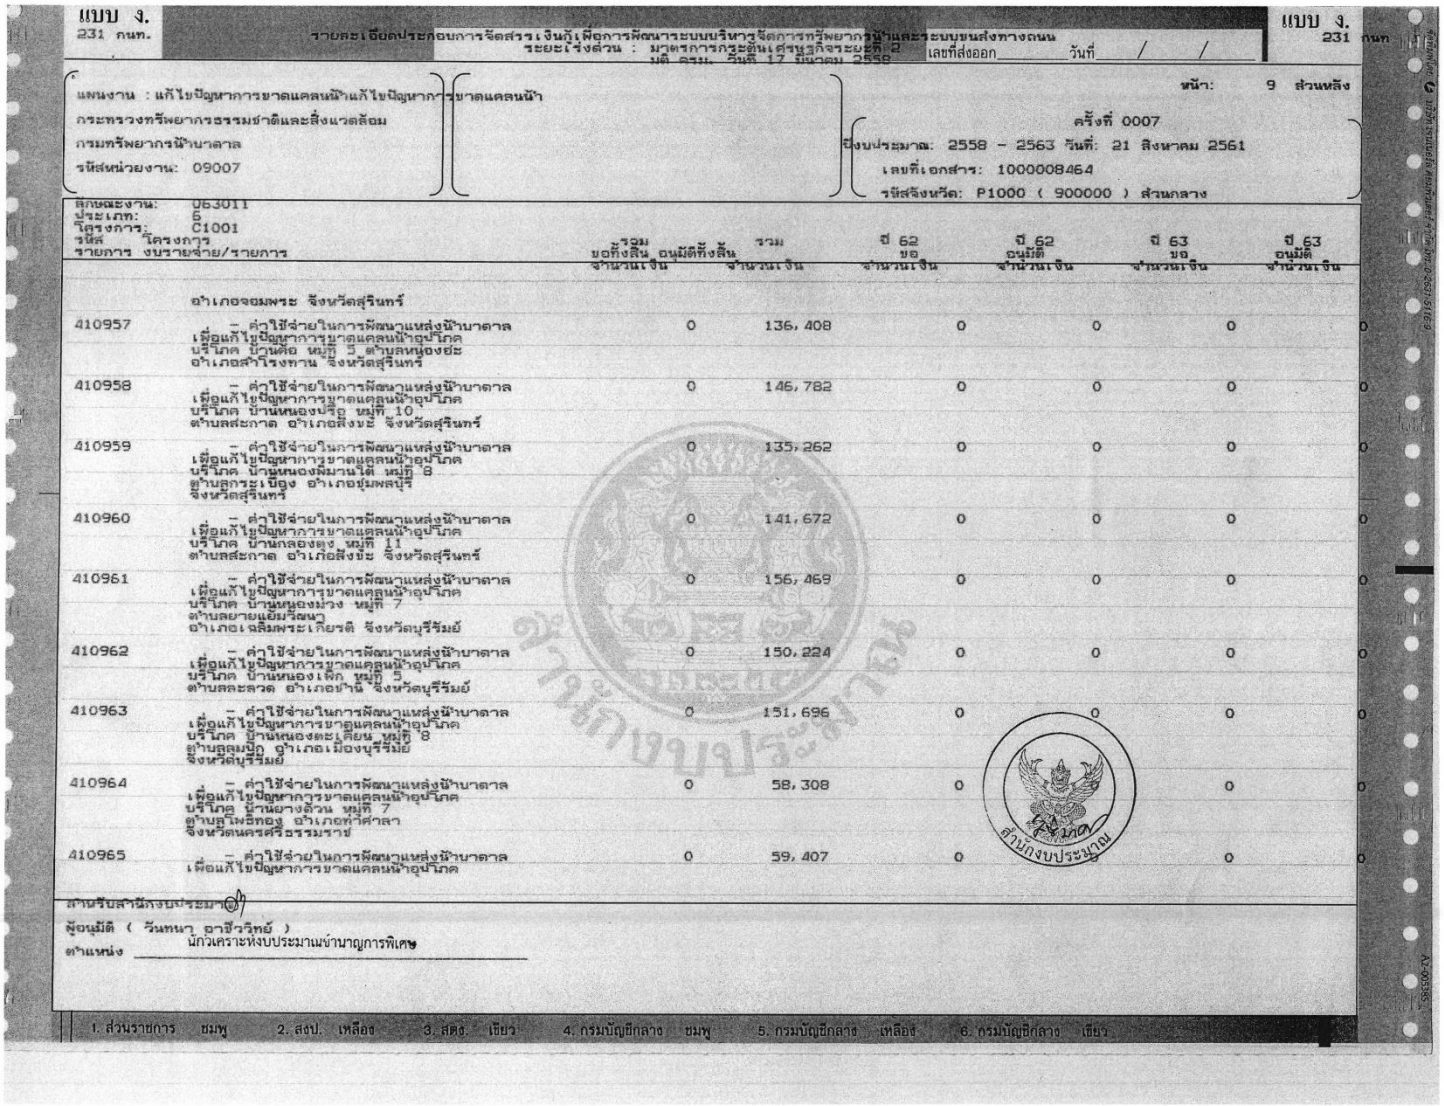

แบบ จ.
231 กนท.

รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
มติ ครม. วันที่ 17 มีนาคม 2558

เลขที่ส่งออก_____วันที่____/____/____

แบบ จ.
231 กนท

หน้า: 9 ส่วนหลัง

แผนงาน : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยงาน: 09007

ครั้งที่ 0007
ปีงบประมาณ: 2558 – 2563 วันที่: 21 สิงหาคม 2561
เลขที่เอกสาร: 1000008464
รหัสจังหวัด: P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะงาน: U63011
ประเภท: 6
โครงการ: C1001

รหัส	โครงการ รายการ งบรายจ่าย/รายการ	รวม ขอทั้งสิ้น จำนวนเงิน	รวม อนุมัติทั้งสิ้น จำนวนเงิน	ปี 62 ขอ จำนวนเงิน	ปี 62 อนุมัติ จำนวนเงิน	ปี 63 ขอ จำนวนเงิน	ปี 63 อนุมัติ จำนวนเงิน	
	อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์							
410957	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านตือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยาง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	0	136,408	0	0	0		0
410958	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 10 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0	146,782	0	0	0		0
410959	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนองพิมานได้ หมู่ที่ 8 ตำบลลูกระเนียง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	0	135,262	0	0	0		0
410960	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านกลองตุง หมู่ที่ 11 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	0	141,672	0	0	0		0
410961	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลสายตะเมาว์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	0	156,469	0	0	0		0
410962	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนองเต็ก หมู่ที่ 5 ตำบลละลวด อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	0	150,224	0	0	0		0
410963	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลลุมปุก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	151,696	0	0	0		0
410964	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค บ้านยางด้วน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	58,308	0		0		0
410965	– ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค	0	59,407	0		0		0

สำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (วันทนา ฉายชีวรินทร์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

1. ส่วนราชการ ชมพู 2. สงป. เหลือง 3. สตง. เขียว 4. กรมบัญชีกลาง ชมพู 5. กรมบัญชีกลาง เหลือง 6. กรมบัญชีกลาง เขียว

สำนักงบประมาณ

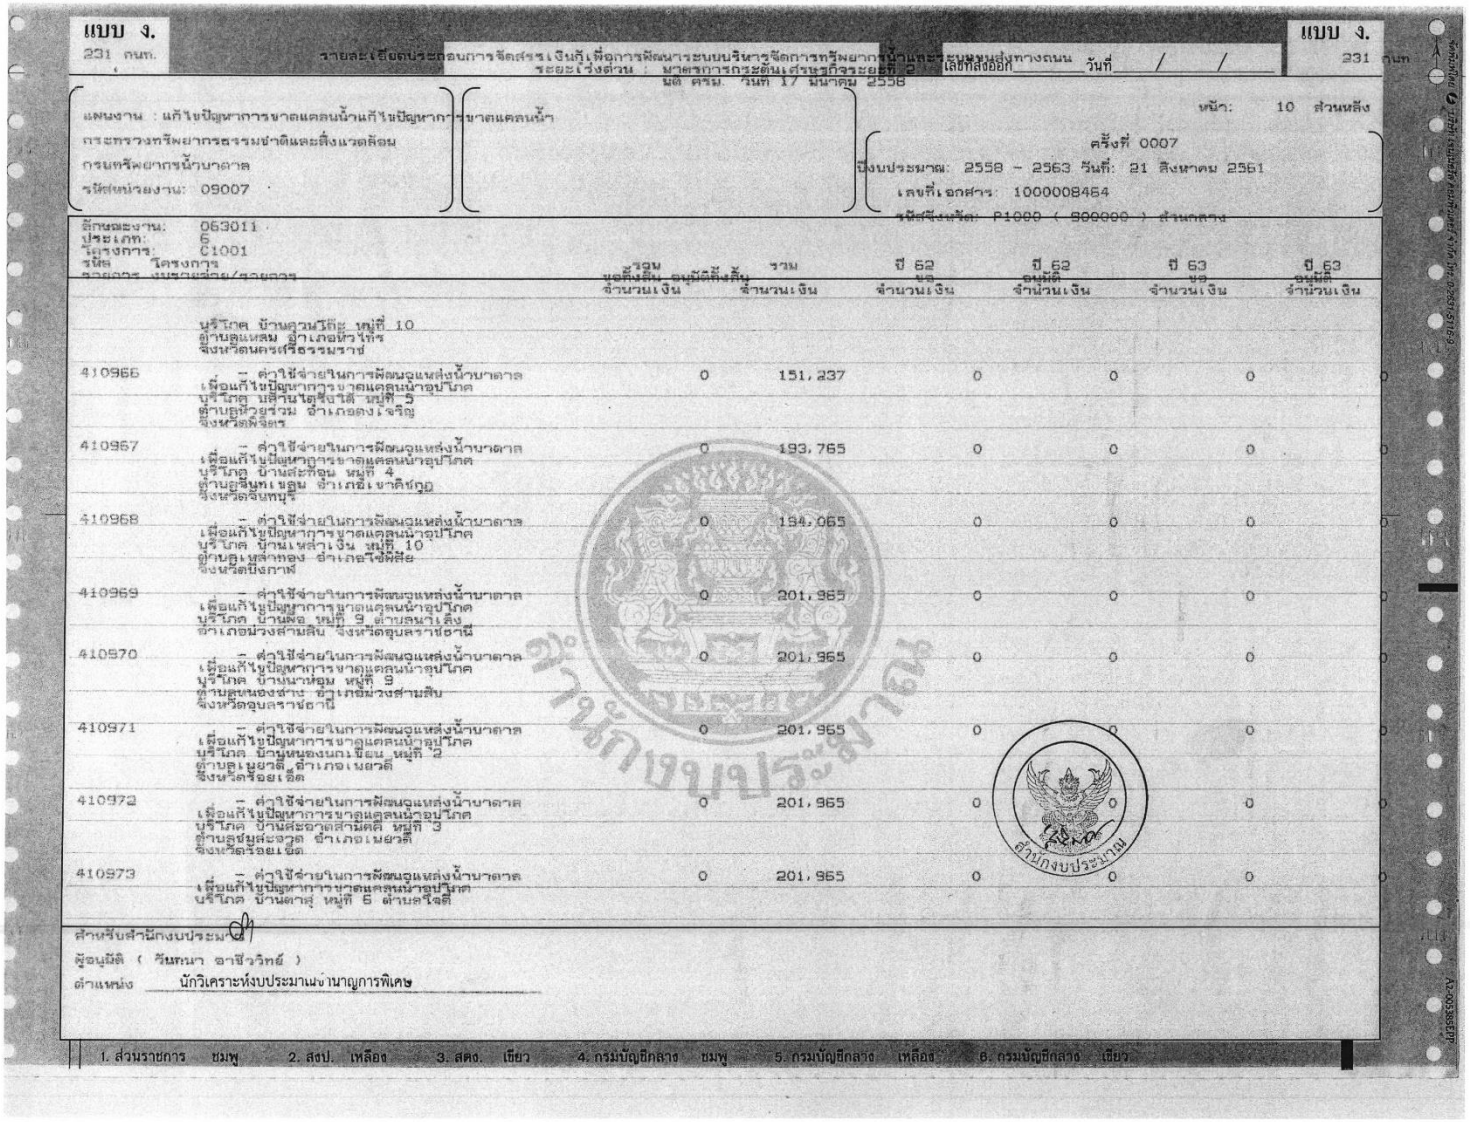

แบบ จ.
231 กนท.

รายละเอียดประกอบการจัดสรรเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบคมนาคมทางถนน เลขที่สั่งออก วันที่ / /
ระยะเวลาดำเนินการ : ตามการกระทำผูกพันเป็นรายกิจระยะที่ 2
มติ ครม. วันที่ 17 มีนาคม 2558

แบบ จ.
231 กนท

แผนงาน : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รหัสหน่วยงาน: 09007

หน้า: 10 ส่วนหลัง
ครั้งที่ 0007
ปีงบประมาณ: 2558 - 2563 วันที่: 21 สิงหาคม 2561
เลขที่เอกสาร: 1000008454
รหัสจังหวัด: P1000 (999999) ส่วนกลาง

ลักษณะงาน: 063011
ประเภท: 5
โครงการ: C1001

รหัส	โครงการ รายการ งบรายจ่าย/รายการ	รวม ขอตั้งสิ้น จำนวนเงิน	รวม อนุมัติสิ้นสุด จำนวนเงิน	ปี 62 ขอ จำนวนเงิน	ปี 62 อนุมัติ จำนวนเงิน	ปี 63 ขอ จำนวนเงิน	ปี 63 อนุมัติ จำนวนเงิน
	บุรีโกค บ้านควนโก๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลลุโหลน อำเภอทับโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช						
410966	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บุรีโกค บ้านไสขิงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้วยรวม อำเภอตะโจริญ จังหวัดพิจิตร	0	151,237	0	0	0	0
410967	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บุรีโกค บ้านสะตอน หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี	0	193,765	0	0	0	0
410968	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บุรีโกค บ้านเหล่าเจ็น หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	0	194,065	0	0	0	0
410969	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บุรีโกค บ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเส็ง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	0	201,965	0	0	0	0
410970	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บุรีโกค บ้านนาหอม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสำโรง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	0	201,965	0	0	0	0
410971	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บุรีโกค บ้านหนองบกเขียน หมู่ที่ 2 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	0	201,965	0	0	0	0
410972	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บุรีโกค บ้านส้มอวลสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลขุมเงินวงวัด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	0	201,965	0	0	0	0
410973	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บุรีโกค บ้านตาสุ หมู่ที่ 6 ตำบลโจดี	0	201,965	0	0	0	0

สำหรับสำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (วันทนา อาชีววิทย์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

1. ส่วนราชการ ชมพู 2. สงป. เหลือง 3. สคง. เขียว 4. กรมบัญชีกลาง ชมพู 5. กรมบัญชีกลาง เหลือง 6. กรมบัญชีกลาง เขียว

17.10 ขออนุมัติปรับแผนโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ สทบ. เขต 10

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2666 7366 โทรสาร 0 2666 7358

ที่ 05/ 1556 **วันที่** 13 ก.ย. 2561

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ สพบ. ด่วนที่สุด ที่ 05/1456 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) อทบ.อนุมัติ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ข้อเท็จจริง

1. ส่วนการคลังได้โอนจัดสรรงบประมาณ กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการให้ สทบ. เขต 10 อุดรธานี เพื่อดำเนินการในพื้นที่ใหม่ให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 1 แห่ง ในกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 21,265.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) กิจกรรมติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงาน เป็นเงิน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) และกิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน 2,500.00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,765.00 บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

ต่อมา สพบ. ได้รับการประสานจาก สทบ. เขต 10 อุดรธานี ว่าในคราวก่อนไม่ได้แจ้งขอรับการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประสานงานขอรับจัดสรรงบประมาณ จึงมีความประสงค์ขอรับงบประมาณกิจกรรมขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเพิ่มเติม เพื่อนำไปดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

2. เพื่อให้การดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามข้อเท็จจริง 1 สพบ. จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลจากส่วนกลางให้ สทบ. เขต 10 อุดรธานี เป็นเงิน 43,500.00 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สพบ. ได้จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมและแผนการจัดสรรงบประมาณรายแห่ง (กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1,2 และแผนโอนจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติตามข้อเท็จจริง 2
2. มอบหมายให้ สบก.(สค.)/ สพบ./ กผ./ สทบ. เขต 10 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน อพน.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามเสนอ/มอบหมายให้เสนอโรว

(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑ ๗ ก.ย. ๒๕๖๑

(นายกุศล โชติรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

- อนุมัติ
- มอบหมายเสนอตาม ข้อ 2 ต่อไป

(นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑ ๘ ก.ย. ๒๕๖๑

กง.
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางดวงพร จั่นหยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
18 ก.ย. 2561

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบลงทุน รายการแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน	กิจกรรม								รวมเป็นเงิน
	จำนวนบ่อ	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์/อุทกธรณี	ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล	ค่าสูบทดสอบปริมาณน้ำ	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ค่าตรวจรับงาน	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	
สทบ.2 (สุพรรณบุรี)	2	25,800.00	165,000.00	16,000.00	18,015.00	87,000.00	4,010.26	5,000.00	320,825.26
สทบ.3 (สระบุรี)	1				5,000.00		2,000.00	2,420.23	9,420.23
สทบ.4 (ขอนแก่น)	2								0.00
สทบ.5 (นครราชสีมา)	18				287,763.75	727,111.60	35,598.60	45,000.00	1,095,473.95
สทบ.6 (ตรัง)	2								0.00
สทบ.7 (กำแพงเพชร)	1								0.00
สทบ.9 (ระยอง)	1				20,965.00	43,500.00	2,000.00	2,500.00	68,965.00
สทบ.10 (อุดรธานี)	1				21,265.00	43,500.00	2,000.00	2,500.00	69,265.00
สทบ.11 (อุบลราชธานี)	17	262,800.00	1,670,000.00	136,000.00	492,803.02	735,500.00	34,000.00	42,500.00	3,373,603.02
รวมเขต	45	288,600.00	1,835,000.00	152,000.00	845,811.77	1,636,611.60	79,608.86	99,920.23	4,937,552.46
สพบ.		231,600.00	1,764,761.30	176,000.00	4,737.42	43,500.00	40,500.00	2,500.00	2,263,598.72
รวม	45	520,200.00	3,599,761.30	328,000.00	850,549.19	1,680,111.60	120,108.86	102,420.23	7,201,151.18

หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 45 รายการ

กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	สถานที่ตั้ง					สทบ.เขต	กิจกรรม สำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล																รวมทั้งสิ้น
		สถานที่ใหม่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		1 สำรวจธรณีฟิสิกส์/ขุดเกรอี่		2 ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.		3 ค่าสูบทดลองปริมาณน้ำ		4 ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า		5 ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล		6 ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ค่าตรวจรับงาน		7 ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		
								สทบ. เขต	สทบ.	สทบ. เขต	สทบ.	สทบ. เขต	สทบ.	สทบ. เขต	สทบ.	สทบ. เขต	สทบ.	สทบ. เขต	สทบ.	สทบ. เขต	สทบ.	
1	0900?C1001410941	บ้านประจันตะคีรี	6	นายอม	ไพศาลี	นครสวรรค์	2	10,000.00		65,000.00		8,000.00		5,000.00		43,500.00		2,010.26		2,500.00		136,010.26
2	0900?C1001410942	บ้านคลัง	7	บ้านคลัง	บางบาล	พระนครศรีอยุธยา	2	15,800.00		100,000.00		8,000.00		13,015.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		185,815.00
3	0900?C1001410943	บ้านโคกปรง	7	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	3		10,000.00		63,000.00		8,000.00	5,000.00		-		2,000.00		2,420.23		90,420.23
4	0900?C1001410944	บ้านหนองแสงใหม่	3	สำราญใต้	สามัคคี	กาฬสินธุ์	4				57,932.55											57,932.55
5	0900?C1001410945	บ้านหนองป่าอ้อย	1	ลำหัวยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	4				60,018.80											60,018.80
6	0900?C1001410946	บ้านปรือกพัฒนา	9	ประทัดบุ	ปราสาท	สุรินทร์	5		10,000.00		68,335.00		8,000.00	21,665.00		40,007.20		1,598.60	1,000.00	2,500.00		153,105.80
7	0900?C1001410947	บ้านตะยาง	10	ผักไหม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	5		10,000.00		70,873.60		8,000.00	21,665.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		156,045.80
8	0900?C1001410948	บ้านโคกสมบูรณ์	4	ศรีขุน	ลำโรงทาบ	สุรินทร์	5		10,000.00		75,966.60		8,000.00	21,665.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		161,138.80
9	0900?C1001410949	บ้านขาม	3	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		85,149.10		8,000.00	21,665.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		170,321.30
10	0900?C1001410950	บ้านดินแดง	13	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,270.00		40,004.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,860.60
11	0900?C1001410951	บ้านขนาดมะยอใต้	16	ตาคุม	สังขะ	สุรินทร์	5		10,000.00		65,086.60		8,000.00	21,665.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		150,458.80
12	0900?C1001410952	บ้านดงแดง	14	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	10,685.00		40,006.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,278.40
13	0900?C1001410953	บ้านโหนแคน	7	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	10,685.00		40,006.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,278.40
14	0900?C1001410954	บ้านบัวโคก	1	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,090.00		40,006.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,683.40
15	0900?C1001410955	บ้านยางเก่า	6	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,285.00		40,010.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,881.60
16	0900?C1001410956	บ้านอาพึก	4	บ้านมือ	จอมพระ	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,415.00		40,002.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		136,004.40
17	0900?C1001410957	บ้านด้อ	5	หนองสะ	ลำโรงทาบ	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	11,815.00		40,006.80		2,000.00	1,000.00	2,500.00		136,408.40
18	0900?C1001410958	บ้านหนองปรือ	10	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	5		10,000.00		64,086.60		8,000.00	15,695.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		146,781.60
19	0900?C1001410959	บ้านหนองพิมานใต้	8	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	5		10,000.00		61,086.60		8,000.00	10,665.00		40,010.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		135,261.60
20	0900?C1001410960	บ้านกลองดุง	11	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	5		10,000.00		67,285.60		8,000.00	10,878.75		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		141,671.55
21	0900?C1001410961	บ้านหนองม่วง	7	ยายแย้มวัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	5		10,000.00		67,803.75		8,000.00	21,665.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		156,468.75
22	0900?C1001410962	บ้านหนองเฟิก	5	ละลวด	ชำนิ	บุรีรัมย์	5		10,000.00		65,831.55		8,000.00	20,885.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		150,223.75
23	0900?C1001410963	บ้านหนองตะเคียน	8	อุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5		10,000.00		66,783.55		8,000.00	21,405.00		40,007.20		2,000.00	1,000.00	2,500.00		151,695.75
24	0900?C1001410964	บ้านบางตัวน	7	โพธิ์ทอง	ท่าตะโก	นครศรีธรรมราช	6				58,308.30											58,308.30
25	0900?C1001410965	บ้านควนโถ	10	แพงพม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	6				59,406.90											59,406.90
26	0900?C1001410966	บ้านใครังใต้	5	หัวยร่วม	ตะเครียง	สิงห์บุรี	7		10,000.00		80,000.00		8,000.00		4,737.42		43,500.00		2,500.00		2,500.00	151,237.42
27	0900?C1001410967	บ้านสะท้อน	4	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	9		15,800.00		100,000.00		8,000.00	20,965.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		193,765.00
28	0900?C1001410968	บ้านเหล่าเจิน	10	เหล่าทอง	โชคชัย	นิวกาม	10		15,800.00		100,000.00		8,000.00	21,265.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		194,065.00
29	0900?C1001410969	บ้านผือ	9	นาแส้ง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
30	0900?C1001410970	บ้านบาห่อม	9	หนองอาง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
31	0900?C1001410971	บ้านหนองนางเขียน	2	แยยวดี	แยยวดี	ร้อยเอ็ด	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
32	0900?C1001410972	บ้านสะอาดสามัคคี	3	ชมสะอาด	แยยวดี	ร้อยเอ็ด	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
33	0900?C1001410973	บ้านหาสู	6	ไฮดี	ชุมพัน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
34	0900?C1001410974	บ้านข้าแรกลาง	10	หัวยเหนือ	ชุมพัน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
35	0900?C1001410975	บ้านสว่าง	6	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
36	0900?C1001410976	บ้านราษีพัฒนา	2	หัวยสำราญ	ชุมพัน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
37	0900?C1001410977	บ้านหนองผักไหม	15	ทุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
38	0900?C1001410978	บ้านโนนสามัคคี	18	ทรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
39	0900?C1001410979	บ้านขยอม	9	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
40	0900?C1001410980	บ้านน้อยผักหม	14	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
41	0900?C1001410981	บ้านคาควด	16	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
42	0900?C1001410982	บ้านตอนชุมป่ายาง	20	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
43	0900?C1001410983	บ้านชุมค้า	22	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
44	0900?C1001410984	บ้านหนองถ่าน	8	ตู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	11	10,000.00		70,000.00		8,000.00		26,163.02		39,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		159,163.02
45	0900?C1001410985	บ้านหนองกระดิ่น	8	ควนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	11	15,800.00		100,000.00		8,000.00		29,165.00		43,500.00		2,000.00	1,000.00	2,500.00		201,965.00
รวมทั้งสิ้น								288,600.00	231,600.00	1,835,000.00	1,764,761.30	152,000.00	176,000.00	845,811.77	4,737.42	1,636,611.60	43,500.00	79,608.86	40,500.00	99,920.23	2,500.00	7,201,151.18

หมายเหตุ โอนจัดสรรกิจกรรมค่าขุดลึงและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเพิ่มเติม จากส่วนกลาง ให้ สทบ. เขต 10 เป็นเงิน 43,500 บาท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติแผนโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกิจกรรมขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการ แผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 45 รายการ

กรณีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	สถานที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	แผนเดิม					แผนใหม่				
							ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง/ค่าตรวจรับงาน	รวมทั้งสิ้น	ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า	ค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาล	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ค่าตรวจรับงาน	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ/ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
1	09007C1001410968	บ้านเหล่าเงิน	10	เหล่าทอง	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	21,265.00		2,000.00	2,500.00	25,765.00	21,265.00	43,500.00	2,000.00	2,500.00	69,265.00
รวมทั้งสิ้น							21,265.00	-	2,000.00	2,500.00	25,765.00	21,265.00	43,500.00	2,000.00	2,500.00	69,265.00

หมายเหตุ โอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมค่าขุดฝังและวางแนวท่อระบบประปาบาดาลเพิ่มเติม จากส่วนกลาง ให้ สทบ. เขต 10 เป็นเงิน 43,500 บาท

17.11 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน ครั้งที่ 8 โดยขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนโอนจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ไปจนสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562) และอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางได้ดำเนินการยกยอดในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม หนังสือด่วนที่สุด สำนักบริหารกลาง ที่ 01/สค.568 ลว 10 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2666 7368 โทรสาร 0 2666 7380

ที่ 05/183 **วันที่** 22 เมษายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

1. ใบเสนองาน ส่วนประสานการเมือง สร. ทส. เลขรับ 1017 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ของกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ซึ่งรวมรายการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วย โดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการที่มีแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการดำเนินงาน ไปจนสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562) โดยเห็นควรให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. บันทึกข้อความ สบก. สค. ด่วนที่สุด ที่ 01/สค.568 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 สบก. โดยส่วนการคลัง แจ้งว่าได้เรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 และพบว่ากรมบัญชีกลาง ได้ยกยอดในระบบให้เรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

1. สพบ. มีความประสงค์ขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ไปจนสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562) และกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการยกยอดในระบบ GFMIS จำนวน 74 แห่ง วงเงินงบประมาณ 13,614,816.31 บาท รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารแนบ 1 และ 2

2. สพบ. ได้รับการประสานจาก สทบ. เขต 5, และ 12 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าที่โอนจัดสรรให้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินงาน รวมจำนวน 3 แห่ง เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีงบประมาณคงเหลือ รวมเป็นวงเงิน 105,499.84 บาท ประมาณการค่าขยายเขตไฟฟ้า รวมเป็นวงเงิน 242,579.02 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 137,079.18 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

/จึงเห็น...

จึงเห็นควรปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า โดยปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาล, ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์ และค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ จากส่วนกลาง ตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2558 วงเงิน 137,079.18 บาท เพื่อโอนจัดสรรเพิ่มเติมให้ สทบ. เขต 5 และ 12 เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า วงเงิน 137,079.18 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ การปรับลดวงเงินงบประมาณค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์, ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์และค่าก่อสร้างระบบประปาบาดาลนั้น เป็นงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการ ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณแล้ว และการปรับแผนดังกล่าวยังอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการและยังอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

3. เพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในกำหนด เห็นควรพิจารณาขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ตามลำดับ ดังนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อเท็จจริงที่ 1.
2. อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ตามข้อเท็จจริงที่ 2.
3. มอบหมายให้ สบก.(สค.)/ สพบ./ กผ./ สทบ. เขต 5, และ 12 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายมณเฑียร จงจินากูล)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

(นายกุศล โชติรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
23 ก.ค. 2562

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ล่าสุด

ใบเสนองาน
ส่วนประสานการเมือง
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขรับ 5365 วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 09.16 น.
เลขรับ ๑๐๓๗ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

ที่	เรียน	จาก	วันที่
๑.	ทน. ฝ่ายประสานงานรัฐสภาฯ	ณัฐนันท์ ปัญจทรัพย์อุดม	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒
๒.	ผอ. ส่วนประสานการเมือง	ทน. ฝ่ายประสานงานรัฐสภาฯ	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒
๓.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	ผอ. ส่วนประสานการเมือง	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.	เลขานุการ รมว.ทส.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	

เรื่องเดิม

๑. สลค. ขอให้ ทส. เสนอความเห็นเรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ของ กค. เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.

สปคร.ทส. รับที่ 456 เวลา 11.04
รับที่ 26 ก.พ. 2562

๒. กค. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ดังนี้

๒.๑ รับทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการฯ

๒.๒ อนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ของกรมชลประทาน, ทน., กรมทางหลวง, ทบ. และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในส่วนของ ทส. ได้ยกเลิกโครงการของ ทน. วงเงินจำนวน ๖๑.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท และโครงการของ ทบ. วงเงินจำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่าย

๒.๓ เห็นชอบให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๓. ทส. เห็นว่า โครงการที่จะยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ ของกรมทางหลวง โครงการทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ จ.ภูเก็ต ๒ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน EIA นั้น ปัจจุบัน สผ. ยังมิได้รับรายงาน EIA โครงการดังกล่าว ดังนั้น กรมทางหลวงควรตรวจสอบโครงการประเภทอื่นว่าเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่หรือลดข้อขัดแย้งจากการดำเนินโครงการ

ข้อเท็จจริง

ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบ ทั้ง ๓ ข้อ ตามที่ กค. เสนอ และให้ กค. (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ให้ กค. รับความเห็นของ ทส. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. เห็นชอบเป็นหลักการว่า ในการดำเนินโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อให้ กค. (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) นำเงินที่เหลือในบัญชีดังกล่าวส่งคืนคลังต่อไป

ข้อเสนอ ที่ ทส ๐๑๐๑/1232 ลว. 25 ก.พ. 2562

เห็นควรมอบ ปกท.ทส. ดำเนินการต่อไป

ปกท.ทส. ดำเนินการ

(สุดสิงห์ ภาณุรัตน์พันธ์)

(ธรรมนพ ศิริศักดิ์)
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒

3 ก = 120/1

กวด. 64
รับที่ 23 ม.ค. 62
เวลา 14.10 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1296 ศวจ
วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 18.00

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๙๐๗/ว๒๖๖

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๘๘๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๘๕๘๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๗๐๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๕๑๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สรุปโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ กรณีดำเนินการและเบิกจ่ายทันระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. สรุปโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ กรณีดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. ภาพถ่ายหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๗/๑๑๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๘๐๓๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖. ภาพถ่ายหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุดที่ มท ๐๗๑๗/๑๘๓๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗. ภาพถ่ายบันทึกข้อความกรมศุลกากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๑/๑๘๘๐๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/๑๐๑๑๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๙. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๕๘๗๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๐. ภาพถ่ายหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๗/๘๒๑๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
๑๑. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๗๑๔๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๒. ภาพถ่ายบันทึกข้อความกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๐/๒๓๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

/ด้วย...

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (โครงการเงินกู้ฯ) ภายในกรอบวงเงิน ๗๘,๒๙๔.๘๕ ล้านบาท และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน ให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศได้ ตามมาตรา ๒๒ และ ๒๓ ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง ๑)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนฯ) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในวงเงิน ๑๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ (อ้างถึง ๒)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ ประกอบด้วย เงินยืมจากกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. วงเงิน ๑๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๖๕,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท สำหรับแนวทางการชำระคืนเงินยืมกองทุนฯ ให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการคลังขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกองทุนฯ ตามขั้นตอนต่อไป (อ้างถึง ๓)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบและอนุมัติให้กรมศุลกากรกระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๑๙๙.๒๘ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ CCTV ของท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย ระบบ BIOMETRICS และระบบ CCTV เพื่อการควบคุมทางศุลกากรเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงได้ (อ้างถึง ๔)

/๑.๕ มติ...

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับทราบสถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อ และให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ฯ ให้เสร็จสิ้นตามแผนงานของแต่ละโครงการที่กำหนดไว้ โดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะยกเลิกโครงการ ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ไปยังกระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) เพื่อให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (อ้างถึง ๕)

๒. <u>เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี</u>

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

๓. <u>สาระสำคัญและข้อเท็จจริง</u>

๓.๑ สถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

๓.๑.๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) ได้กำหนดไว้ดังนี้

๑) ข้อ ๖ กำหนดให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินกู้ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พิจารณาคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พิจารณาคำขอใช้เงินสำรองจ่ายและพิจารณาคำขอใช้เงินเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว จำนวน ๗๗,๓๕๕.๓๘ ล้านบาท

๒) ข้อ ๑๑ (๒) กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณาจัดหาเงินกู้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดย สบน. ได้ดำเนินการจัดหาเงินสำหรับโครงการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๗๓,๖๗๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน ๕๙,๓๗๕.๐๐ ล้านบาท และเงินยืมกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๒ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการมีผลการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น ๖๙,๔๒๔.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๕ ของวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรร ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๐,๒๕๖.๒๗ ล้านบาท แผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๓๘,๑๗๑.๔๑ ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกรมศุลกากร จำนวน ๙๙๗.๐๖ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/หน่วยงาน ...

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑					
			จำนวนโครงการ				ผลการเบิกจ่าย [๑/]	ร้อยละการเบิกจ่ายต่อวงเงินจัดสรร
			ทั้งหมด	แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้วเสร็จ	จะยกเลิก		
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)								
๑. กรมชลประทาน [๒/]	๒๓,๘๕๖.๓๘	๒๓,๘๒๗.๔๔	๗๖๐	๗๑๖	๔๑	๑	๒๐,๔๖๔.๓๘	๘๕.๘๙
๒. กรมทรัพยากรน้ำ [๓/]	๖,๒๓๙.๑๙	๕,๖๖๑.๙๘	๕๓๔	๕๑๓	๑๐	๗	๔,๗๘๖.๗๔	๘๔.๕๔
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑,๕๗๖.๑๙	๑,๕๗๕.๓๐	๕	๔	๑ [๔/]	๑ แห่ง	๑,๔๓๐.๗๕	๙๐.๘๒
๔. กรมทรัพยากรธรณี	๕.๐๐	๕.๐๐	๑	๑	-	-	๔.๗๗	๙๕.๕๕
๕. กรมควบคุมมลพิษ	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑	-	๑	-	๒๒.๐๕	๘๘.๒๐
๖. กรมอุตุนิยมวิทยา	๒๕๘.๐๑	๒๕๓.๗๖	๒	๒	-	-	๑๘๘.๗๗	๗๔.๓๙
๗. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๗๑๑.๔๕	๖๖๕.๒๑	๑	-	๑	-	๒๗.๕๘	๔.๑๕
๘. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖๓.๒๔	๔๘.๑๔	๓	-	-	๓	-	๐.๐๐
๙. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๖.๕๐	๖.๓๒	๑	๑	-	-	๖.๓๒	๑๐๐.๐๐
๑๐. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๙๕.๐๐	๙๔.๙๙	๑	๑	-	-	๘๔.๐๓	๘๘.๔๖
๑๑. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๔๒๑.๙๕	๔๑๖.๙๓	๖	๔	๒	-	๒๑๒.๕๓	๕๐.๙๗
๑๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๓,๗๒๓.๔๖	๓,๖๑๔.๙๕	๒๑	๑๕	๖	-	๒,๘๔๗.๓๗	๗๘.๗๗
๑๓. กรมแผนที่ทหาร	๖๒๑.๔๗	๖๑๕.๓๘	๓	๒	๑	-	๑๘๐.๙๘	๒๙.๔๑
รวม	**๓๗,๖๐๒.๘๔**	**๓๖,๘๑๐.๔๐**	**๑,๓๓๙**	**๑,๒๕๙**	**๖๓**	**๑๑ โครงการ ๑ แห่ง**	**๓๐,๒๕๖.๒๗**	**๘๒.๑๙**
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน								
๑. กรมทางหลวง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๕๘.๙๒	๘๗๔	๘๗๑	๑	๒	๒๓,๘๐๓.๐๘	๙๕.๓๗
๒. กรมทางหลวงชนบท	๑๔,๔๙๒.๗๓	๑๔,๔๗๒.๐๘	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	-	-	๑๔,๓๖๘.๓๓	๙๙.๒๘
รวม	**๓๙,๔๙๒.๗๓**	**๓๙,๔๓๑.๐๐**	**๒,๖๗๔**	**๒,๖๗๑**	**๑**	**๒**	**๓๘,๑๗๑.๔๑**	**๙๖.๘๑**
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน								
๑. กรมศุลกากร	๑,๑๙๙.๒๘	๑,๑๑๓.๙๘	๑	-	๑	-	๙๙๗.๐๖	๘๙.๕๐
รวม	**๑,๑๙๙.๒๘**	**๑,๑๑๓.๙๘**	**๑**	**-**	**๑**	**-**	**๙๙๗.๐๖**	**๘๙.๕๐**
รวมทั้งสิ้น	**๗๘,๒๙๔.๘๕**	**๗๗,๓๕๕.๓๘**	**๔,๐๑๔**	**๓,๙๓๐ [๕/]**	**๖๕**	**๑๓ โครงการ ๑ แห่ง**	**๖๙,๔๒๔.๗๔**	**๘๙.๗๕**

หมายเหตุ :

[๑/] ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

[๒/] คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ยกเลิกโครงการของกรมชลประทาน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการแก้มลิงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์พร้อมอาคารประกอบ วงเงิน ๔.๖๕ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๑.๐๒ ล้านบาท และโครงการประตูระบายน้ำนบหัก ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน ๒๖.๐๐ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๒๒.๕๘ ล้านบาท

[๓/] คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

- วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลิง บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย วงเงิน ๗.๕๐ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๓.๔๕ ล้านบาท และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหัวควน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล วงเงิน ๙.๘๖ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๙.๘๔ ล้านบาท
- วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสำรวจเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ วงเงิน ๓๕.๐๐ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๓๕.๐๐ ล้านบาท
- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแยกคลองเปรม – ประตูน้ำพระอินทร์ วงเงิน ๑.๙๒ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๑.๘๒ ล้านบาท

[๔/] โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งดำเนินการ ๘๙๒ แห่ง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๔๔ แห่ง ยกเลิกดำเนินการ ๙๑ แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๖ แห่ง และจะขอยกเลิกครั้งนี้ ๑ แห่ง

[๕/] โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓,๙๓๐ โครงการ วงเงินจัดสรร ๖๖,๘๔๔.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๔,๒๐๒.๙๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง จำนวน ๒,๖๔๑.๕๐ ล้านบาท

/๓.๒ การติดตาม...

๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

จากการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๖๕ โครงการ ๑๐ หน่วยงาน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑[๑/]	หน่วยงาน[๒/]
๒.๑ ดำเนินการและเบิกจ่ายทันระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑๕	๒,๕๑๑.๓๙	๖๔๘.๖๓	ชป. คพ. สช. สสนก. ยธ. ผท.
๒.๒ ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดไว้	๕๐	๗,๒๔๖.๗๕	๔,๔๘๖.๖๑	ชป. ทน. ทบ. ยธ. ทล. ศก.
รวมทั้งสิ้น	**๖๕**	**๙,๗๕๘.๑๔**	**๕,๑๓๕.๒๔**	

หมายเหตุ:

[๑/] ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

[๒/] หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน (ชป.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) กรมแผนที่ทหาร (ผท.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมศุลกากร (ศก.)

๓.๒.๑ โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายทันระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว ๖๔๘.๖๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑,๘๖๒.๗๖ ล้านบาท ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑[๑/]	คงเหลือ (จัดสรร - ผลเบิกจ่าย)
๑. กรมชลประทาน[๒/]	๙	๗๙๓.๐๙	๓๓๒.๓๘	๔๖๐.๗๑
๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑	๒๔๒.๓๘	๙๔.๙๐	๑๔๗.๔๘
๓. กรมควบคุมมลพิษ	๑	๒๕.๐๐	๒๒.๐๕	๒.๙๕
๔. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	๖๖๕.๒๑	๒๗.๕๘	๖๓๗.๖๓
๕. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๒	๓๖๕.๗๑	๑๖๑.๓๒	๒๐๔.๓๙
๖. กรมแผนที่ทหาร	๑	๔๒๐.๐๐	๑๐.๔๐	๔๐๙.๖๐
รวมทั้งสิ้น	**๑๕**	**๒,๕๑๑.๓๙**	**๖๔๘.๖๓**	**๑,๘๖๒.๗๖**

หมายเหตุ:

[๑/] ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

[๒/] กรมชลประทานรายงานผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เท่ากับ จำนวน ๓๐๖.๐๔ ล้านบาท และมีแผนจะใช้เงิน จำนวน ๔๘๖.๖๘ ล้านบาท (มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง จำนวน ๐.๓๗ ล้านบาท) โดยกรมชลประทานแจ้งว่าได้เรียกรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ในช่วงเวลาที่ต่างกับกระทรวงการคลัง ทำให้ผลเบิกจ่ายไม่เท่ากัน

/๓.๒.๒ โครงการ...

๓.๒.๒ โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔,๔๘๖.๖๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๒,๗๖๐.๑๔ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายออกไปอีกจากแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางโครงการต้องปรับแบบแปลนก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของประชาชน ทำให้ต้องปรับแก้ไขขอบเขตการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา รวมถึงบางพื้นที่ติดปัญหาน้ำท่วม จึงต้องหยุดงานชั่วคราวตลอดจนบางโครงการที่แล้วเสร็จต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานตามงวดงาน และต้องรอการอนุมัติพิจารณาการคิดค่าปรับก่อนการเบิกจ่าย รวมถึงอยู่ระหว่างขอเบิกค่าประกันผลงาน ทำให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาแผนการดำเนินงานที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

๓.๒.๓ เพื่อให้การดำเนินงานทุกโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กระทรวงการคลังจึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งยืนยันเหตุผลความจำเป็นโครงการที่จะขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีต้นสังกัด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ ๖ หน่วยงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๙) สรุปดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑[๑/]	คงเหลือ (จัดสรร - ผลเบิกจ่าย)
๑. กรมชลประทาน[๒/]	๓๒	๒,๗๐๖.๔๐	๑,๕๓๓.๙๖	๑,๑๗๒.๔๔
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๑๐	๘๖๕.๑๘	๓๘๒.๓๑	๔๘๒.๘๗
๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๕	๑,๒๙๙.๖๒	๖๘๒.๙๘	๖๑๖.๖๔
๔. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล[๓/]	๑	๗๑๓.๔๐	๕๗๒.๔๐	๑๔๑.๐๐
๕. กรมทางหลวง[๔/]	๑	๕๔๘.๑๗	๓๑๗.๙๐	๒๓๐.๒๗
๖. กรมศุลกากร	๑	๑,๑๑๓.๙๘	๙๙๗.๐๖	๑๑๖.๙๒
รวมทั้งสิ้น	**๕๐**	**๗,๒๔๖.๗๕**	**๔,๔๘๖.๖๑**	**๒,๗๖๐.๑๔**

หมายเหตุ

[๑/] ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

[๒/] กรมชลประทานรายงานผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เท่ากับ จำนวน ๑,๕๒๗.๗๖ ล้านบาท และมีแผนจะใช้เงิน จำนวน ๕๘๙.๔๘ ล้านบาท (มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง จำนวน ๕๘๙.๑๖ ล้านบาท) โดยกรมชลประทานแจ้งว่าได้เรียกรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ในช่วงเวลาที่ต่างกับกระทรวงการคลัง ทำให้ผลเบิกจ่ายไม่เท่ากัน

[๓/] กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเหลืองานที่ต้องดำเนินการอีก ๕๖ แห่ง โดยมีแผนจะใช้เงิน จำนวน ๑๓.๖๒ ล้านบาท

[๔/] กรมทางหลวงมีแผนจะใช้เงิน จำนวน ๒๒๘.๖๕ ล้านบาท

๓.๓ โครงการที่จะยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ได้เสนอเรื่องดังกล่าวโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีต้นสังกัดให้กระทรวงการคลัง (สบน.) รวมรวบเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีจำนวน ๕ หน่วยงาน ๑๓ โครงการ ๑ แห่ง วงเงินจัดสรร ๖๗๙.๐๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๖.๕๔ ล้านบาท และมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน ๕๙๒.๕๓ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ - ๑๒) สรุปดังนี้

/โครงการ...

หน่วย: ล้านบาท

โครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑	เหตุผลความจำเป็น
กรมทรัพยากรน้ำ	๖๑.๘๖	๒.๖๐	
๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านป่ายุบ จังหวัดกาญจนบุรี	๔.๙๘	-	ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ จากมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้ และแจ้งยกเลิกสัญญาโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยจะขอยุติโครงการ
๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองยายฟู้ จังหวัดพิจิตร	๒.๖๕	-	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้องหยุดงานจากกรณีพิพาทที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร และรอคำสั่งศาลปกครอง ทั้งนี้ เมื่อมีการอนุมัติให้ยกเลิกสัญญา จะขอยุติโครงการ
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสำรางอ้ายขุน จังหวัดสุพรรณบุรี ๒/	๓๐.๐๐	๒.๖๐	ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดและมีค่าปรับเกินค่าก่อสร้างในวงเงินที่เหลืออยู่ แต่เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการให้ดำเนินโครงการ และคาดว่าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงคาดว่าจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๔. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองใหญ่ยาว จังหวัดพิษณุโลก	๒.๙๐	-	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ ปฏิบัติงานล่าช้า (เร่งรัดงาน จำนวน ๒ ครั้ง) และมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการให้ดำเนินโครงการ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๕. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังตามิด จังหวัดพิษณุโลก	๙.๒๘	-	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ (เร่งรัดงาน จำนวน ๓ ครั้ง) และมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการให้ดำเนินโครงการ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทอง จังหวัดพิษณุโลก	๗.๓๐	-	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ (เร่งรัดงาน จำนวน ๒ ครั้ง) และมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการให้ดำเนินโครงการ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

/โครงการ...

โครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑[๔]	เหตุผลความจำเป็น
๗. อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหลวง ช่วง ๒ จังหวัดพิษณุโลก	๔.๗๕	-	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าและมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ โดยแจ้งยกเลิกสัญญาโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการให้ดำเนินโครงการ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
กรมชลประทาน	**๙.๕๔**	-	
๘. โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากแม่ข่ายสำนักชลประทานเข้าสู่ส่วนกลาง พร้อมทั้งระบบประมวลผลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS (Decision Support System)	๙.๕๔	-	การพัฒนาระบบ DSS ต้องพัฒนาต่อยอดจากระบบ MIS (Management Information System) ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เช่น ต้องจัดหาเพิ่มอุปกรณ์ที่ชำรุด ต้องปรับปรุงระบบให้เป็นระบบอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงอยู่ระหว่างปรับแต่งการใช้งานระบบ MIS ให้สอดคล้องกับสภาพเครื่องมือของแต่ละเขื่อน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ DSS แล้ว จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
กรมทางหลวง	**๕๕๙.๓๓**	**๘๓.๙๔**	
๙. โครงการทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ จังหวัดภูเก็ต ๒ แห่ง	๑๕๙.๔๐	๒๓.๙๑	จุดก่อสร้างที่ ๑ (แยกมุดดอกขาว) ติดปัญหาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชน และจุดก่อสร้างที่ ๒ (บ้านหยี่เต็ง) อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งนี้ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๑๐. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนรังสิต - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันออก จังหวัดปทุมธานี [๗]	๓๙๙.๙๓	๖๐.๐๓	ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ด้วยเหตุผลจากการคัดค้านของประชาชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[๙]	**๔๘.๑๔**	-	
๑๑. โครงการระบบประสานเครือข่ายเพื่อการเตือนภัย	๘.๒๖	-	ต้องดำเนินการศึกษาและวางระบบ หรือกลไกในการสื่อสารหรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมก่อน เพื่อมิให้เกิดความสับสนของผู้ใช้งาน รวมถึงจะต้องมีงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาระบบต่างๆ ด้วย

/โครงการ...

โครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑[๑/]	เหตุผลความจำเป็น
๑๒. โครงการเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ระยะที่ ๒	๓๔.๕๘	-	อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในระยะที่ ๑ ชำรุดเสียหาย และไม่สามารถเชื่อมโยงการส่งข้อมูลมายังห้องปฏิบัติการได้ ประกอบกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตามลุ่มน้ำต่างๆ มีหน่วยงานที่ดำเนินงานแล้ว หากจะดำเนินการต่อจะต้องศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน และต้องเตรียมจัดหางบประมาณแต่ละปีสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
๑๓. โครงการระบบสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการน้ำผ่านดาวเทียม	๕.๓๐	-	ต้องดำเนินการศึกษาและวางระบบหรือกลไกต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมก่อน รวมถึงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมจะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจำนวนมากทั้งในลักษณะรายเดือนและการดูแล บำรุงรักษาระบบด้วย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๐.๒๐	-	
๑๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ แห่ง คือ บ้านตาตวด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	๐.๒๐	-	พื้นที่ได้รับบริการระบบประปาผิวดินจากเทศบาลตำบลบุสูง และปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น	๖๗๙.๐๗	๘๖.๕๔	

หมายเหตุ:

[๑/] ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

[๒/] โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับจ้างได้เบิกเงินค่างวดงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงมิต้องคืนเงินให้กรมทรัพยากรน้ำ โดยภายหลังการบอกเลิกสัญญาได้ดำเนินการริบหลักประกันสัญญา จำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท แล้ว ส่วนกรณีค่าปรับอยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องคดีกับผู้รับจ้าง

[๓/] ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนรังสิต - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันออก จังหวัดปทุมธานี ผู้รับจ้างยินดีคืนเงินที่เบิกไปแล้ว จำนวน ๖๐.๐๓ ล้านบาท ประกอบด้วยค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๕๙.๖๙ ล้านบาท และค่างานงวดที่ ๑ จำนวน ๐.๓๔ ล้านบาท

[๔/] กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่า โครงการที่จะยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ ลำดับที่ ๑๑ - ๑๓ อยู่ระหว่างการนำเสนอรัฐมนตรีต้นสังกัดให้ความเห็นชอบในการยกเลิกโครงการ

๔. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

๔.๑ รับทราบสถานะการดำเนินโครงการ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ ตามนัยข้อ ๓.๑ - ๓.๒ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

/๔.๒ อนุมัติ...

๔.๒ อนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๗๙.๐๗ ล้านบาท **ตามนัยข้อ ๓.๓** โดยในการยกเลิกสัญญาขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และหากหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยกเลิกโครงการต้องคืนเงินที่ได้เบิกไปแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการและแจ้งผลการคืนเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทราบด้วย

สำหรับโครงการที่ขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะดำเนินโครงการต่อไป ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

๔.๓ เห็นชอบให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๓
โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๕๗๕
E-mail chaluntorn@pdmo.go.th

ตารางที่ 5 รายละเอียดการยกเลิกโครงการ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ความจำเป็นในการขอยกเลิก
1	บ้านตาตวด หมู่ที่ 16 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	ซ้ำซ้อน

17.12 ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนโอนจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 9

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน โทร 0 2666 7368 โทรสาร 0 2666 7380

ที่ 05/1107 **วันที่** มิถุนายน 2562

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ สพบ. ด่วนที่สุด ที่ 05/683 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 อทบ. ได้อนุมัติให้ สพบ. ปรับแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ เพื่อโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ สทบ. เขต 5 และ 12 เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

1. สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ได้รับการประสานจาก สทบ. เขต 12 ว่ามีพื้นที่ที่กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 แห่ง และพบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่างบประมาณที่เหลืออยู่ โดยมีงบประมาณคงเหลือรวม 20,173.42 บาท ต้องการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ แห่งละ 6,500 บาท รวมเป็นวงเงิน 13,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 จึงมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม (บาท)	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)
บ้านไทย ม. 3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	4,204.56	6,500.00	10,704.56
บ้านหาร ม. 4 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา	15,968.86	6,500.00	22,468.86
รวม	**20,173.42**	**13,000.00**	**33,173.42**

2. สำนักพัฒนาน้ำบาดาล จึงมีความประสงค์ขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ, แผนการจัดสรรงบประมาณและโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ สทบ. เขต 12 เพื่อปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า โดยใช้งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจัดซื้อท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ที่ได้

/ดำเนินการ.....

ดำเนินการจัดซื้อที่ส่วนกลาง ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณแล้ว ตามรหัสแหล่งของเงิน ปี 2558 วงเงิน 13,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ สทบ. เขต 12 วงเงิน 13,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และ 3

ทั้งนี้ การปรับแผนดังกล่าวไม่ทำให้สาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนไป และยังคงอยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิมตามที่ได้รับอนุมัติ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ตามข้อเท็จจริง 2
2. อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ให้ สทบ. เขต 12 ในวงเงินตามข้อเท็จจริง 2
3. มอบหมาย สบก.(สค.)/ สพบ./ กผ./ สทบ. เขต 12 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีรวัฒน์ ยิ่งยง)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

เรียน ...
... ข้อ 1 และ 2
และ มอบหมาย ... ข้อ 3 ต่อไปด้วย

(นายกุศล โชติรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26 มิ.ย. 2562

- ... 1, 2
- ... ที่เกี่ยวข้อง ...
3 ดำเนินการต่อไป

12 ... 62

(นางสาวจงจิตร์ นิรนาทมธีกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางดวงพร จั่นหยง)
อำนวยการสำนักบริหารกลาง
27 มิ.ย. 2562

เอกสารแนบ 1

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
เลขที่รับ 3010
วันที่ 24 มิ.ย. 2562
เวลา 12-57 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ สงขลา โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๒๕

ที่ ๒๒/ ๓๐๘ **วันที่** ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กลุ่มพัฒนาและจัดการน้ำบาดาลรายพื้นที่ (กพพ.)
เลขรับ 509
วันที่ 25 มิ.ย. 2562
เวลา 09.25

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

เรียน ผอ.สพบ.

ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดสรรโอนงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ สงขลา ดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว นั้น ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงานดังกล่าว

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ สงขลา จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้

๑. บ้านไทย หมู่ ๓ ตำบลต้นหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
จำนวน ๖,๕๐๐.- บาท (เงินหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. บ้านหาร หมู่ ๔ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
จำนวน ๖,๕๐๐.- บาท (เงินหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุวิทย์ บุญชัย)
วิศวกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒

กพพ.
.....
าบ ☐ พิจารณาดำเนินการต่อไป
ง/เข้าแฟ้ม ☐ เรียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
.....

(นายมณเฑียร จงจินากูล)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
24 มิ.ย. 2562

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติโอนจัดสรรเพิ่มเติมกิจกรรมค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 892 แห่ง
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณที่ยกยอดมา (บาท)			ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
			ปี 2558	ปี 2559	รวม		
1	09007C1001410852	บ้านบูเก๊ะบูแย หมู่ที่ 11 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	7,402.50	1,002.66	8,405.16		8,405.16
2	09007C1001410853	บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	15,278.95	19,928.00	35,206.95		35,206.95
3	09007C1001410854	บ้านโต๊ะเปาะมะ หมู่ที่ 10 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	2,903.00	10,052.29	12,955.29		12,955.29
4	09007C1001410855	บ้านร่อน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	10,915.67	1,739.59	12,655.26		12,655.26
5	09007C1001410856	บ้านไทย หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	68.00	4,136.56	4,204.56	6,500.00	10,704.56
6	09007C1001410858	บ้านแกแม หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	6,081.50	3,374.11	9,455.61		9,455.61
7	09007C1001410870	บ้านลุโบะบือซา หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	5,841.17	11,702.31	17,543.48		17,543.48
8	09007C1001410871	บ้านบือเระ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	32,348.17	52,000.00	84,348.17		84,348.17
9	09007C1001410872	บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	69,135.17	9,653.00	78,788.17		78,788.17
10	09007C1001410875	บ้านบาโด หมู่ที่ 3 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	4,291.73	5,704.45	9,996.18		9,996.18
11	09007C1001410876	บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 6 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	19,579.66	5,043.45	24,623.11		24,623.11
12	09007C1001410879	บ้านบางมวง หมู่ที่ 3 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	20,334.12	33,500.00	53,834.12		53,834.12
13	09007C1001410883	บ้านหาร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	12,081.36	3,887.50	15,968.86	6,500.00	22,468.86
14	09007C1001410884	บ้านคู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	29,622.78	10,198.50	39,821.28		39,821.28
15	09007C1001410887	บ้านท่าหิน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	12,213.75	15,750.00	27,963.75		27,963.75
16	09007C1001410888	บ้านพรวน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	714.50	10,350.00	11,064.50		11,064.50
		รวมทั้งสิ้น	**248,812.03**	**198,022.42**	**446,834.45**	**13,000.00**	**459,834.45**

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติโอนจัดสรรเพิ่มเติมกิจกรรมค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 892 แห่ง
ส่วนกลาง

ลำดับที่	รหัสงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ ปี 2558 จากส่วนกลาง (เดิม)						ค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุ	งบประมาณคงเหลือ ปี 2558 จากส่วนกลาง (ใหม่)						รวมยอดโอนจัดสรรเพิ่มเติม
		ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงาน	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	รวม	ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าที่ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม	ค่าวัสดุท่อและอุปกรณ์	ค่าเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์	ค่าท่อระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์	ค่าติดตามประเมินผล/ประชุมโครงการ/เอกสารประชาสัมพันธ์/ตรวจรับงาน	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	รวม	กิจกรรมค่าขยายเขตไฟฟ้า/วัสดุต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า
1	09007C1001410852	6,828.00	110.00	22,076.00	-	800.00	29,814.00		6,828.00	110.00	22,076.00	-	800.00	29,814.00	
2	09007C1001410853	6,828.00	110.00	22,076.00	-	800.00	29,814.00		6,828.00	110.00	22,076.00	-	800.00	29,814.00	
3	09007C1001410854	6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00		6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00	
4	09007C1001410855	6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00		6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00	
5	09007C1001410856	6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00	6,500.00	328.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	24,314.00	6,500.00
6	09007C1001410858	6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00		6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00	
7	09007C1001410870	6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00		6,828.00	110.00	22,076.00	1,000.00	800.00	30,814.00	
8	09007C1001410871		110.00		1,000.00	800.00	1,910.00			110.00		1,000.00	800.00	1,910.00	
9	09007C1001410872		214.60		1,000.00	800.00	2,014.60			214.60		1,000.00	800.00	2,014.60	
10	09007C1001410875	6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60		6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60	
11	09007C1001410876	6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60		6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60	
12	09007C1001410879	6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60		6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60	
13	09007C1001410883	6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60	6,500.00	328.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	24,418.60	6,500.00
14	09007C1001410884	6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60		6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60	
15	09007C1001410887	6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60		6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60	
16	09007C1001410888	6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60		6,828.00	214.60	22,076.00	1,000.00	800.00	30,918.60	
	รวม	95,592.00	2,596.80	309,064.00	14,000.00	12,800.00	434,052.80	13,000.00	82,592.00	2,596.80	309,064.00	14,000.00	12,800.00	421,052.80	13,000.00

18. ผลการดำเนินงานโครงการ

จากแผนปฏิบัติงานเดิมมีพื้นที่ดำเนินการ รวม 892 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัด แต่เนื่องจากพื้นที่บางแห่งไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือหมดความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไป สาเหตุจากไม่มีศักยภาพน้ำ, ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานอื่นแล้ว, มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกโครงการ จำนวน 91 แห่ง และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 45 แห่ง ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมาได้ขอยกเลิกโครงการเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง เนื่องจากได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานอื่นแล้ว ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกได้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จึงคงเหลือพื้นที่ดำเนินการ 800 แห่ง รายละเอียดตามตารางที่ 5

ตารางที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ของแต่ละ สทบ. เขต

ลำดับที่	สทบ.เขต	จังหวัด	พื้นที่ดำเนินการ (แห่ง)
1	สทบ.เขต 1 ลำปาง	เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน	104
2	สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี	ชัยนาท, นครสวรรค์, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา	9
3	สทบ.เขต 3 สระบุรี	ปราจีนบุรี, เพชรบูรณ์	22
4	สทบ.เขต 4 ขอนแก่น	กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, เลย	16
5	สทบ.เขต 5 นครราชสีมา	ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์	218
6	สทบ.เขต 6 ลำปาง	ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พังงา, สุราษฎร์ธานี	88
7	สทบ.เขต 7 กำแพงเพชร	กำแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, สุโขทัย	8
8	สทบ.เขต 8 ราชบุรี	เพชรบุรี, ราชบุรี	3
9	สทบ.เขต 9 ระยอง	จันทบุรี, ระยอง, สระแก้ว	71
10	สทบ.เขต 10 อุดรธานี	นครพนม, บึงกาฬ, มุกดาหาร, หนองคาย, อุดรธานี	22
11	สทบ.เขต 11 อุบลราชธานี	ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี	215
12	สทบ.เขต 12 สงขลา	นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล	24
	รวม		**800**

ตารางที่ 7 ผลการดำเนินงานรายจังหวัด

ลำดับที่	สทบ.เขต	จังหวัด	ผลงาน (แห่ง)
1	สทบ.เขต 1 ลำปาง	เชียงราย	32
2		เชียงใหม่	31
3		น่าน	6
4		พะเยา	25
5		แพร่	2
6		แม่ฮ่องสอน	1
7		ลำปาง	6
8		ลำพูน	1
	รวม		**104**
9	สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี	ชัยนาท	3
10		นครสวรรค์	2
11		สุพรรณบุรี	3
12		พระนครศรีอยุธยา	1
	รวม		**9**
13	สทบ.เขต 3 สระบุรี	นครนายก	0
14		ปราจีนบุรี	8
15		เพชรบูรณ์	14
	รวม		**22**
16	สทบ.เขต 4 ขอนแก่น	กาฬสินธุ์	9
17		ขอนแก่น	3
18		มหาสารคาม	2
19		เลย	2
	รวม		**16**
20	สทบ.เขต 5 นครราชสีมา	ชัยภูมิ	2
21		นครราชสีมา	4
22		บุรีรัมย์	44
23		สุรินทร์	168
	รวม		**218**

ลำดับที่	สทบ.เขต	จังหวัด	ผลงาน (แห่ง)
24	สทบ.เขต 6 ตรัง	ชุมพร	18
25		ตรัง	2
26		นครศรีธรรมราช	60
27		พังงา	2
28		สุราษฎร์ธานี	6
	รวม		**88**
29	สทบ.เขต 7 กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	2
30		พิจิตร	3
31		พิษณุโลก	2
32		สุโขทัย	1
	รวม		**8**
33	สทบ.เขต 8 ราชบุรี	เพชรบุรี	2
34		ราชบุรี	1
35		สมุทรปราการ	0
	รวม		**3**
36	สทบ.เขต 9 ระยอง	จันทบุรี	68
37		ระยอง	2
38		สระแก้ว	1
	รวม		**71**
39	สทบ.เขต 10 อุดรธานี	นครพนม	4
40		บึงกาฬ	6
41		มุกดาหาร	2
42		หนองคาย	5
43		อุดรธานี	5
	รวม		**22**
44	สทบ.เขต 11 อุบลราชธานี	ยโสธร	2
45		ร้อยเอ็ด	20
46		ศรีสะเกษ	168
47		อำนาจเจริญ	1
48		อุบลราชธานี	24
	รวม		**215**

ลำดับที่	สทบ.เขต	จังหวัด	ผลงาน (แห่ง)
49	สทบ.เขต 12 สงขลา	นราธิวาส	9
50		ปัตตานี	1
51		พัทลุง	3
52		ยะลา	2
53		สงขลา	7
54		สตูล	2
	รวม		**24**
	รวมทั้งสิ้น		**800**

18.1 สรุปผลการดำเนินงาน งานเจาะบ่อน้ำบาดาลและงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 800 แห่ง

ตารางที่ 8 สรุปผลการดำเนินงานราย สทบ. เขต

ลำดับที่	สทบ. เขต	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล (แห่ง)		งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล (แห่ง)	
		แผน	ผล	แผน	ผล
1	สทบ.1 (ลำปาง)	125	104	125	104
2	สทบ.2 (สุพรรณบุรี)	9	9	9	9
3	สทบ.3 (สระบุรี)	24	22	24	22
4	สทบ.4 (ขอนแก่น)	16	16	16	16
5	สทบ.5 (นครราชสีมา)	244	218	244	218
6	สทบ.6 (ตรัง)	90	88	90	88
7	สทบ.7 (กำแพงเพชร)	9	8	9	8
8	สทบ.8 (ราชบุรี)	5	3	5	3
9	สทบ.9 (ระยอง)	71	71	71	71
10	สทบ.10 (อุดรธานี)	24	22	24	22
11	สทบ.11 (อุบลราชธานี)	217	216	217	216
12	สทบ.12 (สงขลา)	58	24	58	24
	รวม	**892**	**800**	**892**	**800**

รูปที่ 1 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง

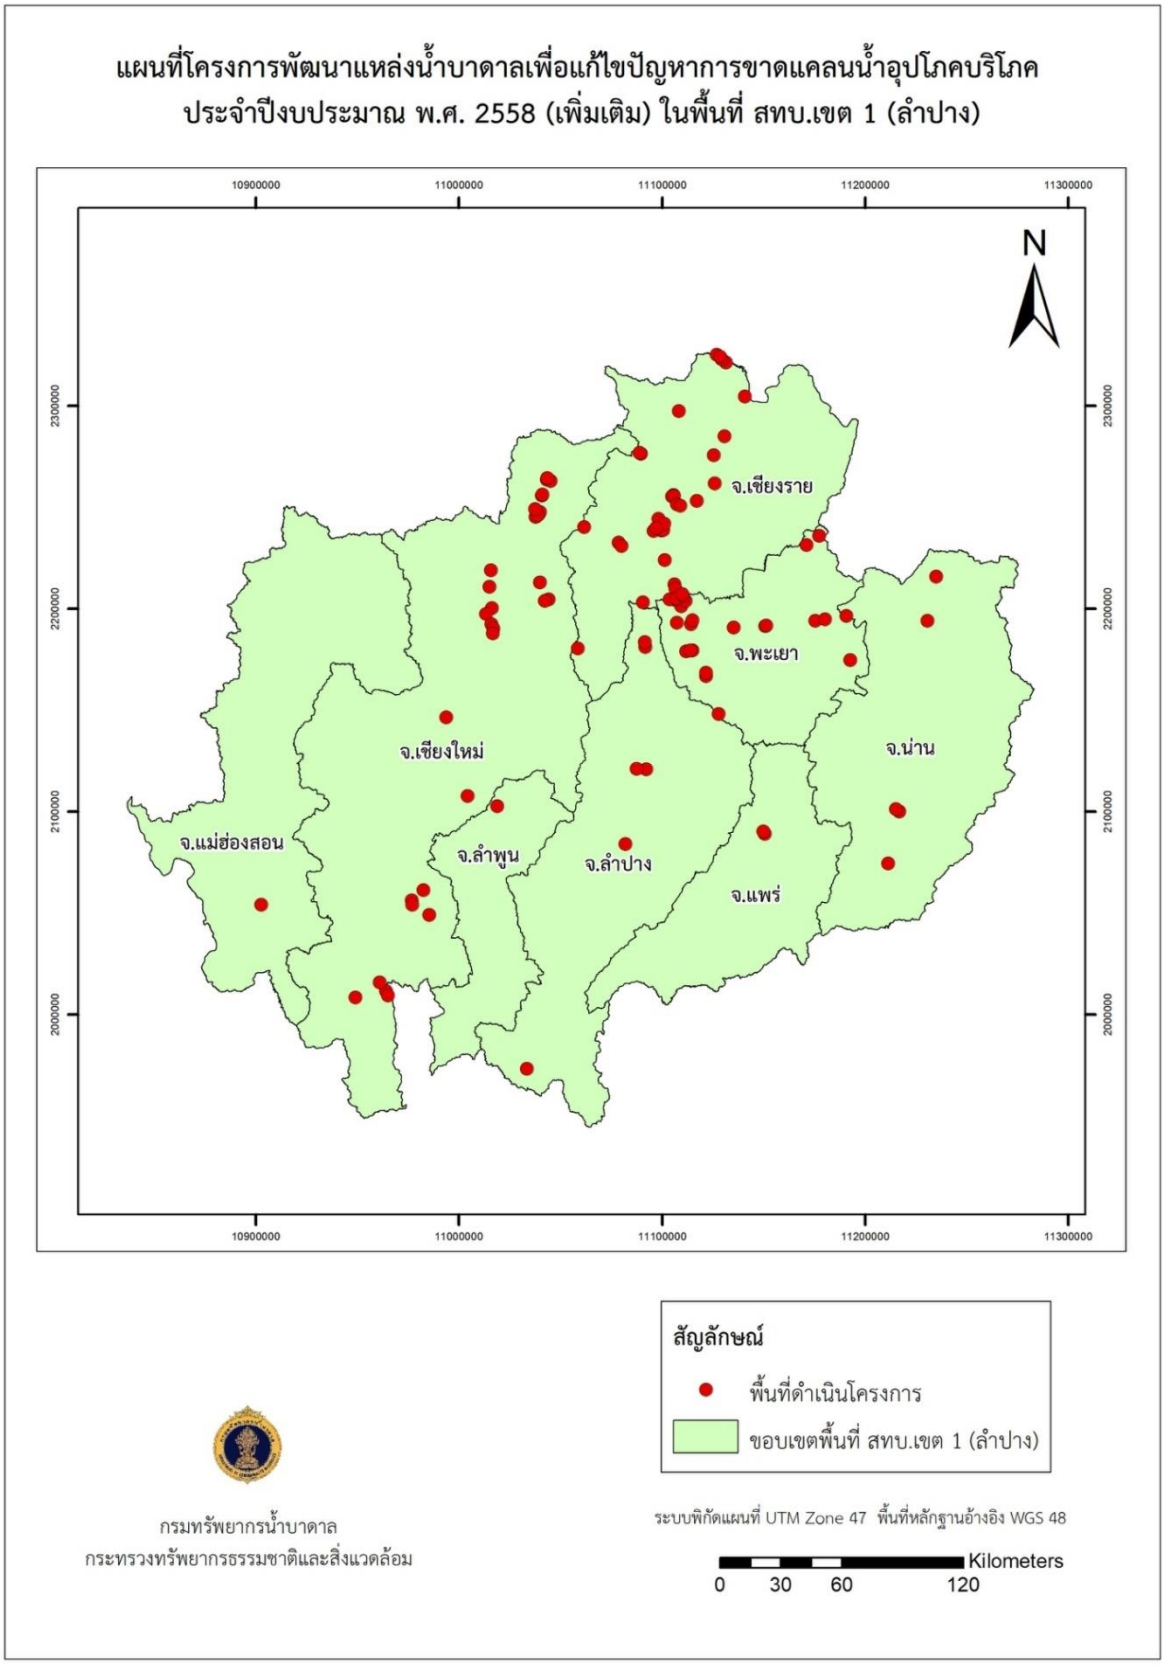

รูปที่ 2 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี

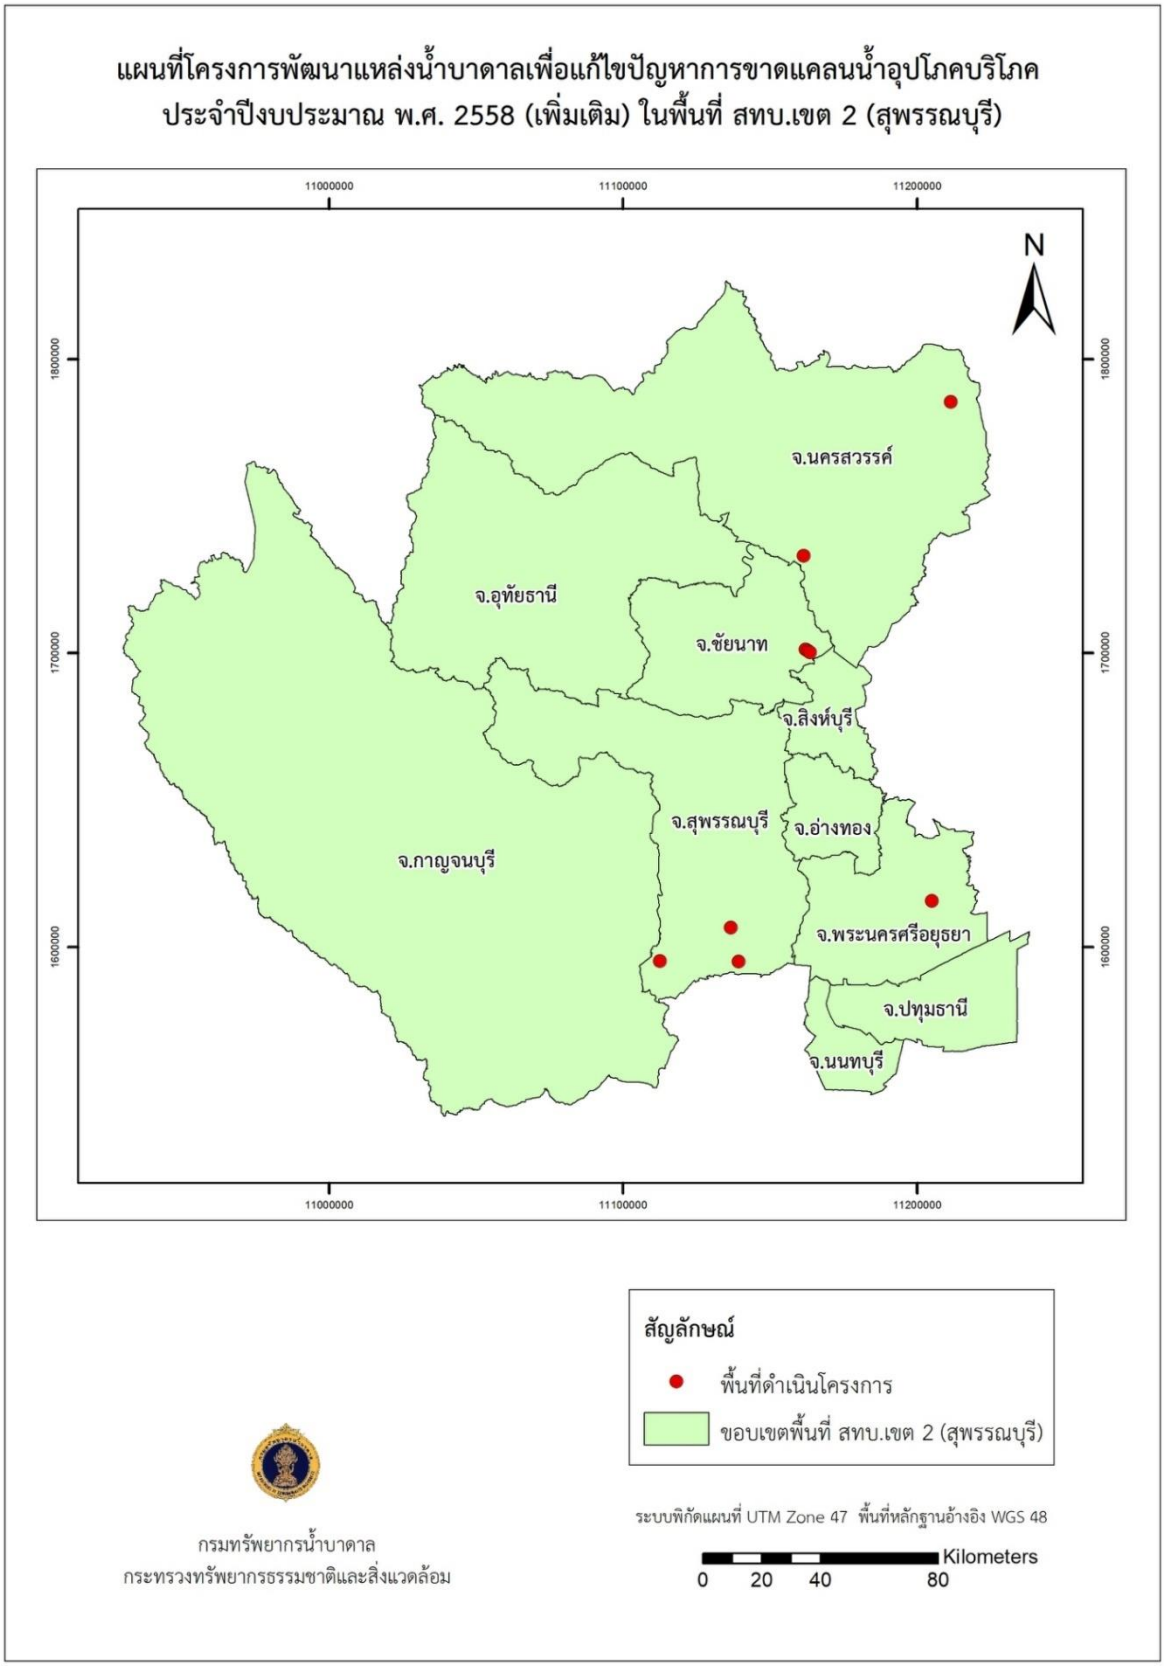

รูปที่ 3 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี

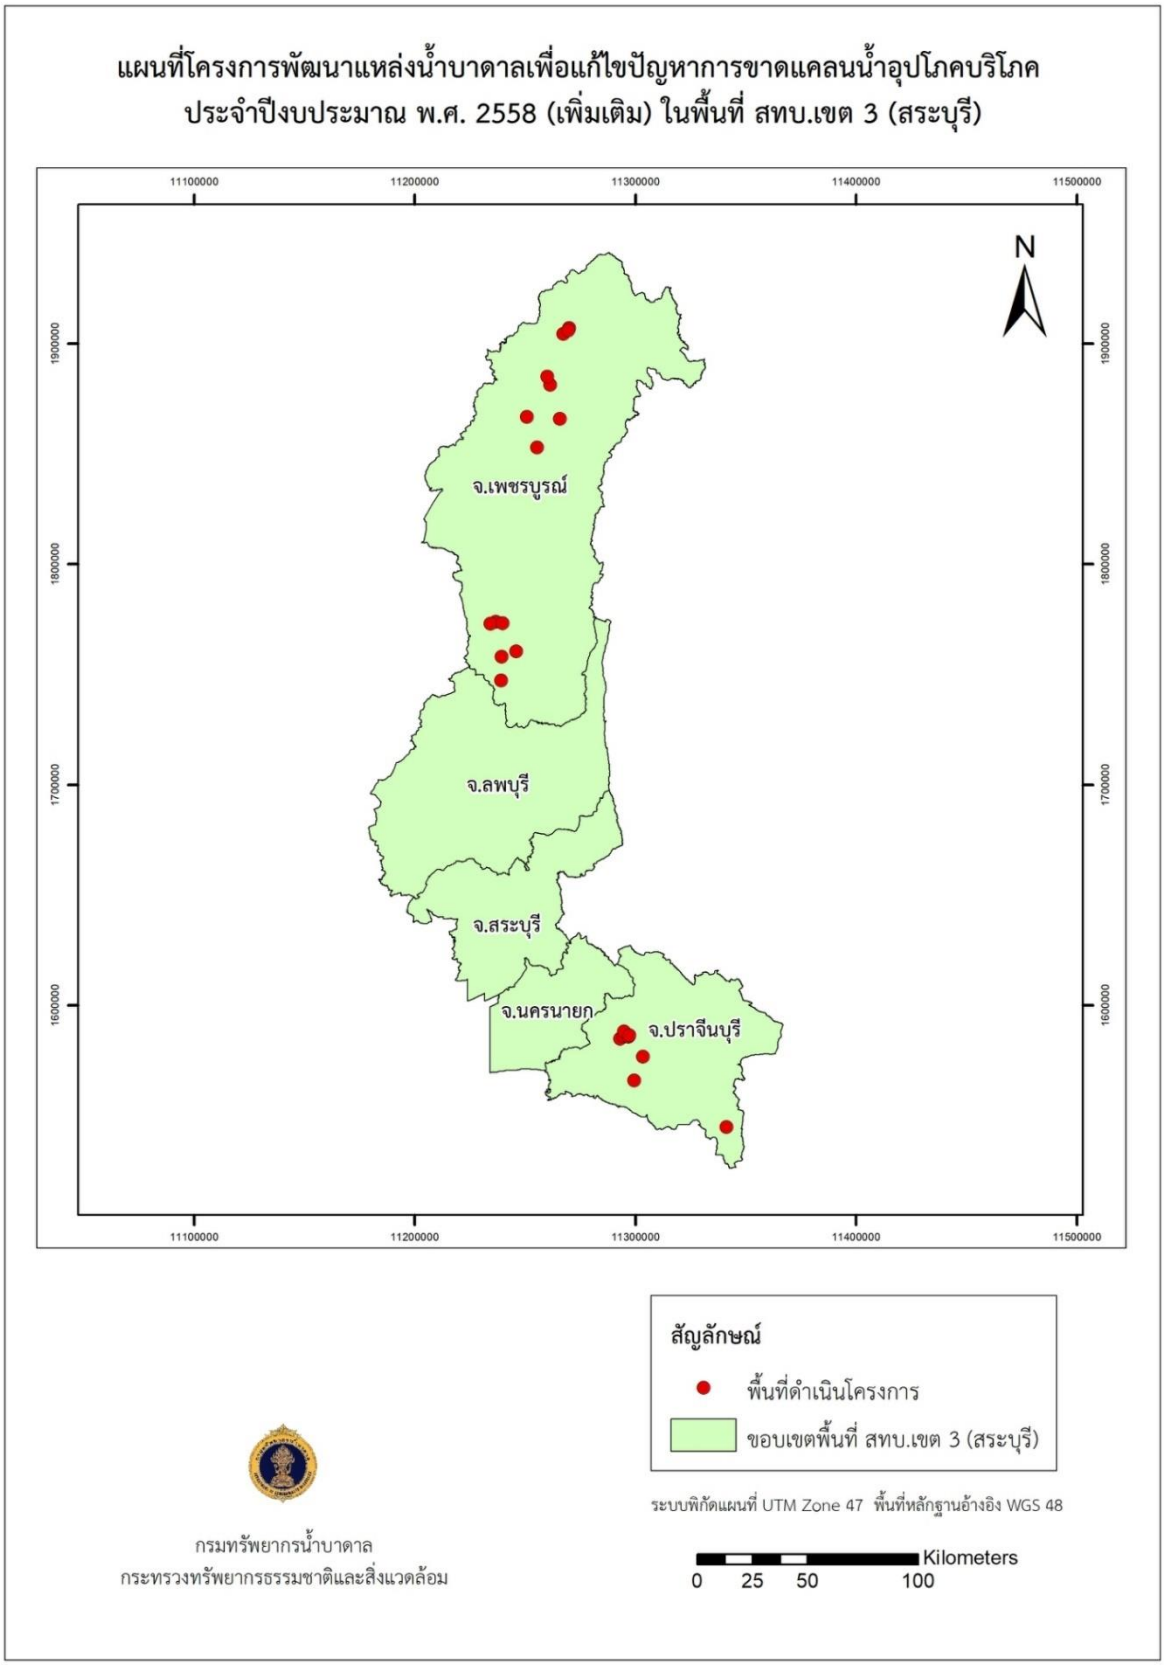

รูปที่ 4 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น

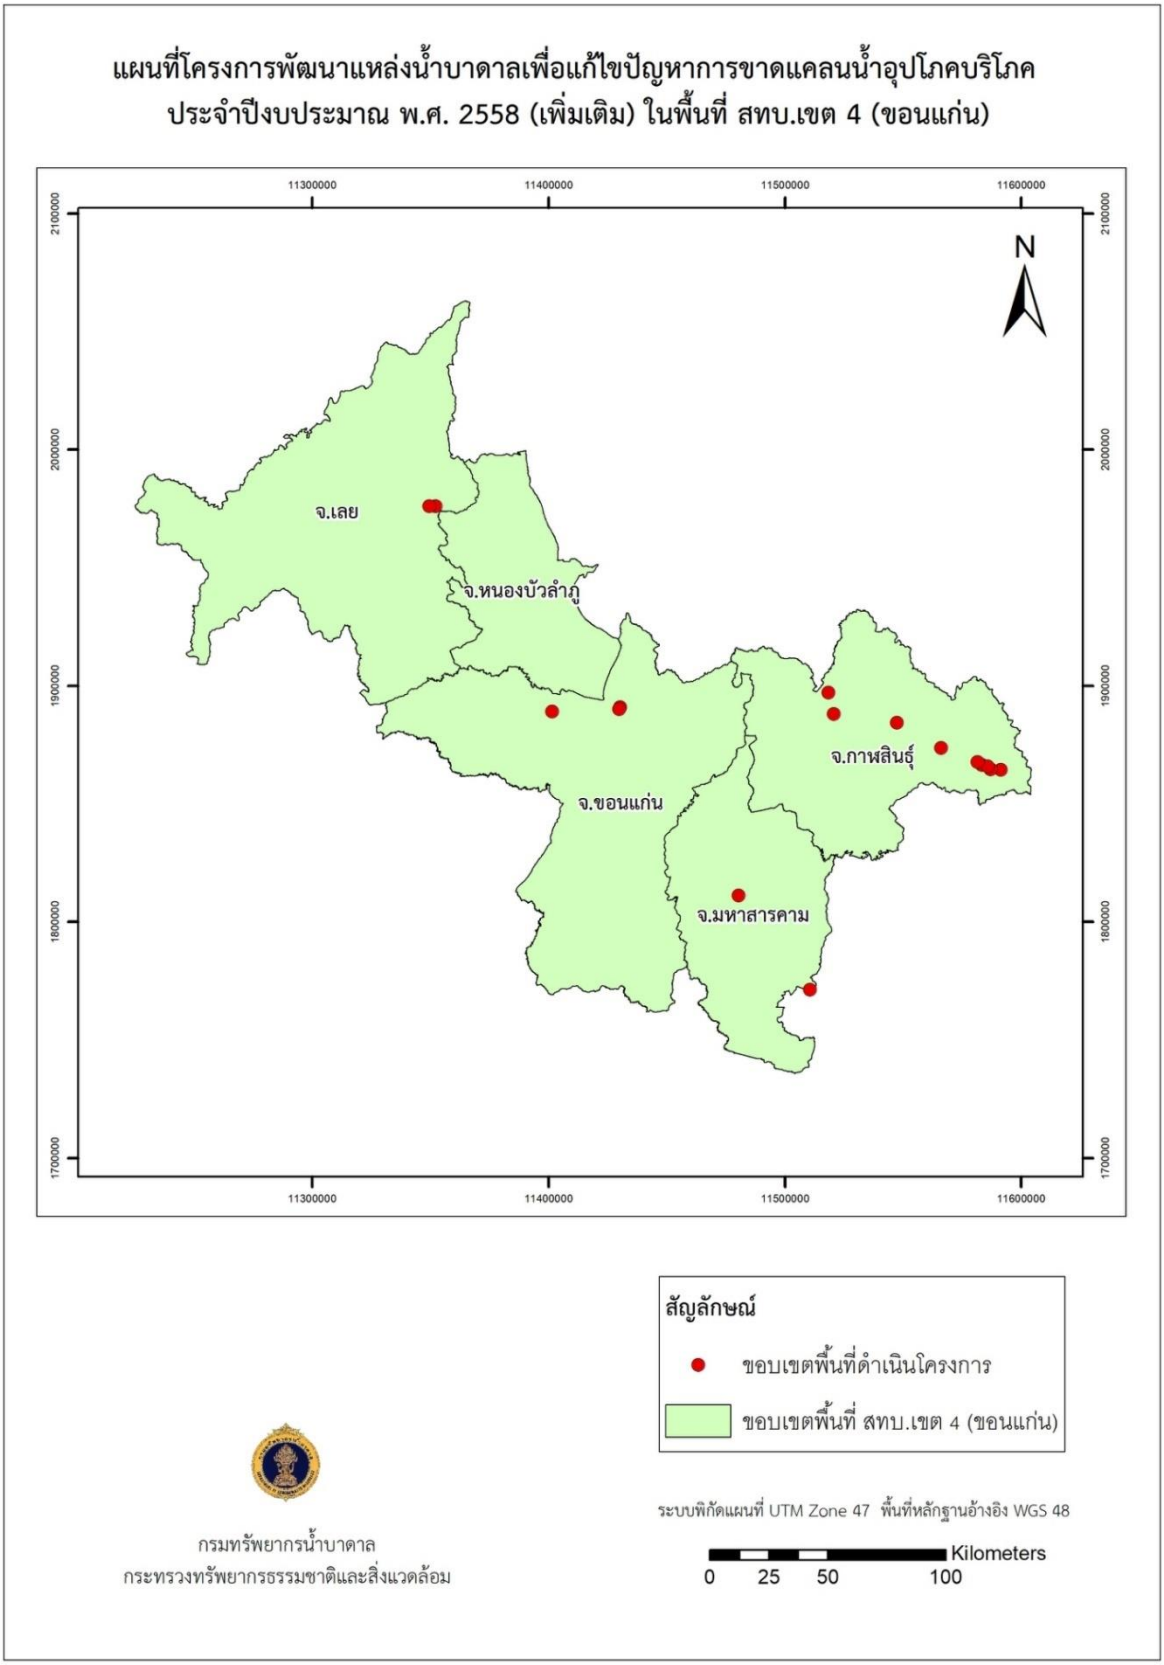

รูปที่ 5 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา

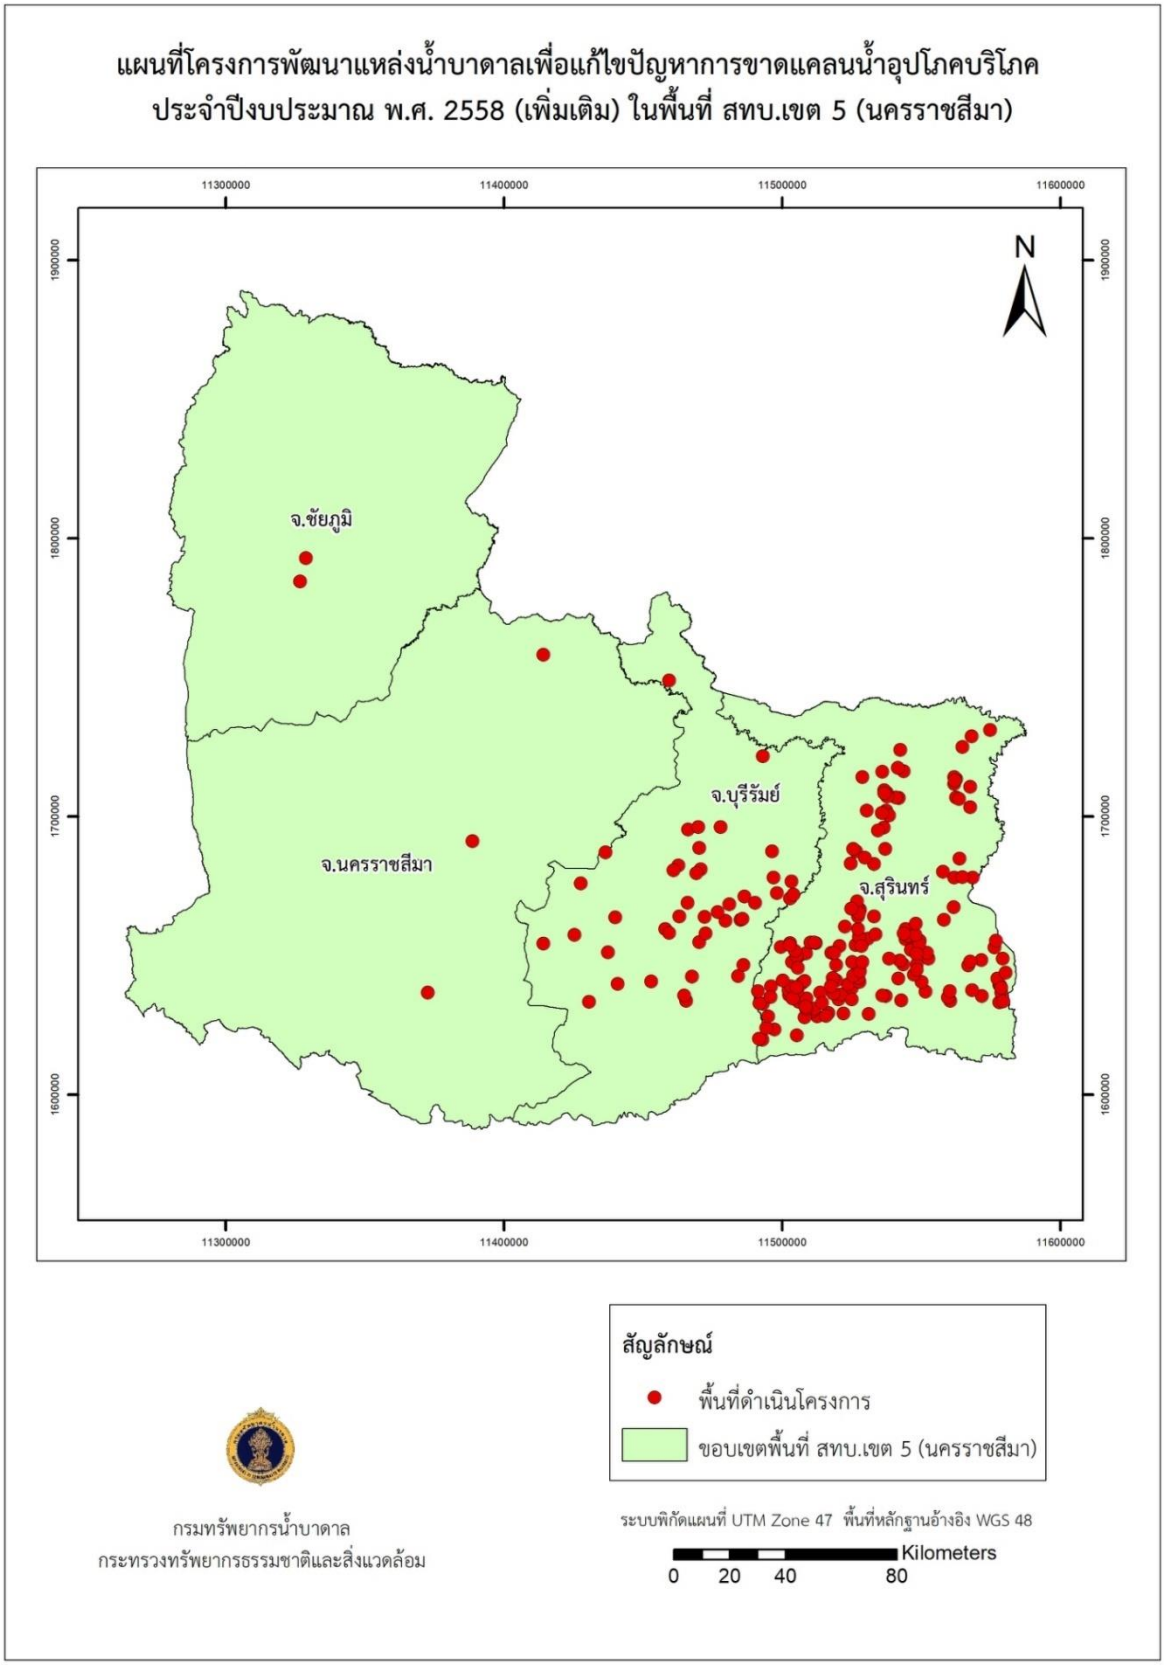

รูปที่ 6 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง

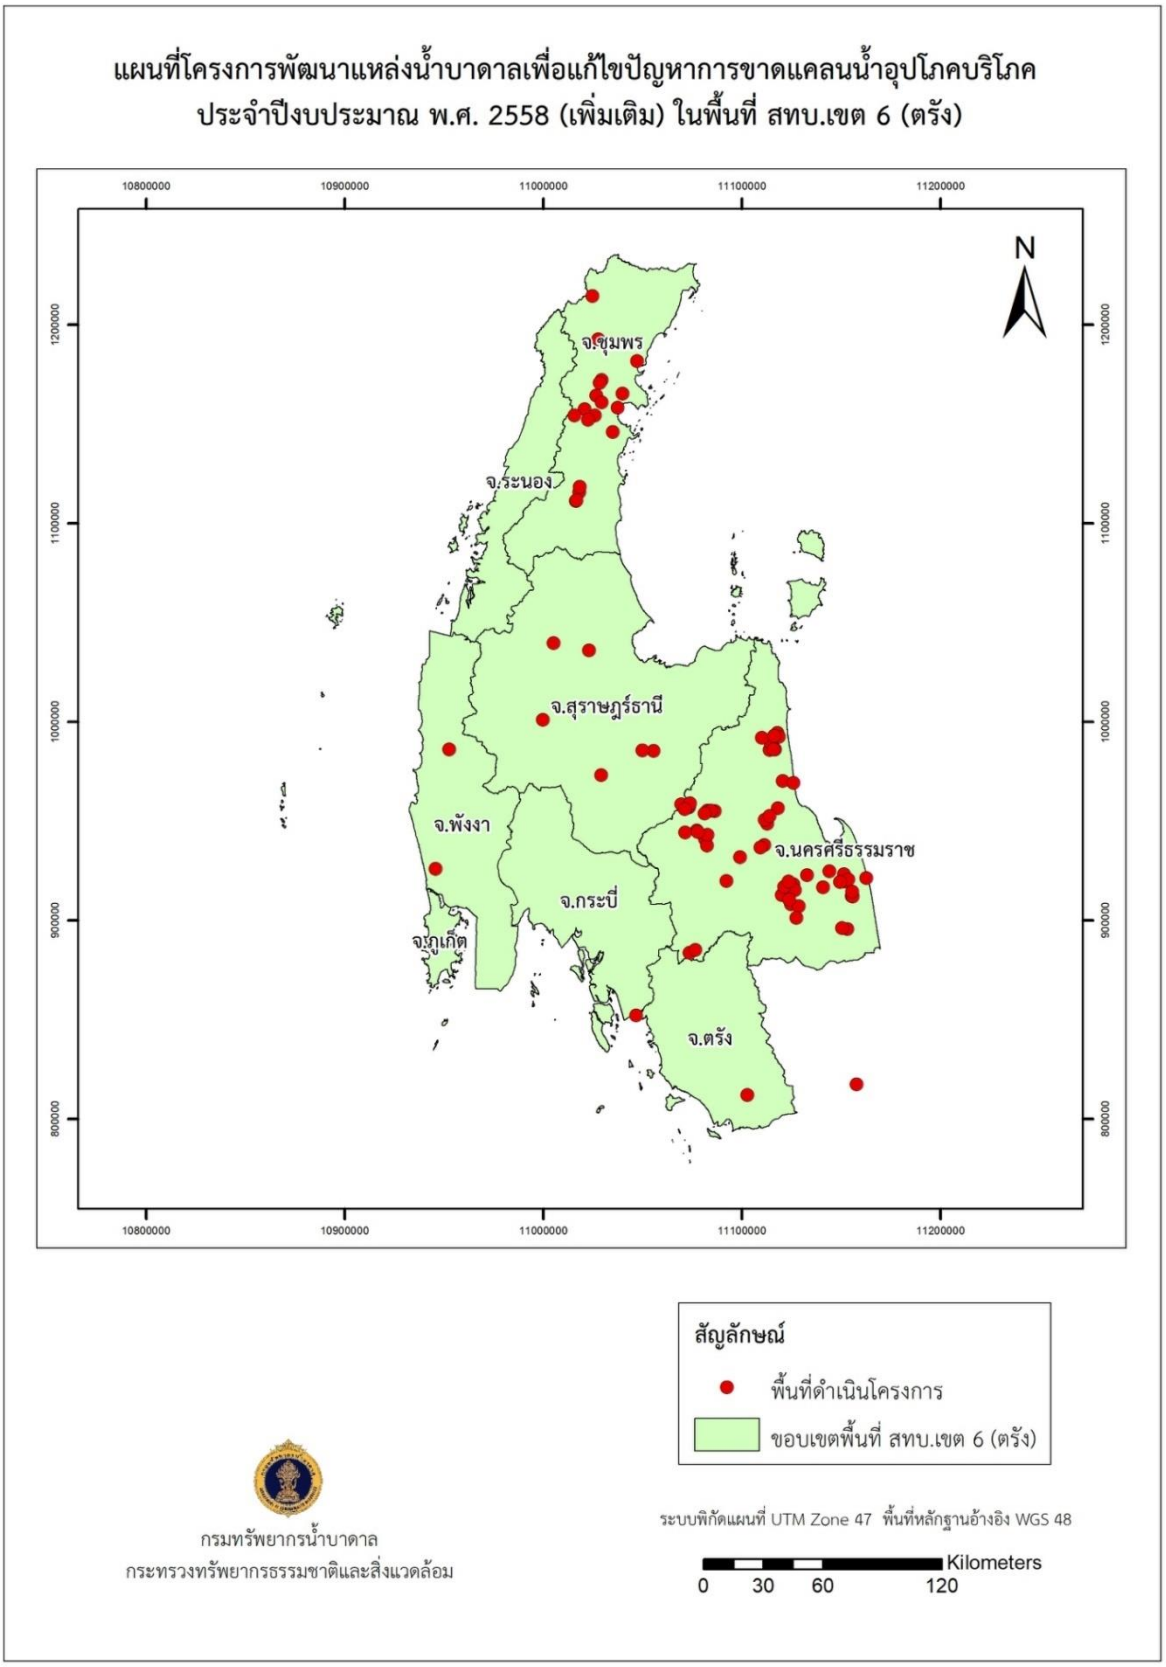

รูปที่ 7 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร

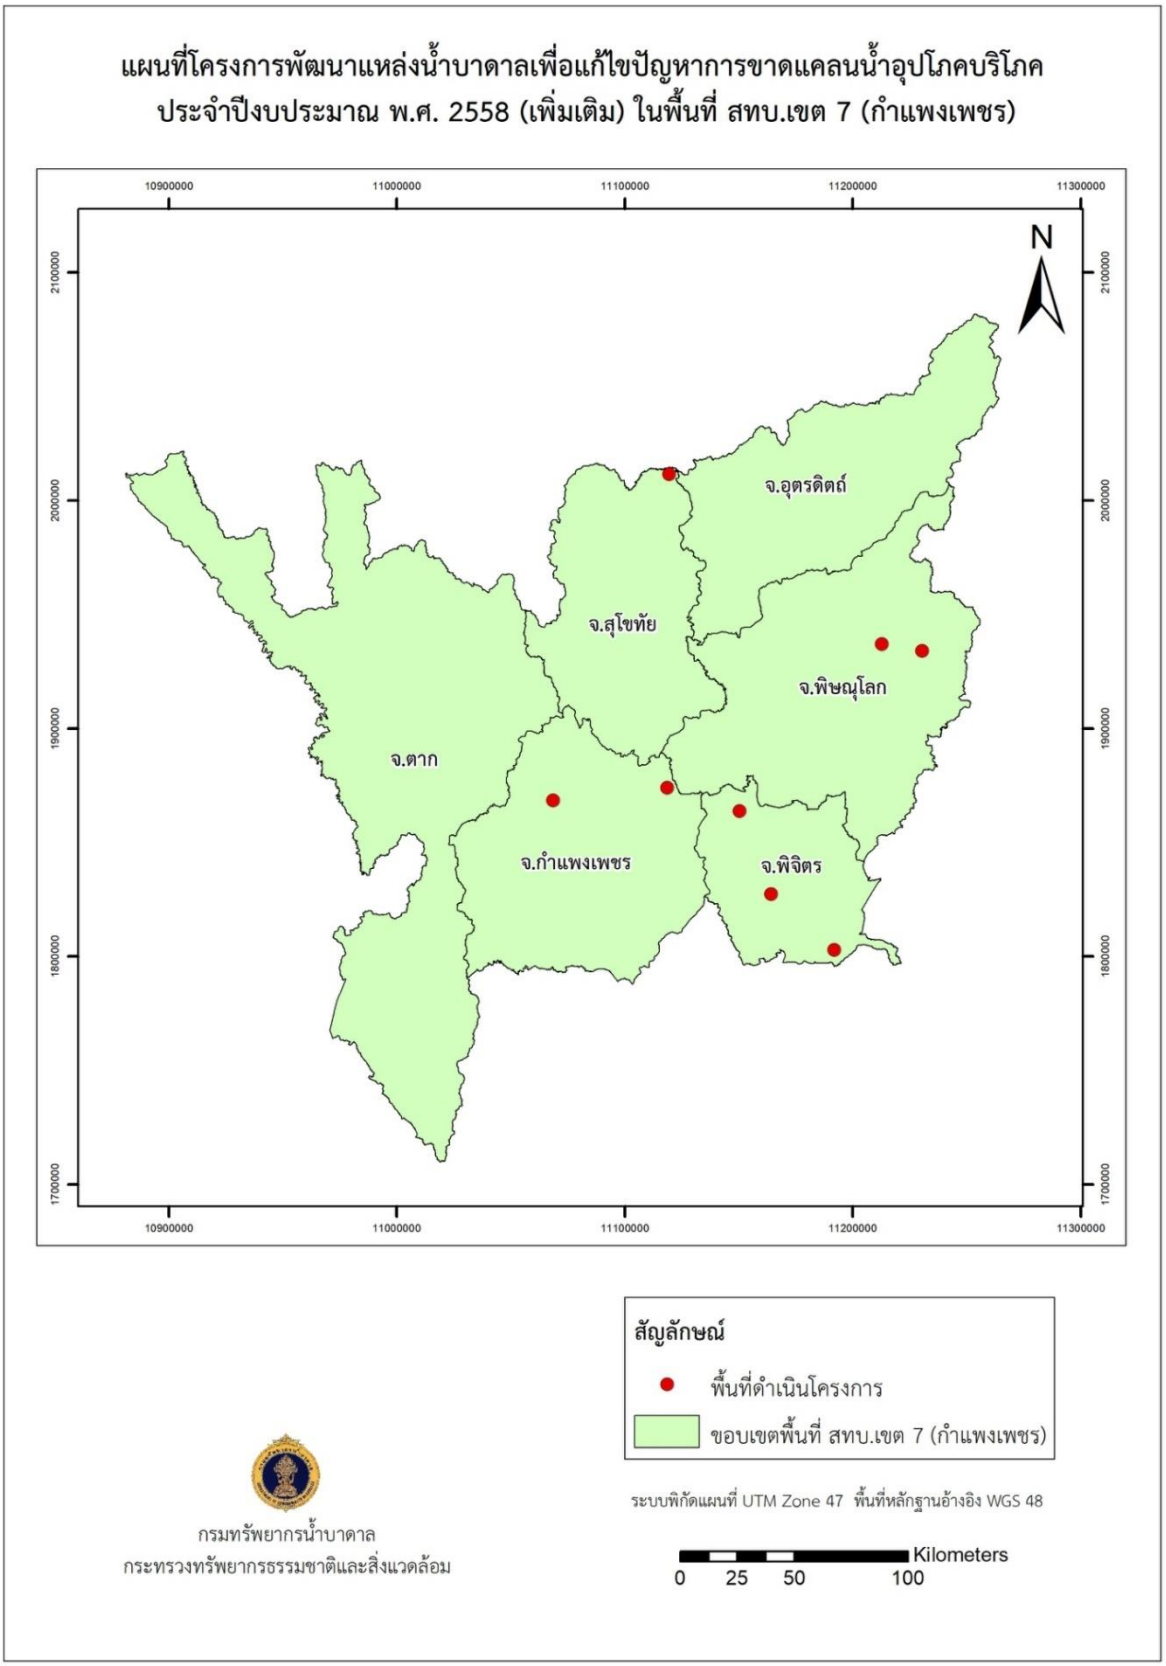

รูปที่ 8 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี

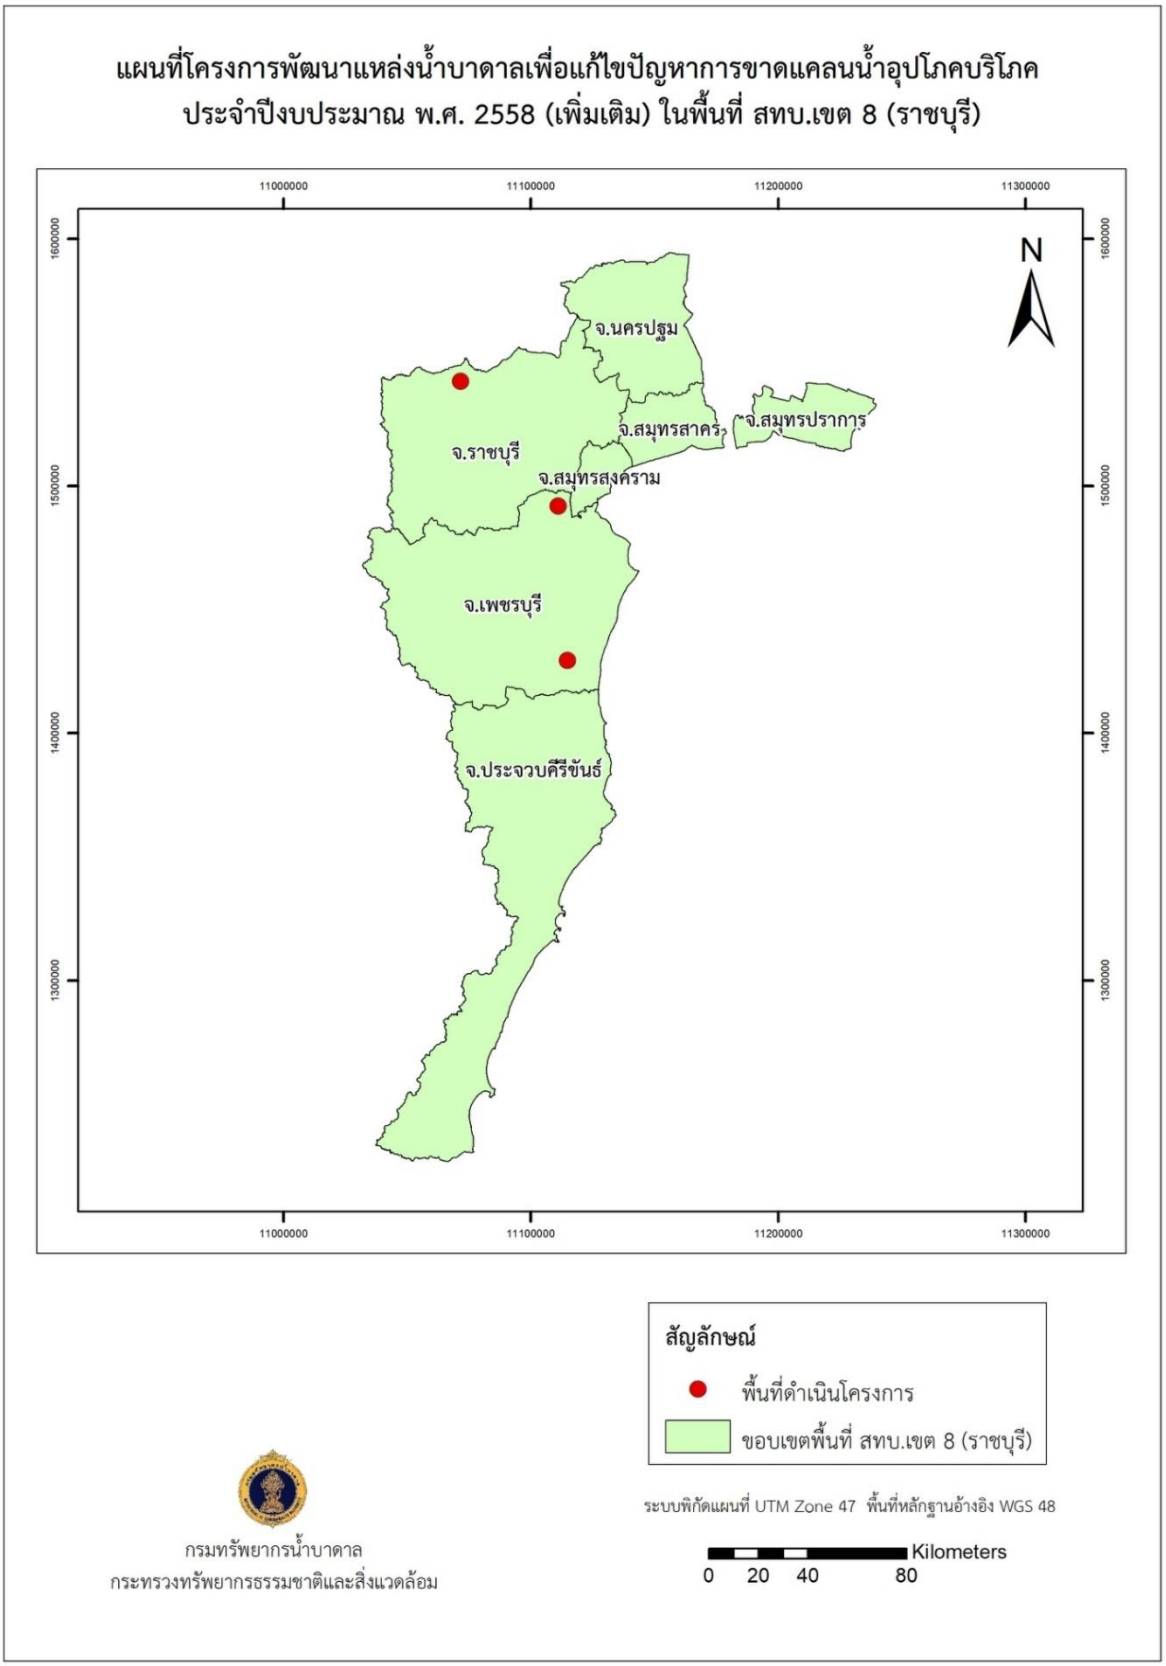

รูปที่ 9 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง

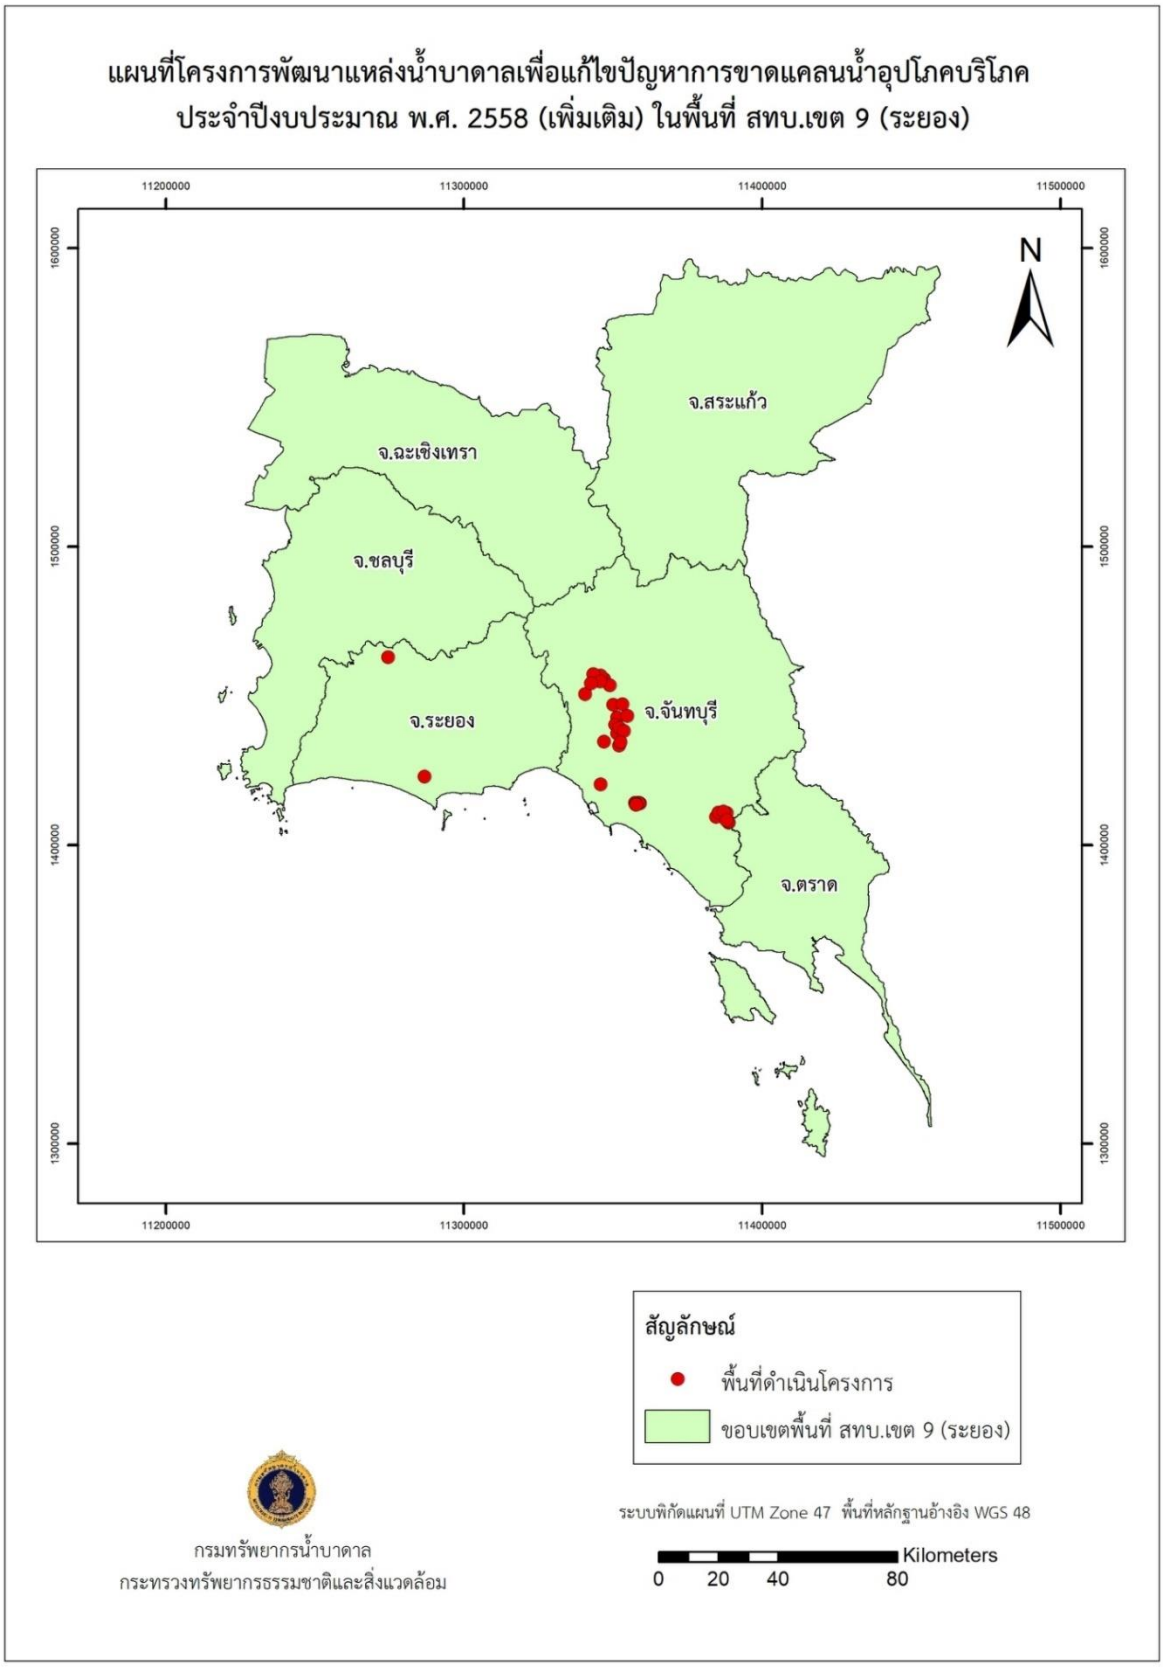

รูปที่ 10 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี

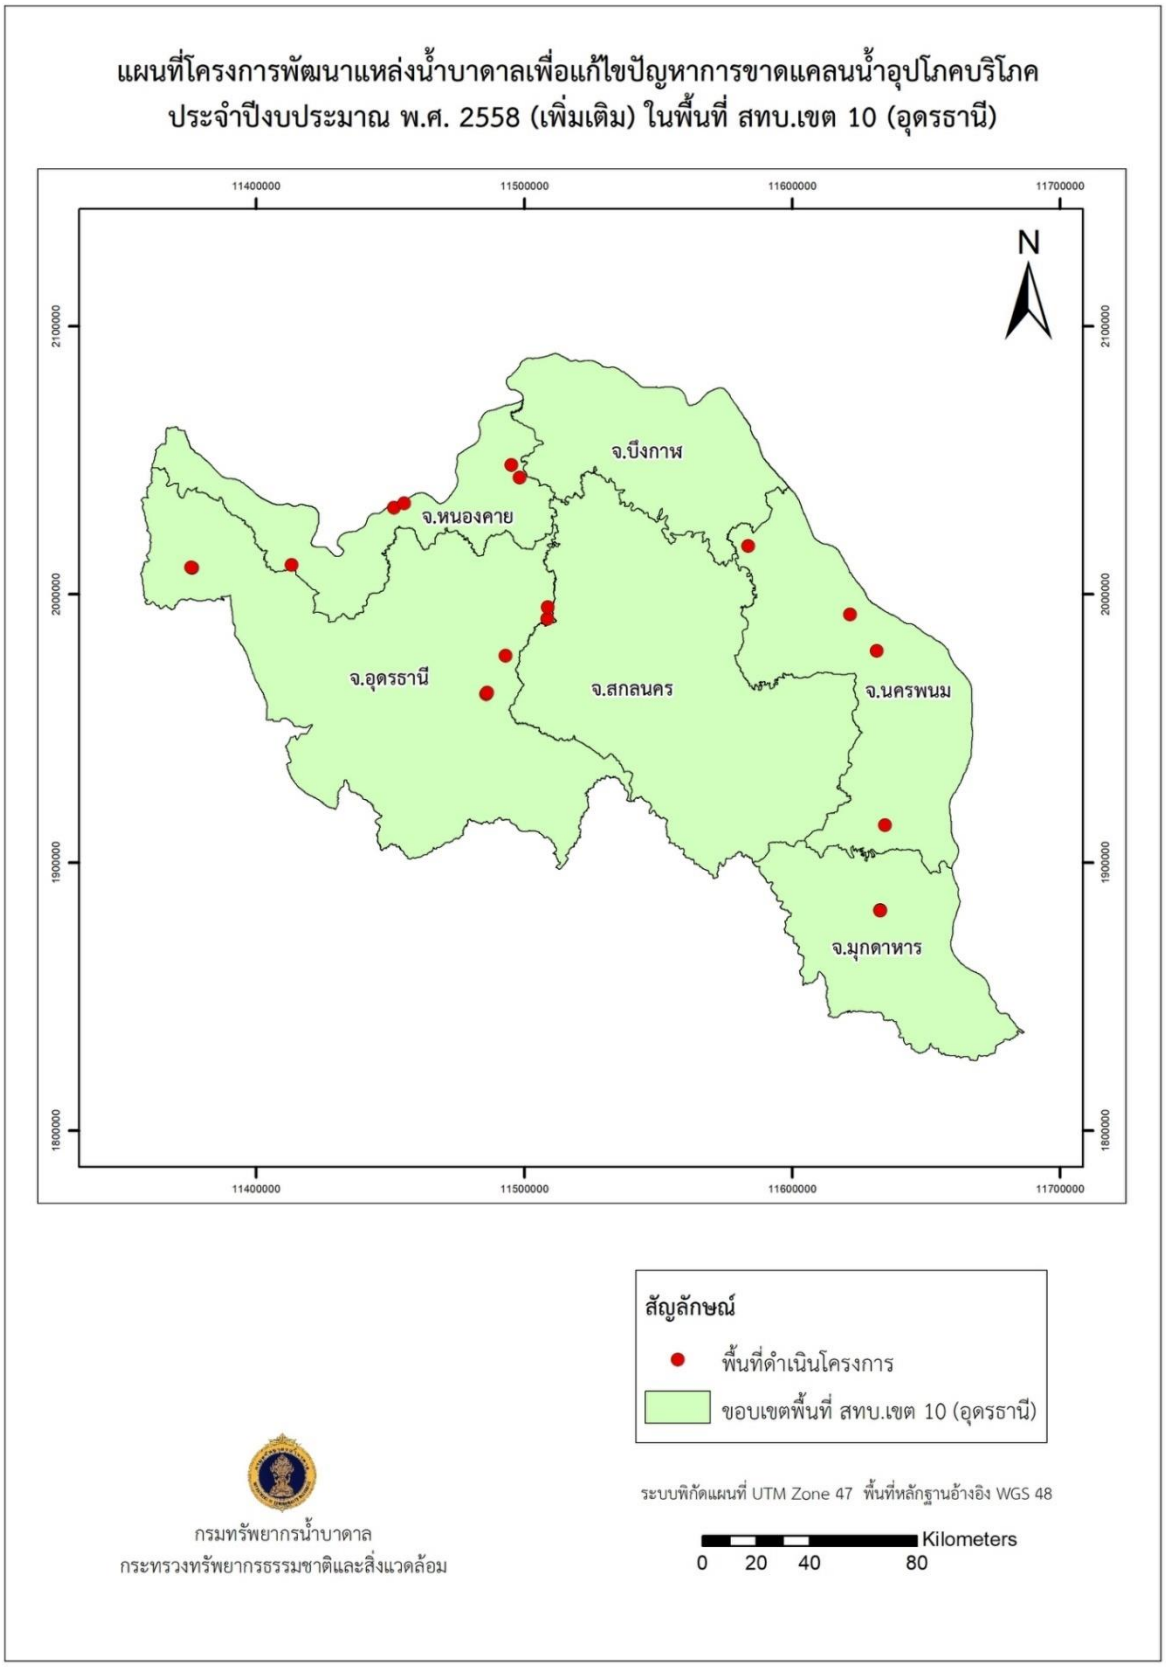

รูปที่ 11 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลราชธานี

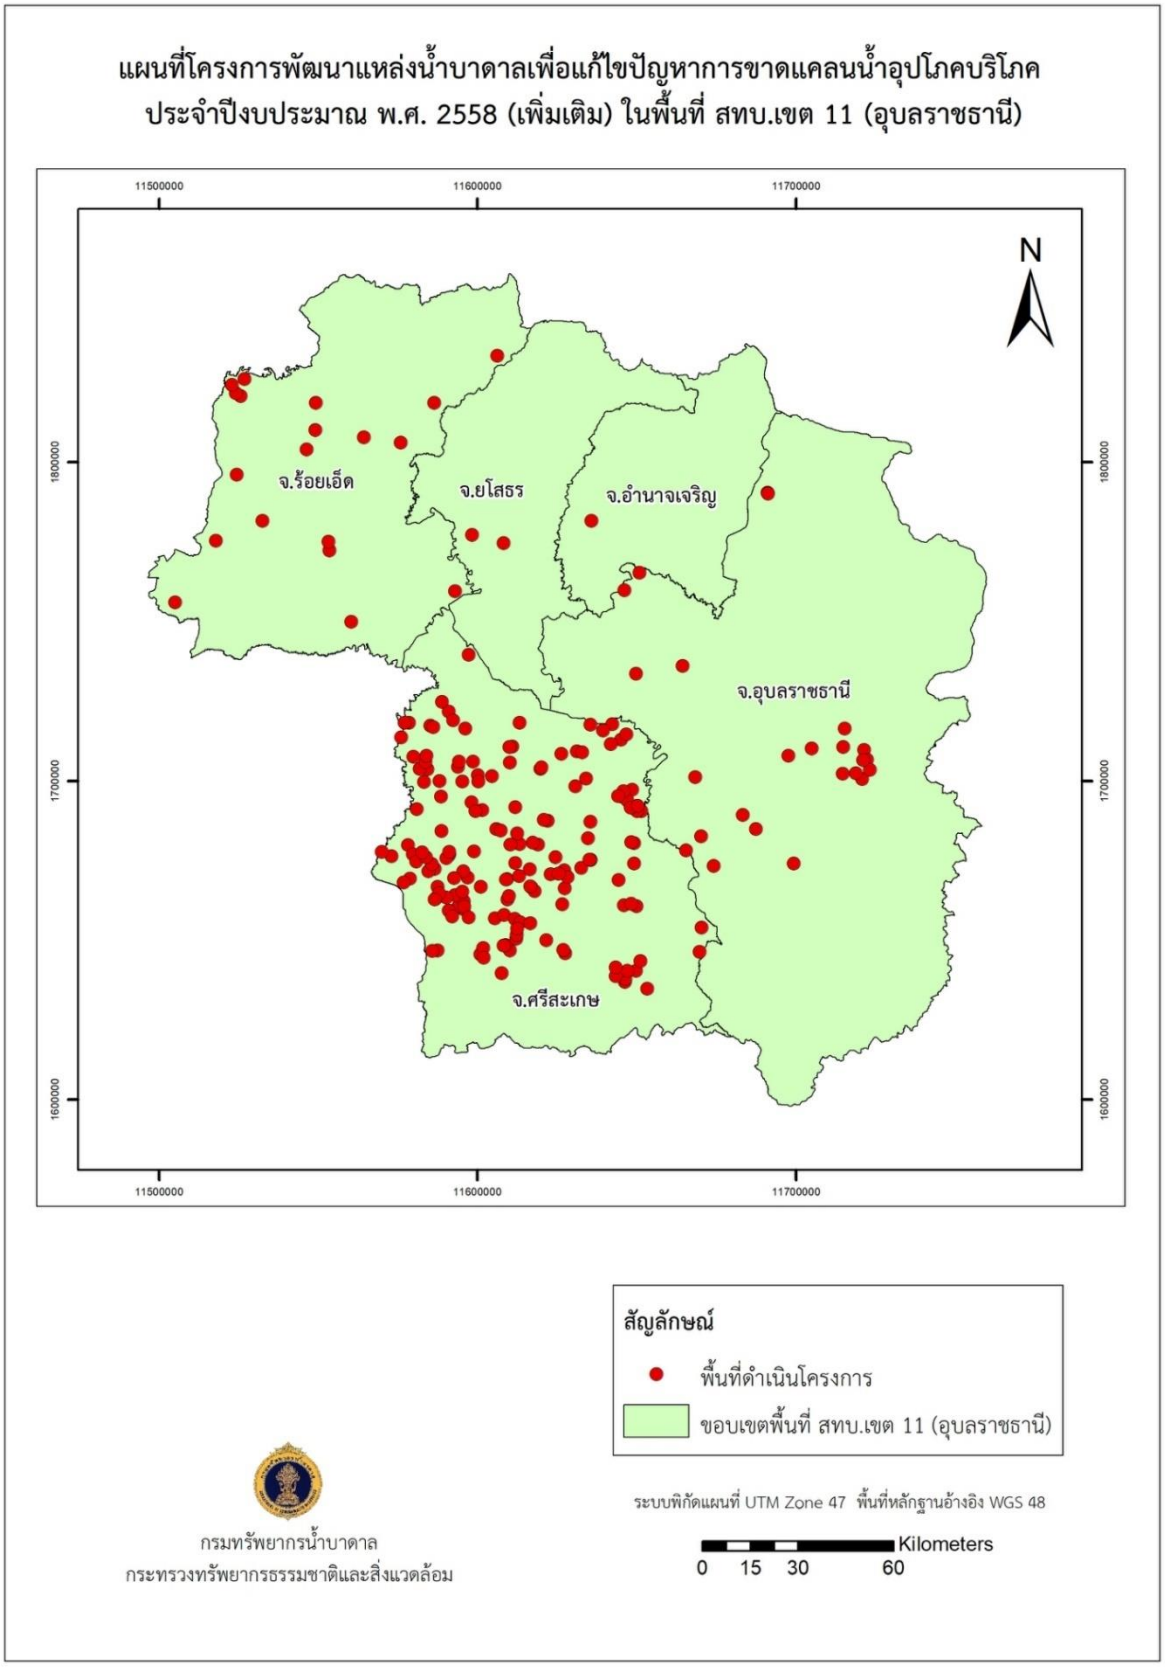

รูปที่ 12 ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา

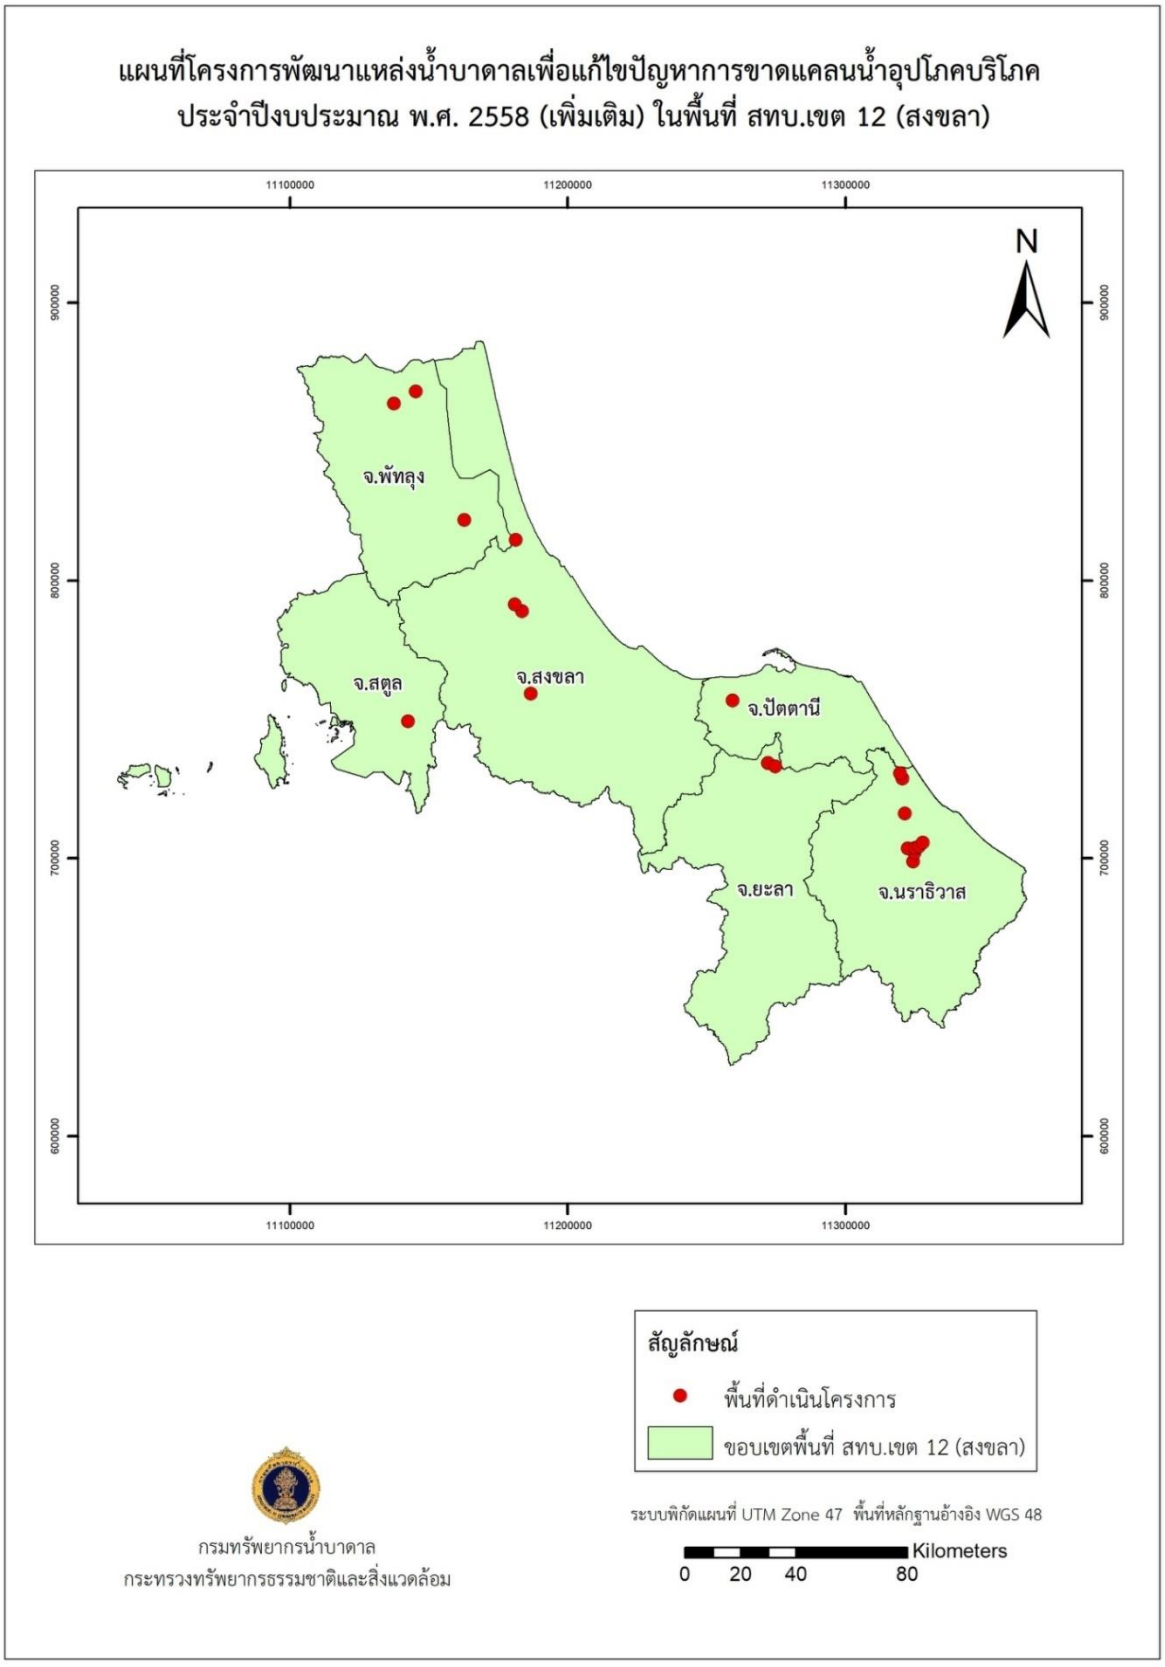

18.2 สรุปผลการเบิกจ่าย

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)			เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)				คงเหลือ
งบประมาณที่ได้รับ	โอนเปลี่ยนแปลงรายการ (ปี61)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	เบิกจ่ายแหล่งของเงิน 2558	เบิกจ่ายแหล่งของเงิน 2559	เบิกจ่ายแหล่งของเงิน 2561	รวม	ส่งคืนคลัง (บาท)
713,600,000.00	7,201,151.18	713,600,000.00	365,836,514.12	214,361,739.35	3,219,948.96	583,418,202.43	130,181,797.57

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ผลการดำเนินงานรายแห่ง จำนวน 892 แห่ง

ผลการดำเนินงาน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2558
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แผนงาน 892 รายการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 92 แห่ง ผลงาน 800 แห่ง

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
1	09007C1001410001	บ้านบางปูเลย	5	ป่าซาง	แม่จัน	เชียงราย	5801H041	583477	2230903	1	1	1	4.00	90.00	80.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
2	09007C1001410002	บ้านแม่ห่าง	7	ป่าจี้	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	5901B040	554154	2126845	1	1	1	4.00	15.00	15.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
3	09007C1001410003	บ้านป่าฮ่างงาม	3	ทานตะวัน	พาน	เชียงราย	5801H035	580833	2153265	1	1	1	6.00	112.00	112.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
4	09007C1001410004	บ้านไร่	2	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย	5901H003	550159	2172845	1	1	1	10.00	86.00	86.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
5	09007C1001410005	บ้านป่าบง	4	แม่สรวย	แม่สรวย	เชียงราย	5901H002	553962	2173131	1	1	1	10.00	96.00	96.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
6	09007C1001410006	บ้านร่องเจริญ	7	แม่สรวย	แม่สรวย	เชียงราย	5901H004	556548	2171878	1	1	1	7.00	80.00	80.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
7	09007C1001410007	บ้านป่างห้า	1	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย	5801B155	603942	2257420	1	1	1	5.00	72.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
8	09007C1001410008	บ้านป่าแดง	5	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย	5801B154	599936	2260461	1	1	1	10.00	78.00	76.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
9	09007C1001410009	บ้านอ่วงคำ	7	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย	5801B152	602080	2258078	1	1	1	5.00	90.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
10	09007C1001410010	บ้านศรีชัยภูมิ	10	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย	5801B153	600028	2260030	1	1	1	8.00	90.00	80.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
11	09007C1001410011	บ้านห้วยสลัก	21	ป่าแดด	แม่สรวย	เชียงราย	5901B033	540622	2179892	1	1	1	4.00	72.00	72.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
12	09007C1001410012	บ้านทุ่งเกลี้ยง	6	ศรีเมืองชุม	แม่สาย	เชียงราย												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
13	09007C1001410013	บ้านศรีป่าสัก	9	ศรีเมืองชุม	แม่สาย	เชียงราย												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
14	09007C1001410014	บ้านศรีดอนเรือง	5	เมืองชุม	เวียงชัย	เชียงราย	5801B157	599521	2199860	1	1	1	8.00	80.00	80.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
15	09007C1001410015	บ้านเวียงใต้	3	เวียง	เชียงแสน	เชียงราย	5801B156	612661	2241527	1	1	1	10.00	40.00	40.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
16	09007C1001410016	บ้านป่ารวก	4	ธารทอง	พาน	เชียงราย	5801H032	574648	2179219	1	1	1	10.00	60.00	32.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
17	09007C1001410017	บ้านสันมะแฟน	6	ธารทอง	พาน	เชียงราย	5801H033	571055	2178817	1	1	1	10.00	30.00	30.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
18	09007C1001410018	บ้านป่ารวกใต้	9	ธารทอง	พาน	เชียงราย	5801H031	575235	2179385	1	1	1	10.00	32.00	32.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
19	09007C1001410019	บ้านผาวี	8	ป่าหุ่ง	พาน	เชียงราย	6001B009	565906	2145864	1	1	1	8.00	24.00	20.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
20	09007C1001410020	บ้านหนองหม้อ	9	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5801H037	580480	2195225	1	1	1	7.00	48.00	48.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
21	09007C1001410021	บ้านป่าตึง	10	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5801H040	578707	2194601	1	1	1	5.00	38.00	38.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
22	09007C1001410022	บ้านหนองหม้อใหม่	19	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5801H038	579763	2195286	1	1	1	10.00	32.00	32.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
23	09007C1001410023	บ้านไพรี่งาม	20	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5801H036	581948	2190009	1	1	1	10.00	52.00	52.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
24	09007C1001410024	บ้านประตูล้อ	21	ป่าอ้อดอนชัย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5801H039	578255	2195725	1	1	1	10.00	54.00	54.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
25	09007C1001410025	บ้านป่ากว๋าว	1	แม่ไร่	แม่จัน	เชียงราย												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
26	09007C1001410026	บ้านดงมะตื่น	5	แม่ไร่	แม่จัน	เชียงราย												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
27	09007C1001410027	บ้านห้วยหวาย	2	ดงมะตะ	แม่ลาว	เชียงราย	5901B001	572561	2184762	1	1	1	8.00	42.00	42.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
28	09007C1001410028	บ้านร่องศาลา	3	ดงมะตะ	แม่ลาว	เชียงราย	5801B159	575915	2183478	1	1	1	8.00	60.00	60.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
29	09007C1001410029	บ้านท่าสันกลาง	14	ดงมะตะ	แม่ลาว	เชียงราย	5901B002	571818	2180043	1	1	1	8.00	40.00	40.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
30	09007C1001410030	บ้านร่องคตสามัคคี	10	ทานตะวัน	พาน	เชียงราย	5901H001	581174	2152350	1	1	1	2.00	124.00	124.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
31	09007C1001410031	บ้านเชื่อนแก้ว	9	ท่าสาย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5801B158	587810	2189481	1	1	1	8.00	45.00	45.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
32	09007C1001410032	บ้านร่องลึก	13	สันกลาง	พาน	เชียงราย	5801B034	576229	2165825	1	1	1	8.00	87.00	87.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
33	09007C1001410033	บ้านแควัวคำ	12	แม่ยาว	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5901B031	568550	2208970	1	1	1	4.00	50.00	48.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
34	09007C1001410034	บ้านออบเสือแหวน	15	แม่ยาว	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5901B032	565303	2213030	1	1	1	7.00	36.00	36.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
35	09007C1001410035	บ้านใหม่บัวแดง	15	แม่ข้าวต้ม	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5901B003	598277	2215084	1	1	1	4.00	54.00	54.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
36	09007C1001410036	บ้านห้วยอ้อม	8	แม่ข้าวต้ม	เมืองเชียงราย	เชียงราย	5901B004	603733	2222794	1	1	1	8.00	75.00	75.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
37	09007C1001410037	บ้านห้วยอ้อมใหญ่	9	แม่ข้าวต้ม	เมืองเชียงราย	เชียงราย												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
38	09007C1001410038	บ้านเชียงดาว	6	เชียงดาว	เชียงดาว	เชียงใหม่	5901A037	508064	2146348	1	1	1	3.00	44.00	44.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
39	09007C1001410039	บ้านบวกห้า	18	บ้านแปะ	จอมทอง	เชียงใหม่	5801F135	562710	2012231	1	1	1	10.00	108.00	104.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
40	09007C1001410040	บ้านศรีสะอาด	15	เชียงดาว	เชียงดาว	เชียงใหม่												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
41	09007C1001410041	บ้านทุ่งข้าวพวง	3	ทุ่งข้าวพวง	เชียงดาว	เชียงใหม่	5801J034	495490	2161219	1	1	1	4.00	60.00	52.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
42	09007C1001410042	บ้านม่วงโม้	9	เมืองงาย	เชียงดาว	เชียงใหม่	5801J032	495260	2152889	1	1	1	3.00	102.00	100.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
43	09007C1001410043	บ้านหนองบัว	11	เมืองงาย	เชียงดาว	เชียงใหม่	5801J033	495270	2152963	1	1	1	3.00	90.00	90.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
44	09007C1001410044	บ้านปางตองนอก	11	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	5801J031	495114	2141551	1	1	1	2.00	90.00	88.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
45	09007C1001410045	บ้านห้วยโจ้	4	แม่นะ	เชียงดาว	เชียงใหม่												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
46	09007C1001410046	บ้านสบอ้อ	7	แม่นะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	5801J035	496734	2134411	1	1	1	6.00	42.00	40.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
47	09007C1001410047	บ้านแก่งปันเต๊า	10	แม่นะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	5801G269	495639	2132386	1	1	1	2.00	120.00	120.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
48	09007C1001410048	บ้านห้วยโจ้	4	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่	5801G274	517242	2187026	1	1	1	8.00	78.00	64.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
49	09007C1001410049	บ้านหล่ายฝาง	6	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่	5801G273	517269	2186213	1	1	1	7.00	66.00	60.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
50	09007C1001410050	บ้านสันต้นเปา	7	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่	5801G270	516251	2188360	1	1	1	6.00	80.00	60.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
51	09007C1001410051	บ้านใหม่หล่ายฝาง	10	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่	5801G272	517374	2187974	1	1	1	7.00	84.00	60.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
52	09007C1001410052	บ้านห้วยโจ้เหนือ	13	แม่ข่า	ฝาง	เชียงใหม่	5801G271	517117	2186513	1	1	1	7.00	72.00	60.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
53	09007C1001410053	บ้านแม่งอนสันติสุข	14	แม่งอน	ฝาง	เชียงใหม่	5807C036	516332	2189553	1	1	1	15.00	68.00	56.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
54	09007C1001410054	บ้านหนองยาวใต้	16	แม่สูน	ฝาง	เชียงใหม่	5807C037	518531	2195481	1	1	1	12.00	80.00	72.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
55	09007C1001410055	บ้านหนองยาวเหนือ	17	แม่สูน	ฝาง	เชียงใหม่	5807C038	517793	2196469	1	1	1	8.00	102.00	98.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
56	09007C1001410056	บ้านหนองอึ่ง	3	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
57	09007C1001410057	บ้านสวนดอก	4	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	5807C040	522165	2203991	1	1	1	8.00	120.00	114.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
58	09007C1001410058	บ้านต้นหนุน	5	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	5807I035	522514	2202230	1	1	1	30.00	84.00	84.00	150	131,400				แล้วเสร็จ
59	09007C1001410059	บ้านแม่ใจใต้	7	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	5807I034	521373	2202963	1	1	1	20.00	104.00	104.00	150	87,600				แล้วเสร็จ
60	09007C1001410060	บ้านสันกลาง	5	ป่าไหน่	พร้าว	เชียงใหม่	5807I032	522335	2147313	1	1	1	10.00	84.00	84.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
61	09007C1001410061	บ้านขามสุ่มนอก	6	ลันทราย	พร้าว	เชียงใหม่	58017I033	520614	2145991	1	1	1	15.00	90.00	90.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
62	09007C1001410062	บ้านแม่ปาคี	12	ลันทราย	พร้าว	เชียงใหม่	5807I036	517985	2157652	1	1	1	12.00	68.00	68.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
63	09007C1001410063	บ้านแม่ทัง	5	หางดง	ฮอด	เชียงใหม่	5801F137	457560	2007562	1	1	1	5.00	80.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
64	09007C1001410064	บ้านโค้งงาม	7	หางดง	ฮอด	เชียงใหม่	5801F136	458955	2000565	1	1	1	8.00	68.00	68.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
65	09007C1001410065	บ้านทุ่งฟ้าบด	1	มะขามหลวง	ลันป่าตอง	เชียงใหม่												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
66	09007C1001410066	บ้านพนัง	3	ทุ่งสะโตก	ลันป่าตอง	เชียงใหม่	5807G018	484188	2056904	1	1	1	10.00	36.00	36.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
67	09007C1001410067	บ้านตาลใต้	3	บ้านตาล	ฮอด	เชียงใหม่	5801F134	462980	2000815	1	1	1	8.00	120.00	120.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
68	09007C1001410068	บ้านป๊อก	5	สะเมิงเหนือ	สะเมิง	เชียงใหม่	5801A028	474509	2092975	1	1	1	8.00	44.00	40.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
69	09007C1001410069	บ้านยางเปียง	2	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่	5801A026	446025	1965892	1	1	1	5.00	60.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
70	09007C1001410070	บ้านยางครก	7	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่	5801A025	442729	1967910	1	1	1	6.00	60.00	56.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
71	09007C1001410071	บ้านดอย	13	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่	5801A024	432600	1966342	1	1	1	4.00	92.00	92.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
72	09007C1001410072	บ้านยางเปียงใต้	16	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่	5801A027	446878	1965347	1	1	1	5.00	80.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
73	09007C1001410073	บ้านปากนาย	17	นาทะนุง	นาหมื่น	น่าน												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
74	09007C1001410074	บ้านนาน้อย	4	นาน้อย	นาน้อย	น่าน	5807H038	681391	2025488	1	1	1	3.00	120.00	114.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
75	09007C1001410075	บ้านใหม่	8	ล้าน	เวียงสา	น่าน	5807A024	684723	2049903	1	1	1	5.00	54.00	54.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
76	09007C1001410076	บ้านพระเนตร	2	ล้าน	เวียงสา	น่าน	5807A023	685249	2049673	1	1	1	4.00	72.00	72.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
77	09007C1001410077	บ้านโปร่ง	7	ล้าน	เวียงสา	น่าน	5807A025	684017	2051273	1	1	1	8.00	82.00	82.00	150	35,040				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อบ่อ	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./ชม.	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
														ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี				
78	09007C1001410078	บ้านป่าหัด	2	ปัว	ปัว	น่าน												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
79	09007C1001410079	บ้านนาป่าน	1	สถาน	ปัว	น่าน												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
80	09007C1001410080	บ้านห้วนสาวแลว	8	ไชยวัฒนา	ปัว	น่าน												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
81	09007C1001410081	บ้านสกาดกลาง	2	สกาด	ปัว	น่าน												1	ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ		ยกเลิก
82	09007C1001410082	บ้านสกาดเหนือ	1	สกาด	ปัว	น่าน												1	ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ		ยกเลิก
83	09007C1001410083	บ้านสร้อยพร้าว	5	พระธาตุ	เชียงกลาง	น่าน												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
84	09007C1001410084	บ้านห้วยแก้ว	7	พระธาตุ	เชียงกลาง	น่าน	5807A029	699794	2139247	1	1	1	3.00	102.00	102.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
85	09007C1001410085	บ้านป่าเปือย	7	ปอน	ทุ่งช้าง	น่าน	5807H040	702382	2158954	1	1	1	3.00	60.00	60.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
86	09007C1001410086	บ้านใหม่	5	ปอน	ทุ่งช้าง	น่าน												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
87	09007C1001410087	บ้านแม่ต๋ำน้อย	18	แม่กา	เมืองพะเยา	พะเยา	5901T030	598592	2097617	1	1	1	5.00	85.00	85.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
88	09007C1001410088	บ้านแม่ต๋ำบุญโยง	11	แม่กา	เมืองพะเยา	พะเยา	5801T155	594513	2113787	1	1	1	5.00	90.00	90.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
89	09007C1001410089	บ้านแม่ต๋ำบุญโยง	8	แม่กา	เมืองพะเยา	พะเยา	5801T154	595449	2112086	1	1	1	5.00	90.00	90.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
90	09007C1001410090	บ้านปางพริก	3	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	5901T002	654446	2135684	1	1	1	4.00	85.00	85.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
91	09007C1001410091	บ้านห้วยทรายคำ	8	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา	5901T028	586412	2123775	1	1	1	5.00	102.00	102.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
92	09007C1001410092	บ้านร่องไผ่ใต้	10	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา	5801T156	588889	2124247	1	1	1	7.00	96.00	96.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
93	09007C1001410093	บ้านร่องไผ่เหนือ	9	บ้านต๋อม	เมืองพะเยา	พะเยา	5801T157	588059	2123797	1	1	1	8.00	120.00	120.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
94	09007C1001410094	บ้านห้วยต้นตุ้มใต้	6	ห้วยลาน	ดอกคำใต้	พะเยา	5901T026	608173	2134926	1	1	1	5.00	126.00	126.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
95	09007C1001410095	บ้านจุนรัชดา	17	จุน	จุน	พะเยา	5801T162	622185	2136292	1	1	1	7.00	108.00	108.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
96	09007C1001410096	บ้านใหม่กาญจนา	15	จุน	จุน	พะเยา	5801T163	223770	2136080	1	1	1	8.00	66.00	66.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
97	09007C1001410097	บ้านสันทราย	3	แม่ปืม	เมืองพะเยา	พะเยา	5801T159	588921	2136727	1	1	1	6.00	102.00	102.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
98	09007C1001410098	บ้านแม่สุก	2	แม่สุก	แม่ใจ	พะเยา	5801T158	583472	2137449	1	1	1	7.00	108.00	108.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
99	09007C1001410099	บ้านทุ่งรวงทอง	9	แม่ใจ	แม่ใจ	พะเยา	5801T160	589161	2137991	1	1	1	6.00	64.00	64.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
100	09007C1001410100	บ้านสิบสองพัฒนา	7	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	5901T001	647730	2144208	1	1	1	8.00	54.00	54.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
101	09007C1001410101	บ้านปางค่า	1	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	5901T005	651029	2138680	1	1	1	2.00	80.00	80.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
102	09007C1001410102	บ้านปางมะโอ	4	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	5901T004	661076	2139913	1	1	1	6.00	54.00	54.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
103	09007C1001410103	บ้านสันสลี	7	เจริญราษฎร์	แม่ใจ	พะเยา	5901T027	584105	2144367	1	1	1	5.00	140.00	140.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
104	09007C1001410104	บ้านดงบุญนาค	7	บ้านเหล่า	แม่ใจ	พะเยา	5801T161	586146	2146950	1	1	1	6.00	64.00	64.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
105	09007C1001410105	บ้านฝก	2	บ้านฝก	แม่ใจ	พะเยา	5801D159	577937	2147778	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
106	09007C1001410106	บ้านบ้านฝกดอย	4	บ้านฝก	แม่ใจ	พะเยา	5801D158	581108	2147585	1	1	1	6.00	108.00	108.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
107	09007C1001410107	บ้านบ้านฝกใต้	5	บ้านฝก	แม่ใจ	พะเยา	5801D157	581573	2147761	1	1	1	3.00	152.00	152.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
108	09007C1001410108	บ้านสระวังทอง	10	บ้านฝก	แม่ใจ	พะเยา	5801D155	584658	2149512	1	1	1	10.00	124.00	124.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
109	09007C1001410109	บ้านแม่เย็นนอก	8	บ้านฝก	แม่ใจ	พะเยา												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
110	09007C1001410110	บ้านแม่เย็นใต้	1	บ้านฝก	แม่ใจ	พะเยา												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
111	09007C1001410111	บ้านหนองสระ	6	บ้านฝก	แม่ใจ	พะเยา	5801D156	584908	2150042	1	1	1	10.00	120.00	120.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
112	09007C1001410112	บ้านทุ่งตี้ว	6	ภูซาง	ภูซาง	พะเยา	5901T031	641121	2173139	1	1	1	2.00	122.00	122.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
113	09007C1001410113	บ้านฮวด	3	ภูซาง	ภูซาง	พะเยา	5901T009	647637	2177465	1	1	1	6.00	60.00	60.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
114	09007C1001410114	บ้านดูนิเกตุ	1	ห้วยหม้าย	สอง	แพร่	5801M044	623256	2038821	1	1	1	5.00	72.00	72.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
115	09007C1001410115	บ้านดูนิเกตุ	9	ห้วยหม้าย	สอง	แพร่	5801M045	622731	2039343	1	1	1	10.00	60.00	60.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
116	09007C1001410116	บ้านไร่ (ดงสะงัด)	6	แม่สะเรียง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	5801A023	388003	2006015	1	1	1	6.00	30.00	30.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
117	09007C1001410117	บ้านโต้ง	1	แม่พริก	แม่พริก	ลำปาง	5807G021	512100	1929506	1	1	1	10.00	42.00	32.00	150	43,800				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อบ่อ	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./ชม.	ความลึก (เมตร) ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	ครัวเรือน รับประโยชน์	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./ปี	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
118	09007C1001410118	บ้านแม่วะศรีบุญเรือง	6	แม่วะ	เถิน	ลำปาง												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
119	09007C1001410119	บ้านนิคมเขต4	4	นิคมพัฒนา	เมืองลำปาง	ลำปาง	5801D149	560322	2034117	1	1	1	15.00	176.00	176.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
120	09007C1001410120	บ้านวังสัก	10	แจ้ห่ม	แจ้ห่ม	ลำปาง	5801D150	562971	2070449	1	1	1	12.00	132.00	132.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
121	09007C1001410121	บ้านสบฟ้า	7	แจ้ห่ม	แจ้ห่ม	ลำปาง	5801D151	562243	2069164	1	1	1	10.00	90.00	84.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
122	09007C1001410122	บ้านบนพุ่ง	9	พุ่งฮั้ว	วังเหนือ	ลำปาง	5801D152	567243	2125966	1	1	1	10.00	92.00	92.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
123	09007C1001410123	บ้านแม่พรายเงิน	2	พุ่งฮั้ว	วังเหนือ	ลำปาง	5801D153	567342	2127666	1	1	1	10.00	92.00	92.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
124	09007C1001410124	บ้านปู	3	ลี้	ลี้	ลำพูน												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
125	09007C1001410125	บ้านบ่อแฮ้ว	3	ต้นธง	เมืองลำพูน	ลำพูน	5801G017	498453	2052150	1	1	1	20.00	60.00	60.00	150	87,600				แล้วเสร็จ
126	09007C1001410126	บ้านโคกจันทน์	5	ไพนางคำตก	สรรพยา	ชัยนาท	5802H016	636534	1670150	1	1	1	10.00	44.00	44.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
127	09007C1001410127	บ้านบางเสวย	4	ไพนางคำตก	สรรพยา	ชัยนาท	5802F040	636858	1670064	1	1	1	15.00	46.00	46.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
128	09007C1001410128	บ้านคงคาราม	3	ไพนางคำตก	สรรพยา	ชัยนาท	5802H015	638062	1669316	1	1	1	10.00	48.00	48.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
129	09007C1001410129	บ้านประจันตะคีรี	6	นาขอม	ไพศาลี	นครสวรรค์	6102K058	689513	1742057	1	1	1	1.79	122.00	122.00	150	7,840			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
130	09007C1001410130	บ้านตะกรุดแรด	16	หนองบัว	หนองบัว	นครสวรรค์	5802F038	685605	1751321	1	1	1	5.00	62.00	62.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
131	09007C1001410131	บ้านหนองหมัน	15	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	5802H013	589146	1568046	1	1	1	10.00	50.00	48.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
132	09007C1001410132	บ้านบางบอน	5	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	5802H014	612465	1579061	1	1	1	10.00	134.00	134.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
133	09007C1001410133	บ้านไผ่ช่องลม	7	บางเลน	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	5802I035	613874	1566171	1	1	1	15.00	132.00	132.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
134	09007C1001410134	บ้านคลัง	7	บ้านคลัง	บางบาล	พระนครศรีอยุธยา	6102K059	656713	1585040	1	1	1	12.00	164.00	164.00	150	52,560			ไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
135	09007C1001410135	บ้านคลองหนึ่ง	2	ทรายมูล	องครักษ์	นครนายก												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
136	09007C1001410136	บ้านวังกวาง	11	วังท่าช้าง	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	5803D051	811456	1521255	1	1	1	8.00	90.00	90.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
137	09007C1001410137	บ้านหอย	1	บ้านหอย	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี	5803L046	777093	1549088	1	1	1	3.00	150.00	150.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
138	09007C1001410138	บ้านเกาะแดง	7	บ้านหอย	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
139	09007C1001410139	บ้านแปลงประดู่	2	หนองโพรง	ศรีมหาโพธิ	ปราจีนบุรี	5803D050	770495	1541105	1	1	1	5.00	110.00	110.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
140	09007C1001410140	บ้านโนนห้อม	4	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	5803L045	767725	1560113	1	1	1	10.00	80.00	80.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
141	09007C1001410141	บ้านเหล่าบุตร	6	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	5803D046	765567	1560428	1	1	1	6.00	90.00	90.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
142	09007C1001410142	บ้านขอม	8	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	5803L044	764157	1559365	1	1	1	2.00	90.00	90.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
143	09007C1001410143	บ้านบ่วงแฝก	10	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	5803D047	766627	1563368	1	1	1	8.00	80.00	80.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
144	09007C1001410144	บ้านทุ่งตะลุมพุก	12	โนนห้อม	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	5803D048	768175	1560798	1	1	1	8.00	80.00	80.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
145	09007C1001410145	บ้านซับไพเราะ	3	ซับไม้แดง	บึงสามพัน	เพชรบูรณ์	5803H047	707993	1740302	1	1	1	6.00	150.00	150.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
146	09007C1001410146	บ้านบ่อตาลัก	10	ซับไม้แดง	บึงสามพัน	เพชรบูรณ์	5803H049	705590	1739486	1	1	1	6.00	60.00	60.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
147	09007C1001410147	บ้านซับตะเคียน	8	ซับสมอทอด	บึงสามพัน	เพชรบูรณ์	5803H050	710919	1739889	1	1	1	4.00	50.00		150	17,520				แล้วเสร็จ
148	09007C1001410148	บ้านท่ากกตาล	6	ดงมูลเหล็ก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	5803H051	736161	1829172	1	1	1	10.00	120.00		150	43,800				แล้วเสร็จ
149	09007C1001410149	บ้านพลำ	6	ป่าเลา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	5803E038	725234	1816127	1	1	1	4.00	72.00	72.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
150	09007C1001410150	บ้านใหม่ซับเจริญ	8	ซับสมบูรณ์	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	5803H044	711765	1727845	1	1	1	7.00	90.00		150	30,660				แล้วเสร็จ
151	09007C1001410151	บ้านซับโอบ	8	ภูน้ำหยด	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	5803H045	710528	1714932	1	1	1	6.00	120.00		150	26,280				แล้วเสร็จ
152	09007C1001410152	บ้านวังทองสามัคคี	9	วังใหญ่	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	5803H046	710555	1725399	1	1	1	6.00	54.00		150	26,280				แล้วเสร็จ
153	09007C1001410153	บ้านห้วยมะยม	6	นาแซง	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	5803E036	739327	1867222	1	1	1	10.00	108.00	108.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
154	09007C1001410154	บ้านหล่มเก่า	5	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	5803E034	738549	1867762	1	1	1	10.00	102.00	102.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
155	09007C1001410155	บ้านพรวน	9	หล่มเก่า	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	5803E035	739327	1867222	1	1	1	7.00	120.00	120.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
156	09007C1001410156	บ้านบุ่งน้ำเต้า	1	บุ่งน้ำเต้า	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	5803E037	730793	1842641	1	1	1	6.00	80.00	80.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
157	09007C1001410157	บ้านโคกปรง	7	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	5803E040	730559	1739939	1	1	1	4.00	90.00	90.00	150	17,520			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
158	09007C1001410158	สำนักสงฆ์เอียมสำอางค์ บ้านชนิดตำเที่ยง	2	ริมสีม่วง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	5803E039	720588	1829159	1	1	1	12.00	120.00	120.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
159	09007C1001410159	บ้านกุดหว้า	2	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	5804E046	382963	1834894	1	1	1	4.00	62.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
160	09007C1001410160	บ้านดอนอุมรัว	8	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	5804E047	422130	1826468	1	1	1	7.00	62.00	60.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
161	09007C1001410161	บ้านบัวขาว	9	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	5804E054	393188	1826328	1	1	1	8.00	62.00	60.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
162	09007C1001410162	บ้านโนนสวรรค์	10	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	5804E048	400320	1828258	1	1	1	5.00	54.00	52.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
163	09007C1001410163	บ้านบัวขาว	15	บัวขาว	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	5804E053	397825	1831382	1	1	1	20.00	62.00	60.00	150	87,600				แล้วเสร็จ
164	09007C1001410164	บ้านคำดอกซ้อน	7	นามะเขือ	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์	5804E050	354455	1845293	1	1	1	10.00	48.00	46.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
165	09007C1001410165	บ้านหนองแสงใหม่	3	สำราญใต้	สามชัย	กาฬสินธุ์	5804E051	336789	1858324	1	1	1	10.00	62.00	60.00	150	43,800			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
166	09007C1001410166	บ้านหนองป่าอ้อย	1	ลำห้วยหลัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	5804E052	371247	1844332	1	1	1	5.00	62.00	60.00	150	21,900			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
167	09007C1001410167	บ้านโนนทับช้าง	5	นิคมห้วยผึ้ง	ห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	5804E049	382947	1834894	1	1	1	8.00	56.00	54.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
168	09007C1001410168	บ้านจรเข้สงเคราะห์	2	พุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	5804B041	254723	1831560	1	1	1	5.00	80.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
169	09007C1001410169	บ้านโนนอินทร์แปลง	3	พุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	5804B040	202313	1853062	1	1	1	5.00	72.00	72.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
170	09007C1001410170	บ้านทรัพย์สมบูรณ์	4	พุ่งโป่ง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	5804B042	251723	1852000	1	1	1	15.00	50.00	50.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
171	09007C1001410171	บ้านหนองแวง	16	บรบือ	บรบือ	มหาสารคาม	5804B043	299993	1776294	1	1	1	7.00	90.00	90.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
172	09007C1001410172	บ้านไก่เฒ่า	20	หัวเรือ	วาปีปทุม	มหาสารคาม	5804B044	328373	1738169	1	1	1	15.00	36.00	36.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
173	09007C1001410173	บ้านป่าหวายพัฒนา	6	นาด้วง	นาด้วง	เลย	5804B045	814330	1936031	1	1	1	10.00	26.00	26.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
174	09007C1001410174	บ้านราษฎร์ประดิษฐ์	8	นาด้วง	นาด้วง	เลย	5804B046	184105	1934835	1	1	1	6.00	90.00	90.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
175	09007C1001410175	บ้านสุขสำราญ	13	ครบุรีใต้	ครบุรี	นครราชสีมา	5805A030	194295	1609216	1	1	1	3.00	103.00	103.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
176	09007C1001410176	บ้านโนนพยอม	4	ช้างทอง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	5805A031	210805	1661271	1	1	1	7.00	31.00	25.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
177	09007C1001410177	บ้านหนองตะคลอง	1	หนองบัวศาลา	เมือง	นครราชสีมา	5805A033	191051	1653625	1	1	1	8.00	53.00	53.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
178	09007C1001410178	บ้านแฝก	3	สามเมือง	สีดา	นครราชสีมา	5805A032	235737	1726756	1	1	1	7.00	20.00	20.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
179	09007C1001410179	บ้านหินลาด	4	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	5805A035	794194	1751958	1	1	1	7.00	32.00	32.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
180	09007C1001410180	บ้านเทพนิมิตร	12	นายางกลัก	เทพสถิต	ชัยภูมิ												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
181	09007C1001410181	บ้านใหม่หนองแดง	9	ซับบน	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	5805A034	796374	1758957	1	1	1	2.00	92.00	92.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
182	09007C1001410182	บ้านโนนมะยาง	6	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	5805B028	310234	1590991	1	1	1	4.00	74.00	68.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
183	09007C1001410183	บ้านเกษตรสมบูรณ์	11	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	5805B027	310311	1591162	1	1	1	5.00	68.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
184	09007C1001410184	บ้านไทยนิยม	17	บักได	พนมดงรัก	สุรินทร์	5905A043	325663	1592924	1	1	1	2.00	68.00	68.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
185	09007C1001410185	บ้านพนมเดิน	3	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	5805B029	315003	1595712	1	1	1	5.00	50.00	50.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
186	09007C1001410186	บ้านปลิกพัฒนา	9	ประทัดบุ	ปราสาท	สุรินทร์	5905C049	371039	1638521	1	1	1	10.00	50.00	46.00	150	43,800			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
187	09007C1001410187	บ้านใหม่พัฒนา	5	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	5805B025	311684	1600280	1	1	1	5.00	78.00	72.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
188	09007C1001410188	บ้านศลองเจริญ	12	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	5805D026	328323	1659974	1	1	1	10.00	62.00	62.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
189	09007C1001410189	บ้านประดู่	8	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	5805D029	333507	1600524	1	1	1	3.00	54.00	54.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
190	09007C1001410190	บ้านพาชื่น	10	กาบเชิง	กาบเชิง	สุรินทร์	5905B029	347237	1601165	1	1	1	5.00	56.00	56.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
191	09007C1001410191	บ้านน้อยแสนสุข	12	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5905B025	339122	1602508	1	1	1	10.00	56.00	56.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
192	09007C1001410192	บ้านวังทอง	15	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	5805D030	333535	1601278	1	1	1	5.00	68.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
193	09007C1001410193	บ้านโคกพยุง	6	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	5805D028	328705	1602515	1	1	1	5.00	68.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
194	09007C1001410194	บ้านจารย์	6	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5905B030	335566	1602902	1	1	1	10.00	50.00	44.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
195	09007C1001410195	บ้านประคำ	4	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	5805D027	328755	1604173	1	1	1	5.00	68.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
196	09007C1001410196	บ้านตงยาง	10	ผักไหม	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	5905C050	371039	1638521	1	1	1	3.20	80.00	80.00	150	14,016			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
197	09007C1001410197	บ้านโนนค้อทอง	8	โคกกลาง	พนมดงรัก	สุรินทร์	5805B026	309687	1605065	1	1	1	3.00	72.00	72.00	150	13,140				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
198	09007C1001410198	บ้านโคกลาว	9	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	5802D044	337045	1606268	1	1	1	7.00	25.00	25.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
199	09007C1001410199	บ้านไพรงาม	8	โคกตะเคียน	กาบเชิง	สุรินทร์	5905B024	341816	1605259	1	1	1	8.00	50.00	40.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
200	09007C1001410200	บ้านโคกเจริญ	9	ด่าน	กาบเชิง	สุรินทร์	5905B026	359348	1604696	1	1	1	4.00	60.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
201	09007C1001410201	บ้านสะเดาพัฒนา	12	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	5905D014	374821	1602464	1	1	1	3.00	120.00	120.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
202	09007C1001410202	บ้านตะเพรา	8	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	5805E031	319745	1605062	1	1	1	7.00	38.00	36.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
203	09007C1001410203	บ้านห้วยสำเริง	8	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์	5905B028	353135	1607191	1	1	1	7.00	56.00	56.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
204	09007C1001410204	บ้านตาไทย	4	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	5905D015	375279	1605991	1	1	1	5.00	74.00	74.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
205	09007C1001410205	บ้านหนองตายิง	16	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	5802D043	336581	1607588	1	1	1	6.00	40.00	40.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
206	09007C1001410206	บ้านเสกกอง	3	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	5802D042	334937	1608779	1	1	1	2.00	92.00	92.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
207	09007C1001410207	บ้านหมื่นสังข์	4	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์	5905F050	385645	1667761	1	1	1	4.00	80.00	75.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
208	09007C1001410208	บ้านโอรุณ	10	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	5802D045	329468	1609566	1	1	1	2.00	74.00	74.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
209	09007C1001410209	บ้านละเมียง	4	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	5805E026	319503	1608763	1	1	1	7.00	55.00	52.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
210	09007C1001410210	บ้านหนองระหาร	13	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	5905D027	367300	1607790	1	1	1	5.00	50.00	50.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
211	09007C1001410211	บ้านอามุย	3	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	5905D026	375972	1608861	1	1	1	2.00	70.00	70.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
212	09007C1001410212	บ้านถนนชัย	8	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	5802G030	341229	1609734	1	1	1	5.00	62.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
213	09007C1001410213	บ้านพรสุข	12	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์	5905A016	383601	1608876	1	1	1	5.00	62.00	62.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
214	09007C1001410214	บ้านโชคนาสาม	1	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	5805E032	313526	1629458	1	1	1	2.00	82.00	80.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
215	09007C1001410215	บ้านสำโรง	5	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	5802D041	328963	1626306	1	1	1	9.00	34.00	34.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
216	09007C1001410216	บ้านโคกสมบูรณ์	4	ศรีสุข	สำโรงทาบ	สุรินทร์	5905F050	385645	1667761	1	1	1	3.80	80.00	75.00	150	16,644			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
217	09007C1001410217	บ้านสะเดา	1	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	5905A022	393419	1609127	1	1	1	5.00	47.00	47.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
218	09007C1001410218	บ้านโสน	7	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	5802G029	344254	1611782	1	1	1	6.00	50.00	50.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
219	09007C1001410219	บ้านสังแก	2	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	5905A018	393297	1611076	1	1	1	6.00	45.00	45.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
220	09007C1001410220	บ้านขาม	3	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5802E039	324709	1605802	1	1	1	7.00	56.00	56.00	150	30,660			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
221	09007C1001410221	บ้านโคกไพรงาม	12	บ้านจารย์	สังขะ	สุรินทร์	5905D025	365796	1611938	1	1	1	4.00	80.00	80.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
222	09007C1001410222	บ้านห้วยเสนง	14	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	5802D046	334067	1614114	1	1	1	7.00	33.00	33.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
223	09007C1001410223	บ้านทำนบ	4	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	5802G020	344175	1612506	1	1	1	7.00	32.00	32.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
224	09007C1001410224	บ้านดินแดง	13	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5905D053	369573	1603103	1	1	1	3.00	74.00	74.00	150	13,140			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
225	09007C1001410225	บ้านขนาดมอญใต้	16	ตาคุม	สังขะ	สุรินทร์	5905D053	369573	1603103	1	1	1	3.00	74.00	74.00	150	13,140			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
226	09007C1001410226	บ้านตาโมม	3	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	5905D028	363471	1614545	1	1	1	10.00	44.00	44.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
227	09007C1001410227	บ้านสระ	2	กันตวจระมวล	ปราสาท	สุรินทร์	5802G031	343949	1615973	1	1	1	6.00	32.00	32.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
228	09007C1001410228	บ้านจบก	19	ตาเบา	ปราสาท	สุรินทร์	5805D032	336513	1618091	1	1	1	3.00	56.00	56.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
229	09007C1001410229	บ้านดงแดง	14	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5905E047	375572	1687241	1	1	1	4.50	70.00	23.00	150	19,710			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
230	09007C1001410230	บ้านโพนแคน	7	หนองบัวบาน	รัตนบุรี	สุรินทร์	5905D054	364947	1613206	1	1	1	5.00	78.00	74.00	150	21,900			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
231	09007C1001410231	บ้านสระ	18	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C030	342628	1619045	1	1	1	4.00	60.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
232	09007C1001410232	บ้านหนองเหล็ก	9	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
233	09007C1001410233	บ้านหนองกุง	10	กระเทียม	สังขะ	สุรินทร์	5805E051	358950	1620738	1	1	1	4.00	68.00	67.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
234	09007C1001410234	บ้านหนองบัว	17	สังขะ	สังขะ	สุรินทร์	5905D017	381736	1618810	1	1	1	6.00	74.00	74.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
235	09007C1001410235	บ้านบัวโคก	1	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์	5905F043	360965	1686198	1	1	1	5.40	55.00	48.00	150	23,652			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
236	09007C1001410236	บ้านโพธิ์พัฒนา	16	พระแก้ว	สังขะ	สุรินทร์	5905D018	386830	1619392	1	1	1	3.00	74.00	68.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
237	09007C1001410237	บ้านเดือยไก่แก้ว	11	พับพัน	สังขะ	สุรินทร์	5905D023	368277	1619941	1	1	1	10.00	32.00	32.00	150	43,800				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
238	09007C1001410238	บ้านสามแยก	14	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	5905D020	394565	1619262	1	1	1	5.00	70.00	70.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
239	09007C1001410239	บ้านตลาด	10	หนองฮะ	ลำโรงทาบ	สุรินทร์	5905D029	383441	1672293	1	1	1	5.00	74.00	38.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
240	09007C1001410240	บ้านโคกเพชร	15	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C027	334459	1623295	1	1	1	4.00	60.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
241	09007C1001410241	บ้านกระทม	9	ทับทัน	สังขะ	สุรินทร์	5905D022	367843	1622319	1	1	1	5.00	80.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
242	09007C1001410242	บ้านใหม่	2	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C026	337704	1623739	1	1	1	7.00	52.00	52.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
243	09007C1001410243	บ้านโคกยาง	1	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C033	336965	1623404	1	1	1	7.00	50.00	50.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
244	09007C1001410244	บ้านผางเก่า	6	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	5905H050	346038	1679355	1	1	1	3.50	72.00	72.00	150	15,330			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
245	09007C1001410245	บ้านจรูกแขวะ	8	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C028	343168	1624899	1	1	1	6.00	60.00	52.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
246	09007C1001410246	บ้านคง	3	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	5905D021	391448	1623819	1	1	1	5.00	70.00	70.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
247	09007C1001410247	บ้านหนองคู	6	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5905F015	364739	1624761	1	1	1	8.00	40.00	38.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
248	09007C1001410248	บ้านโคกวัด	14	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C029	345487	1625736	1	1	1	4.00	72.00	72.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
249	09007C1001410249	บ้านตาปุม	5	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5905F016	365331	1626109	1	1	1	9.00	60.00	50.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
250	09007C1001410250	บ้านกาเกาะ	9	ตาอี่อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5805G026	346459	1627815	1	1	1	4.00	34.00	34.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
251	09007C1001410251	บ้านโคกสะอาด	9	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	5905F022	360608	1626441	1	1	1	10.00	45.00	36.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
252	09007C1001410252	บ้านสนวน	1	ตาคง	สังขะ	สุรินทร์	5905D019	392130	1626438	1	1	1	4.00	92.00	92.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
253	09007C1001410253	บ้านผักไหม	16	ตาอี่อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5805G025	344255	1626938	1	1	1	5.00	44.00	44.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
254	09007C1001410254	บ้านโคกฆะกะ	7	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5905F018	363641	1627346	1	1	1	10.00	55.00	45.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
255	09007C1001410255	บ้านแสงทรัพย์	13	ตาอี่อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5810F049	350727	1628679	1	1	1	9.00	38.00	38.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
256	09007C1001410256	บ้านเสม็ด	13	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5905C015	344254	1629927	1	1	1	4.00	60.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
257	09007C1001410257	บ้านตระแบก	6	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	5805D033	360618	1630193	1	1	1	7.00	50.00	50.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
258	09007C1001410258	บ้านอำปึล	3	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	5805D034	364557	1632190	1	1	1	8.00	50.00	50.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
259	09007C1001410259	บ้านแจรน	5	ตาอี่อง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5802D047	349855	1634550	1	1	1	25.00	33.00	33.00	150	109,500				แล้วเสร็จ
260	09007C1001410260	บ้านสวาย	11	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5803G070	304028	1643155	1	1	1	5.00	44.00	44.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
261	09007C1001410261	บ้านตาเพชร	7	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5805B032	343475	1638629	1	1	1	6.00	50.00	50.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
262	09007C1001410262	บ้านอาทึก	4	บ้านผือ	จอมพระ	สุรินทร์	5905F048	357762	1672566	1	1	1	4.30	60.00	58.00	150	18,834			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
263	09007C1001410263	บ้านยางน้อย	6	หนองเมธี	ท่าตูม	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
264	09007C1001410264	บ้านค้อ	5	หนองฮะ	ลำโรงทาบ	สุรินทร์	5905F043	360965	1686198	1	1	1	5.00	55.00	48.00	150	21,900			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
265	09007C1001410265	บ้านน้ำสร้าง	13	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
266	09007C1001410266	บ้านเหล่าฆ่วง	11	ธาตุ	รัตนบุรี	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
267	09007C1001410267	บ้านนางเกา	10	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
268	09007C1001410268	บ้านบึงน้อย	9	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
269	09007C1001410269	บ้านยางน้อย	13	ดอนแรด	รัตนบุรี	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
270	09007C1001410270	บ้านระไซร์	10	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5905A026	353584	1658290	1	1	1	4.00	40.00	40.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
271	09007C1001410271	บ้านกันตรง	8	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5905A027	353001	1664060	1	1	1	4.00	35.00	35.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
272	09007C1001410272	บ้านกะเตียว	6	บัวโคก	ท่าตูม	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
273	09007C1001410273	บ้านเบาะอุ่น	8	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5905A028	344198	1657406	1	1	1	4.00	62.00	38.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
274	09007C1001410274	บ้านหนองปรือ	10	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	5905D054	364947	1613206	1	1	1	4.50	78.00	74.00	150	19,710			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
275	09007C1001410275	บ้านนากลาง	8	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	5905A019	392872	1605243	1	1	1	5.00	42.00	42.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
276	09007C1001410276	บ้านโคกหิน	10	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	5905A020	393743	1606986	1	1	1	7.00	48.00	48.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
277	09007C1001410277	บ้านสะกาด	1	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	5905D024	364304	1616675	1	1	1	6.00	62.00	60.00	150	26,280				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
278	09007C1001410278	บ้านหนองสลัม	15	ลังขะ	ลังขะ	สุรินทร์	5905D016	382155	1617860	1	1	1	6.00	56.00	56.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
279	09007C1001410279	บ้านหนองพิมานใต้	8	กระเบื้อง	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	5905D061	367541	1617860	1	1	1	4.00	74.00	74.00	150	17,520			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
280	09007C1001410280	บ้านสนวน	6	บึง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5905A029	351185	1664429	1	1	1	1.00	72.00	60.00	150	4,380				แล้วเสร็จ
281	09007C1001410281	บ้านน้ำซับ	20	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	5905F027	359443	1690828	1	1	1	7.00	45.00	30.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
282	09007C1001410282	บ้านคอนสวรรค์	10	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	5905F026	384030	1696684	1	1	1	6.00	45.00	30.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
283	09007C1001410283	บ้านตาสอน	11	ปราสาททอง	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
284	09007C1001410284	บ้านตระแบกน้อย	5	แกใหญ่	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5905C018	341766	1653577	1	1	1	4.00	46.00	46.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
285	09007C1001410285	บ้านหนองคูน้อย	2	เมืองแก	ท่าตูม	สุรินทร์	5905F028	358662	1686026	1	1	1	3.00	84.00	72.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
286	09007C1001410286	บ้านยางเก่า	13	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
287	09007C1001410287	บ้านหนองบาก	19	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	5905C024	378241	1675811	1	1	1	4.00	60.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
288	09007C1001410288	บ้านโนนก่อ	12	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	5905C030	383170	1679004	1	1	1	3.00	72.00	72.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
289	09007C1001410289	บ้านขี้ตุ่น	9	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	5905C026	378079	1682240	1	1	1	3.00	56.00	56.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
290	09007C1001410290	บ้านโบก	13	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	5905C027	377698	1682675	1	1	1	5.00	60.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
291	09007C1001410291	บ้านสองห้อง	9	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
292	09007C1001410292	บ้านหนองผาย	17	หนองเทพ	โนนนารายณ์	สุรินทร์	5905C025	379443	1675119	1	1	1	3.00	62.00	62.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
293	09007C1001410293	บ้านโพธิ์น้อย	5	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	5905C029	377724	1680330	1	1	1	4.00	32.00	32.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
294	09007C1001410294	บ้านหนองบัวงาม	2	โนน	โนนนารายณ์	สุรินทร์	5905C028	377515	1680572	1	1	1	3.00	72.00	72.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
295	09007C1001410295	บ้านสะเดา	5	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F031	323192	1617386	1	1	1	7.00	60.00	56.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
296	09007C1001410296	บ้านทนง	1	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F026	322939	1620933	1	1	1	8.00	63.00	60.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
297	09007C1001410297	บ้านขนาด	6	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F027	323846	1621301	1	1	1	7.00	54.00	48.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
298	09007C1001410298	บ้านโคกกลัน	7	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F028	325833	1622205	1	1	1	7.00	48.00	45.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
299	09007C1001410299	บ้านแสรใบราณ	4	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F024	329139	1625763	1	1	1	7.00	50.00	45.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
300	09007C1001410300	บ้านปราสาท	6	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F025	327252	1626083	1	1	1	6.00	60.00	54.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
301	09007C1001410301	บ้านโสนกพัฒนา	11	เชื้อเพลิง	ปราสาท	สุรินทร์	5802D040	328968	1626296	1	1	1	6.00	50.00	50.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
302	09007C1001410302	บ้านกล้วย	6	ศรีสุข	ศรีณรงค์	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
303	09007C1001410303	บ้านหนองมะแซว	11	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์	5905F024	376955	1637862	1	1	1	5.00	60.00	54.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
304	09007C1001410304	บ้านหนองหว้า	4	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
305	09007C1001410305	บ้านสำโรง	3	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	5905B017	353940	1676533	1	1	1	10.00	44.00	44.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
306	09007C1001410306	บ้านสำโรง	10	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	5905B015	354205	1676029	1	1	1	7.00	62.00	62.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
307	09007C1001410307	บ้านหนองสิม	14	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์												1	ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ		ยกเลิก
308	09007C1001410308	บ้านโคกสะอาด	15	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	5905B021	353180	1670235	1	1	1	10.00	50.00	44.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
309	09007C1001410309	บ้านนิคมซอย3	13	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5802E037	324477	1602397	1	1	1	7.00	38.00	38.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
310	09007C1001410310	บ้านโคกแดง	12	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5802E041	323495	1605441	1	1	1	1.00	104.00	104.00	150	4,380				แล้วเสร็จ
311	09007C1001410311	บ้านอลงกรณ์	15	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5802E039	324709	1605802	1	1	1	7.20	56.00	56.00	150	31,536				แล้วเสร็จ
312	09007C1001410312	บ้านภูน	2	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5802E038	325742	1606587	1	1	1	2.00	96.00	96.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
313	09007C1001410313	บ้านโคกโพธิ์	16	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5802E040	323341	1619074	1	1	1	5.00	74.00	74.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
314	09007C1001410314	บ้านโคกตะแบง	8	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5802E042	321028	1609603	1	1	1	7.00	32.00	32.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
315	09007C1001410315	บ้านหนองก้านเหลือง	11	หนองยะ	สำโรงทาบ	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
316	09007C1001410316	บ้านตราด	14	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5802E043	323941	1612032	1	1	1	9.00	38.00	38.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
317	09007C1001410317	บ้านโคกเบง	6	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5802E044	325219	1613003	1	1	1	7.00	50.00	50.00	150	30,660				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
318	09007C1001410318	บ้านโคกจ๊ะ	4	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์	5802019	317266	1623688	1	1	1	8.00	40.00	38.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
319	09007C1001410319	บ้านนาครอง	5	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์	5802G013	320260	1625867	1	1	1	5.00	60.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
320	09007C1001410320	บ้านโนง	5	ศรีสุข	ศรีณรงค์	สุรินทร์	5905F023	362273	1626277	1	1	1	12.00	50.00	40.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
321	09007C1001410321	บ้านใหม่ไทยเจริญ	12	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
322	09007C1001410322	บ้านกระแสร์อุดม	9	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	5905C021	377721	1647919	1	1	1	4.00	50.00	50.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
323	09007C1001410323	บ้านหนองบัว	8	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์												1	ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ		ยกเลิก
324	09007C1001410324	บ้านสว่าง	12	ยาง	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	5905C023	373420	1654267	1	1	1	8.00	48.00	40.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
325	09007C1001410325	บ้านกุดหวาย	7	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
326	09007C1001410326	บ้านแก่นแซ	6	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	5905C020	383783	1647772	1	1	1	5.00	44.00	44.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
327	09007C1001410327	บ้านตาเมือน	9	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F030	321836	1618358	1	1	1	7.00	60.00	50.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
328	09007C1001410328	บ้านกันจาน	11	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F032	320280	1618546	1	1	1	7.00	55.00	50.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
329	09007C1001410329	บ้านโคกยางชุม	4	ปราสาททนง	ปราสาท	สุรินทร์	5805F029	322603	1622738	1	1	1	7.00	60.00	56.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
330	09007C1001410330	บ้านเตาแดก	6	ตรวจ	ศรีณรงค์	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
331	09007C1001410331	บ้านโคกสง่า	3	แนงมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	5805D031	331083	1604947	1	1	1	5.00	80.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
332	09007C1001410332	บ้านโคกสะอาด	2	คูตัน	กาบเชิง	สุรินทร์	5905B027	352849	1610801	1	1	1	10.00	50.00	44.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
333	09007C1001410333	บ้านจบก	4	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5905A030	349177	1652298	1	1	1	7.00	27.00	27.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
334	09007C1001410334	บ้านห้วยราช	9	บ้านแร่	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	5905A031	346260	1654991	1	1	1	6.00	38.00	38.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
335	09007C1001410335	บ้านไผ่	8	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	5905B019	358694	1675568	1	1	1	15.00	50.00	44.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
336	09007C1001410336	บ้านขวาว	5	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	5905B018	357741	1675732	1	1	1	12.00	50.00	44.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
337	09007C1001410337	บ้านสนิท	1	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	5905B016	354477	1677244	1	1	1	6.00	68.00	68.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
338	09007C1001410338	บ้านวารไพรศรี	6	หนองสนิท	จอมพระ	สุรินทร์	5905B020	352884	1678379	1	1	1	5.00	64.00	64.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
339	09007C1001410339	บ้านโนนกลาง	9	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
340	09007C1001410340	บ้านหนองขอน	2	จอมพระ	จอมพระ	สุรินทร์	5905B022	352375	1671166	1	1	1	5.00	74.00	64.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
341	09007C1001410341	บ้านโคกสะอาด	3	บะ	ท่าตูม	สุรินทร์	5905F029	345746	1683005	1	1	1	5.00	60.00	54.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
342	09007C1001410342	บ้านตาปิม	5	บัวเชด	บัวเชด	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
343	09007C1001410343	บ้านแสนทอง	7	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	5905A021	394147	1605784	1	1	1	10.00	48.00	48.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
344	09007C1001410344	บ้านสะเดาน้อย	9	สะเดา	บัวเชด	สุรินทร์	5905A022	393419	1609127	1	1	1	5.00	47.00	47.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
345	09007C1001410345	บ้านตาวัง	1	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์	5905A023	392556	1602951	1	1	1	6.00	32.00	32.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
346	09007C1001410346	บ้านแสนสำราญ	5	ตาวัง	บัวเชด	สุรินทร์	5905A024	395225	1615601	1	1	1	6.00	50.00	50.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
347	09007C1001410347	บ้านทะลอกกอง	9	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5805E029	325745	1602723	1	1	1	7.00	52.00	50.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
348	09007C1001410348	บ้านโคกใหญ่	18	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5805E030	381200	1607092	1	1	1	7.00	52.00	50.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
349	09007C1001410349	บ้านไพรงาม	10	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	5805E042	313271	1607356	1	1	1	5.00	56.00	55.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
350	09007C1001410350	บ้านตาเตาะ	9	โชคนาสาม	ปราสาท	สุรินทร์	5805E027	308822	1608843	1	1	1	3.00	85.00	80.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
351	09007C1001410351	บ้านรันเดง	3	โคกสะอาด	ปราสาท	สุรินทร์	5805E028	321992	1610592	1	1	1	8.00	53.00	52.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
352	09007C1001410352	บ้านกลองตุง	11	สะกาด	สังขะ	สุรินทร์	5905C049	323781	1627189	1	1	1	10.00	50.00	46.00	150	43,800			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
353	09007C1001410353	บ้านโคกละลอก	17	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C031	345780	1618807	1	1	1	4.00	80.00	80.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
354	09007C1001410354	บ้านอังกัญไพธิ์	4	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C034	335448	1623464	1	1	1	5.00	68.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
355	09007C1001410355	บ้านหนองยาว	8	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์	5802G018	321028	1623283	1	1	1	10.00	34.00	34.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
356	09007C1001410356	บ้านสมุด	7	สมุด	ปราสาท	สุรินทร์	5802G017	320448	1625184	1	1	1	10.00	40.00	40.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
357	09007C1001410357	บ้านโคกทม	16	โคกยาง	ปราสาท	สุรินทร์	5805C032	345086	1624880	1	1	1	5.00	50.00	50.00	150	21,900				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
358	09007C1001410358	บ้านโคกปราสาท	10	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5905C016	339612	1631732	1	1	1	5.00	50.00	50.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
359	09007C1001410359	บ้านจลง	14	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5810F048	344306	1635191	1	1	1	3.00	90.00	70.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
360	09007C1001410360	บ้านเฉนียง	8	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5905C017	343822	1640111	1	1	1	8.00	36.00	36.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
361	09007C1001410361	บ้านขุนไชย	12	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5805B031	344944	1635779	1	1	1	7.00	38.00	38.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
362	09007C1001410362	บ้านระหาร	6	เทนมีย์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5805B030	341197	1637330	1	1	1	3.00	80.00	80.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
363	09007C1001410363	บ้านไผ่	14	ไผ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	5905F025	380433	1693426	1	1	1	8.00	60.00	60.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
364	09007C1001410364	บ้านสมบูรณ์	3	กุดหวาย	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	5905C022	373265	1649207	1	1	1	8.00	40.00	40.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
365	09007C1001410365	บ้านโนนกลาง	9	อูโลก	ลำดวน	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
366	09007C1001410366	บ้านบวรรัตน์	11	อูโลก	ลำดวน	สุรินทร์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
367	09007C1001410367	บ้านโคกกระโดน	9	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5905F017	365243	1625014	1	1	1	10.00	60.00	45.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
368	09007C1001410368	บ้านกระสัง	8	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	5905F021	360608	1626441	1	1	1	5.00	60.00	57.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
369	09007C1001410369	บ้านโชคเหนือ	1	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	5805A037	360893	1628460	1	1	1	8.00	50.00	50.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
370	09007C1001410370	บ้านสกรือม	8	ตระเปียงเตีย	ลำดวน	สุรินทร์	5905F019	363787	1628248	1	1	1	10.00	55.00	50.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
371	09007C1001410371	บ้านเชิงอะ	5	โชคเหนือ	ลำดวน	สุรินทร์	5905F020	360121	1628604	1	1	1	8.00	50.00	45.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
372	09007C1001410372	บ้านสองชั้น	14	นาดี	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	5905C019	340413	1657743	1	1	1	8.00	36.00	36.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
373	09007C1001410373	บ้านบุ่งช้าง	8	สะทอง	หนองหงษ์	บุรีรัมย์	5805G023	247512	1647618	1	1	1	12.00	34.00	34.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
374	09007C1001410374	บ้านหนองม่วง	7	ยายแย้มวัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	5905B049	278745	1650132	1	1	1	15.00	50.00	38.00	150	65,700			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
375	09007C1001410375	บ้านสำโรง	5	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	5803G052	316122	1643154	1	1	1	3.00	38.00	38.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
376	09007C1001410376	บ้านหนองโสน	11	เมืองไผ่	กระสัง	บุรีรัมย์	5803G057	313759	1657530	1	1	1	12.00	26.00	26.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
377	09007C1001410377	บ้านพิม	11	สองชั้น	กระสัง	บุรีรัมย์	5803G056	304028	1643155	1	1	1	8.00	44.00	44.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
378	09007C1001410378	บ้านทุ่งสว่าง	7	สูงเนิน	กระสัง	บุรีรัมย์	5803G055	306943	1638632	1	1	1	4.00	36.00	36.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
379	09007C1001410379	บ้านท่าม่วง	10	หินเหล็กไฟ	คูเมือง	บุรีรัมย์												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
380	09007C1001410380	บ้านไพรโยง	8	ละลวด	ชำนิ	บุรีรัมย์	5805G024	259684	1635334	1	1	1	9.00	36.00	36.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
381	09007C1001410381	บ้านหนองเพิก	5	ละลวด	ชำนิ	บุรีรัมย์	5905B051	258078	1637368	1	1	1	4.00	60.00	56.00	150	17,520			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
382	09007C1001410382	บ้านบุ	17	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5810C037	282307	1607833	1	1	1	5.00	92.00	92.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
383	09007C1001410383	บ้านกระสัง	4	จรเข้มาก	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5810C038	283662	1605569	1	1	1	5.00	80.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
384	09007C1001410384	บ้านโคกกี่	8	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5810C035	288707	1626264	1	1	1	15.00	42.00	40.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
385	09007C1001410385	บ้านไพบูลย์	9	บ้านไทร	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5810C042	291081	1629037	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
386	09007C1001410386	บ้านกระสัง	4	ประทัดบุ	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5810C039	285917	1614539	1	1	1	8.00	62.00	62.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
387	09007C1001410387	บ้านหนองมะเขือ	2	ไพศาล	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5810C040	304183	1618469	1	1	1	10.00	62.00	62.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
388	09007C1001410388	บ้านไพรโยง	8	ละเวี้ย	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5810C041	301647	1616170	1	1	1	10.00	68.00	68.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
389	09007C1001410389	บ้านตาพระ	5	โคกชมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	5805H028	303293	1633419	1	1	1	15.00	56.00	44.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
390	09007C1001410390	บ้านทะเมนชัย	13	โคกชมิ้น	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	5805H027	303171	1634017	1	1	1	10.00	56.00	50.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
391	09007C1001410391	บ้านตะโกรี	3	ลำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	5805H026	295429	1636543	1	1	1	5.00	62.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
392	09007C1001410392	บ้านสว่างวิ้งงาม	8	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5805H029	284969	1665097	1	1	1	5.00	72.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
393	09007C1001410393	บ้านหนองสะแบง	6	ท่าโพธิ์ชัย	หนองกี่	บุรีรัมย์	5810F046	243006	1630367	1	1	1	7.00	74.00	74.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
394	09007C1001410394	บ้านหนองน้ำขุ่น	8	บ้านปรือ	กระสัง	บุรีรัมย์	5803G053	321246	1641077	1	1	1	9.00	38.00	38.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
395	09007C1001410395	บ้านชำแระ	10	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	5803G054	321694	1642396	1	1	1	14.00	20.00	20.00	150	61,320				แล้วเสร็จ
396	09007C1001410396	บ้านทางโค้ง	13	หนองเต็ง	กระสัง	บุรีรัมย์	5803G051	289992	1615903	1	1	1	7.00	42.00	42.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
397	09007C1001410397	บ้านหนองสะแก	5	เจริญสุข	เฉลิมพระเกียรติ	บุรีรัมย์	5810F042	272000	1612785	1	1	1	8.00	62.00	62.00	150	35,040				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
398	09007C1001410398	บ้านหนองตะเตียน	8	ลุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5905B049	278745	1650132	1	1	1	15.00	50.00	38.00	150	65,700			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
399	09007C1001410399	บ้านสะเดา	6	สะเดา	นางรอง	บุรีรัมย์	5810F043	260175	1612411	1	1	1	5.00	56.00	56.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
400	09007C1001410400	บ้านสี่เหลี่ยมน้อย	8	หนองโสน	นางรอง	บุรีรัมย์	5810F040	276656	1630775	1	1	1	7.00	80.00	80.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
401	09007C1001410401	บ้านโสนน้อยพัฒนา	12	หนองโสน	นางรอง	บุรีรัมย์	5810F041	277665	1629560	1	1	1	7.00	62.00	62.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
402	09007C1001410402	บ้านแสลงโทน	1	แสลงโทน	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	5810C036	290968	1636776	1	1	1	15.00	62.00	62.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
403	09007C1001410403	บ้านประตู่	7	ลำโรง	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	5805H025	297979	1633766	1	1	1	5.00	62.00	56.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
404	09007C1001410404	บ้านดอนพยอม	5	หายโศก	พุทไธสง	บุรีรัมย์	5805G021	279398	1716801	1	1	1	4.00	20.00	19.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
405	09007C1001410405	บ้านหนองไทรงาม	21	ชุมเห็ด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5803F048	296327	1665444	1	1	1	5.00	42.00	42.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
406	09007C1001410406	บ้านลี้งต้น	8	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5803F044	288104	1649811	1	1	1	7.00	27.00	27.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
407	09007C1001410407	บ้านบุ	6	บ้านบัว	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5803F045	289693	1651312	1	1	1	7.00	27.00	27.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
408	09007C1001410408	บ้านยางน้อย	3	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5803F046	283255	1640228	1	1	1	5.00	38.00	38.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
409	09007C1001410409	บ้านโคกลำดวน	9	เมืองฝาง	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5803F047	281110	1634568	1	1	1	7.00	55.00	55.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
410	09007C1001410410	บ้านชาชันโลง	2	ลุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5803F042	280220	1651135	1	1	1	6.00	42.00	42.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
411	09007C1001410411	บ้านโคกเพชร	11	ลุมปุ๊ก	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5803F043	281052	1647636	1	1	1	6.00	66.00	66.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
412	09007C1001410412	บ้านหนองม่วง	2	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5805H031	289019	1658816	1	1	1	4.00	44.00	37.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
413	09007C1001410413	บ้านหนองจอก	19	หนองตาด	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5805H030	290000	1666119	1	1	1	9.00	50.00	44.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
414	09007C1001410414	บ้านโคกเก่า	4	หลักเขต	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	5803F049	298768	1639190	1	1	1	4.00	45.00	45.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
415	09007C1001410415	บ้านสระแร่	8	หนองกะทิง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	5805G022	255096	1656441	1	1	1	10.00	24.00	24.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
416	09007C1001410416	บ้านโคกอิสระ	10	นิคม	สตึก	บุรีรัมย์	5805G020	311500	1689922	1	1	1	7.00	72.00	72.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
417	09007C1001410417	บ้านพงสวรรค์	12	สนามชัย	สตึก	บุรีรัมย์												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
418	09007C1001410418	บ้านศรีสง่า	4	ทุ่งกระตาดพัฒนา	หนองกี่	บุรีรัมย์	5810F047	233463	1626138	1	1	1	7.00	86.00	86.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
419	09007C1001410419	บ้านนาสัญญา	5	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806A048	553188	946845	1	1	1	5.00	110.00	110.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
420	09007C1001410420	บ้านคลองสาย	4	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806A046	547618	948033	1	1	1	10.00	50.00	44.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
421	09007C1001410421	บ้านห้วยปริก(ชายคลอง)	1	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806A042	551169	946488	1	1	1	10.00	110.00	110.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
422	09007C1001410422	บ้านชะเมา	6	ท่าเรือ	เมือง นครศรีธรรมร	นครศรีธรรมราช	5806B032	610910	913173	1	1	1	5.00	100.00	100.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
423	09007C1001410423	บ้านปลายสระ	4	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806F033	603543	907655	1	1	1	7.00	60.00	60.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
424	09007C1001410424	บ้านปากเสียวได้	2	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช	5806C033	561268	944524	1	1	1	8.00	128.00	128.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
425	09007C1001410425	บ้านโคกหาด	7	ไสหร้า	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806C029	560610	932279	1	1	1	8.00	86.00	86.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
426	09007C1001410426	บ้านทุ่งนาใหม่	4	ยางค้อม	พิปูน	นครศรีธรรมราช	5806C036	565567	943863	1	1	1	10.00	74.00	74.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
427	09007C1001410427	บ้านต้นเหลียง	14	เสาเภา	สิชล	นครศรีธรรมราช	5806D032	596043	982784	1	1	1	5.00	61.00	61.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
428	09007C1001410428	บ้านเขาคา	11	เสาเภา	สิชล	นครศรีธรรมราช	5806G070	596824	981570	1	1	1	5.00	63.00	63.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
429	09007C1001410429	บ้านไทรขาม	6	คอนตะโก	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	5806D025	596339	946418	1	1	1	9.00	69.00	69.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
430	09007C1001410430	บ้านโพธิ์	1	ไทยบุรี	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	5806D027	599780	958806	1	1	1	10.00	86.00	86.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
431	09007C1001410431	บ้านบนโพธิ์	5	ท่าดี	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	5806B027	589690	928132	1	1	1	10.00	40.00	40.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
432	09007C1001410432	บ้านวัวหลุง	5	ควนชุม	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806F029	603084	898712	1	1	1	8.00	100.00	100.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
433	09007C1001410433	บ้านทุ่งเลน	4	ควนชุม	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806F028	601010	903801	1	1	1	10.00	38.00	36.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
434	09007C1001410434	บ้านเหนือคลอง	2	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806A044	552447	947667	1	1	1	6.00	70.00	70.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
435	09007C1001410435	บ้านท่าแห้ง	3	นาแว	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806A041	555921	934475	1	1	1	10.00	68.00	68.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
436	09007C1001410436	บ้านโคกข่อย	1	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	5806B034	635964	880946	1	1	1	6.00	150.00	150.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
437	09007C1001410437	บ้านบางไทร	9	บางศาลา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	5806D038	628642	912140	1	1	1	10.00	124.00	108.00	150	43,800				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
438	09007C1001410438	บ้านบางยัง	8	บางศาลา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	5806D037	630905	909936	1	1	1	7.00	138.00	138.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
439	09007C1001410439	บ้านสระโพธิ์	3	บ้านกลาง	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	5806E052	633090	902428	1	1	1	10.00	170.00	170.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
440	09007C1001410440	บ้านสวนเรียน	9	เขาพระบาท	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	5806E050	630789	887915	1	1	1	2.00	92.00	92.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
441	09007C1001410441	บ้านบางเข็ม	7	บางศาลา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	5806D036	631449	911009	1	1	1	4.00	146.00	146.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
442	09007C1001410442	บ้านคลองแดน	12	เชียรเขา	เฉลิมพระเกียรติ	นครศรีธรรมราช	5806D031	619400	907354	1	1	1	10.00	101.00	101.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
443	09007C1001410443	บ้านในกลอง	5	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806F032	604198	908545	1	1	1	7.00	57.00	56.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
444	09007C1001410444	บ้านเกาะป่ายาง	6	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806F034	606808	897918	1	1	1	7.00	66.00	60.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
445	09007C1001410445	บ้านเขาวง	2	บ้านนิคม	บางขัน	นครศรีธรรมราช	5806E048	552833	873045	1	1	1	2.00	50.00	50.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
446	09007C1001410446	บ้านค้อ	4	เกาะทวด	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	5806D033	620912	914453	1	1	1	10.00	56.00	56.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
447	09007C1001410447	บ้านโคกวัว	3	บางตะพง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	5806D035	628262	908861	1	1	1	10.00	140.00	140.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
448	09007C1001410448	บ้านจันดี	3	จันดี	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806A040	561144	927860	1	1	1	3.00	186.00	164.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
449	09007C1001410449	บ้านยางด้วน	7	โพธิ์ทอง	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	5806B033	600343	949481	1	1	1	6.00	72.00	72.00	150	26,280			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
450	09007C1001410450	บ้านฉาง	3	เสือหึง	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	5806E054	635603	901889	1	1	1	9.00	152.00	152.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
451	09007C1001410451	บ้านในอ่าว	1	บ้านเนิน	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	5806E053	633514	905078	1	1	1	8.00	154.00	154.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
452	09007C1001410452	บ้านดอนโรง	8	เขาพระบาท	เชียรใหญ่	นครศรีธรรมราช	5806B029	628455	887123	1	1	1	10.00	110.00	110.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
453	09007C1001410453	บ้านต้นไทร	8	ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806D030	604819	905897	1	1	1	5.00	79.00	79.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
454	09007C1001410454	บ้านหนองท่อม	5	ไม้เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806E042	549981	934344	1	1	1	4.00	92.00	92.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
455	09007C1001410455	บ้านสวนจีน	9	ไสหร้า	ฉวาง	นครศรีธรรมราช												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
456	09007C1001410456	บ้านปากกา	3	ห้วยปริก	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806A045	549910	945744	1	1	1	10.00	100.00	100.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
457	09007C1001410457	บ้านทัวควน	6	ควนชุม	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806F030	601987	901036	1	1	1	5.00	70.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
458	09007C1001410458	บ้านในหมง	6	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช	5806B030	591110	938611	1	1	1	4.00	100.00	100.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
459	09007C1001410459	บ้านในทับ	3	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช	5806B028	589845	940628	1	1	1	4.00	100.00	100.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
460	09007C1001410460	บ้านเขาปูน	8	พรหมโลก	พรหมคีรี	นครศรีธรรมราช	5806B031	592341	942410	1	1	1	5.00	50.00	50.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
461	09007C1001410461	บ้านมะม่วงกวาง	6	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	5806B023	588223	927265	1	1	1	7.00	65.00	65.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
462	09007C1001410462	บ้านวังไทร	7	กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมราช												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
463	09007C1001410463	บ้านสานขุน	6	เขาแก้ว	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	5806B026	577754	922662	1	1	1	7.00	40.00	40.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
464	09007C1001410464	บ้านนิคมสมสรร	8	บ้านนิคม	บางขัน	นครศรีธรรมราช	5806E049	556507	877117	1	1	1	10.00	48.00	48.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
465	09007C1001410465	บ้านเขาอม	5	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช	5806G075	591822	975227	1	1	1	5.00	54.00	54.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
466	09007C1001410466	บ้านคอกวัว	3	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช	5806G073	595282	975351	1	1	1	7.00	85.00	85.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
467	09007C1001410467	บ้านไสพลู	8	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช	5806G076	593857	979207	1	1	1	10.00	50.00	50.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
468	09007C1001410468	บ้านสี่สาออก	11	เปลี่ยน	สิชล	นครศรีธรรมราช	5806G077	594751	976610	1	1	1	9.00	65.00	65.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
469	09007C1001410469	บ้านคลองเพียร(เผียบล่าง)	5	เทพราช	สิชล	นครศรีธรรมราช	5806G072	588219	981142	1	1	1	10.00	50.00	50.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
470	09007C1001410470	บ้านพังกำ	9	ฉลอง	สิชล	นครศรีธรรมราช	5806G071	593886	982427	1	1	1	10.00	63.00	63.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
471	09007C1001410471	บ้านควนเย็น	14	นาบอน	นาบอน	นครศรีธรรมราช	5806E045	570619	910224	1	1	1	10.00	116.00	116.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
472	09007C1001410472	บ้านริมเขื่อน	10	ท่าพยา	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	5806D034	639951	912155	1	1	1	10.00	114.00	114.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
473	09007C1001410473	บ้านควนโก๊ะ	10	แหลม	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	5806B033	600343	949481	1	1	1	10.00	72.00	72.00	150	43,800			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
474	09007C1001410474	บ้านทุ่งหล่อ	7	ควนชุม	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806F031	599575	907413	1	1	1	6.00	50.00	48.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
475	09007C1001410475	บ้านวังงู	4	เสาธง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	5806D029	600484	910066	1	1	1	6.00	77.00	77.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
476	09007C1001410476	บ้านปากเสียว	3	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช	5806C034	564388	944998	1	1	1	6.00	26.00	24.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
477	09007C1001410477	บ้านชายทุ่ง	6	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช	5806C035	558982	949460	1	1	1	10.00	38.00	38.00	150	43,800				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
478	09007C1001410478	บ้านตรอกแค	4	ไสหร้า	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806C028	516357	932980	1	1	1	3.00	156.00	156.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
479	09007C1001410479	บ้านฝ่ายท่า	11	นาแว	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	5806E041	556824	942810	1	1	1	5.00	44.00	44.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
480	09007C1001410480	บ้านนา	1	ช้างกลาง	ช้างกลาง	นครศรีธรรมราช	5806E044	569852	923056	1	1	1	4.00	72.00	72.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
481	09007C1001410481	บ้านบางคราม	2	ปากฉลุย	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	5806A051	502348	1027024	1	1	1	7.00	120.00	120.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
482	09007C1001410482	บ้านในปราบ	5	บ้านเสด็จ	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	5806A053	507932	962913	1	1	1	5.00	136.00	136.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
483	09007C1001410483	บ้านบางโต	16	ตะกุกเหนือ	วิภาวดี	สุราษฎร์ธานี	5806A052	484828	1027964	1	1	1	5.00	153.00	153.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
484	09007C1001410484	บ้านหน้าอะ	3	เขาพัง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	5806A055	479413	989926	1	1	1	5.00	122.00	122.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
485	09007C1001410485	บ้านควนอารี	9	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	5806A049	534233	947445	1	1	1	3.00	100.00	100.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
486	09007C1001410486	บ้านสี่แยกสามัคคี	10	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	5806A050	529063	974870	1	1	1	8.00	150.00	150.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
487	09007C1001410487	บ้านทุ่งคาใหญ่	1	ทุ่งคา	เมืองชุมพร	ชุมพร	5906G020	514318	1149208	1	1	1	7.00	65.00	65.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
488	09007C1001410488	บ้านทุ่งคาน้อย	2	ทุ่งคา	เมืองชุมพร	ชุมพร	5906G022	514858	1149381	1	1	1	5.00	102.00	102.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
489	09007C1001410489	บ้านบากแดง	12	วังตะกอ	หลังสวน	ชุมพร	5806G083	497370	1102089	1	1	1	8.00	115.00	115.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
490	09007C1001410490	บ้านเขายาว	9	วิสัยเหนือ	เมืองชุมพร	ชุมพร	5806G092	505819	1149816	1	1	1	16.00	40.00	40.00	150	70,080				แล้วเสร็จ
491	09007C1001410491	บ้านดอนโชน	12	วิสัยเหนือ	เมืองชุมพร	ชุมพร	5806G091	508566	1146557	1	1	1	5.00	95.00	95.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
492	09007C1001410492	บ้านทรายทอง	6	นาชะอัง	เมืองชุมพร	ชุมพร	5906G023	525860	1166783	1	1	1	7.00	52.00	52.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
493	09007C1001410493	บ้านนาปรือ	4	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร	5906G024	508494	1157394	1	1	1	15.00	97.00	97.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
494	09007C1001410494	บ้านเขาวง	6	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร	5806G093	510421	1157503	1	1	1	15.00	32.00	32.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
495	09007C1001410495	บ้านเขาล้าน	8	ครน	สวี	ชุมพร	5806G087	500043	1143176	1	1	1	10.00	67.00	67.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
496	09007C1001410496	บ้านปลายกริม	10	ครน	สวี	ชุมพร	5806G086	495984	1142747	1	1	1	6.00	92.00	92.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
497	09007C1001410497	บ้านท่าหิน	5	ท่าหิน	สวี	ชุมพร	5806G084	514055	1131975	1	1	1	15.00	74.00	74.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
498	09007C1001410498	บ้านคลองหงาว	9	หาดยาย	หลังสวน	ชุมพร	5806G080	492167	1101683	1	1	1	7.00	97.00	97.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
499	09007C1001410499	บ้านชุมแสง	10	หาดยาย	หลังสวน	ชุมพร	5806G079	496662	1089026	1	1	1	8.00	38.00	38.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
500	09007C1001410500	บ้านหินช้างสี	13	วังตะกอ	หลังสวน	ชุมพร	5806G081	497201	1104862	1	1	1	5.00	127.00	127.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
501	09007C1001410501	บ้านสันตินิมิตร	10	รับร่อ	ท่าแซะ	ชุมพร	5906G021	503956	1198937	1	1	1	5.00	120.00	120.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
502	09007C1001410502	บ้านหาดใน	2	รับร่อ	ท่าแซะ	ชุมพร	5906G018	506110	1175950	1	1	1	10.00	65.00	65.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
503	09007C1001410503	บ้านนาเหรียง	1	ครน	สวี	ชุมพร	5806G089	504920	1139381	1	1	1	10.00	17.00	17.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
504	09007C1001410504	บ้านช่องรอ	11	ครน	สวี	ชุมพร	5806G085	499787	1139602	1	1	1	8.00	127.00	127.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
505	09007C1001410505	บ้านนาป่าตอ	5	โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	5806A056	432813	975194	1	1	1	4.00	194.00	194.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
506	09007C1001410506	บ้านตะวันออก	13	โคกกลอย	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	5806A057	425842	916287	1	1	1	5.00	110.00	110.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
507	09007C1001410507	บ้านแหลมไทร	3	เขาไม้แก้ว	สิเกา	ตรัง	5806E056	526240	843640	1	1	1	3.00	104.00	104.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
508	09007C1001410508	บ้านหนองผักฉีด	5	สุโสะ	ปะเหลียน	ตรัง	5806E055	581363	804264	1	1	1	10.00	46.00	46.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
509	09007C1001410509	บ้านเนินกรวด	4	ลานดอกไม้ตก	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	5807F036	549912	1829897	1	1	1	4.00	45.00	32.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
510	09007C1001410510	บ้านโนนใน	8	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5807D031	593713	1835435	1	1	1	20.00	104.00	104.00	150	87,600				แล้วเสร็จ
511	09007C1001410511	บ้านหนองจิกกรี	4	หนองหญ้าปล้อง	บ้านด่าน ลานหอย	สุโขทัย												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
512	09007C1001410512	บ้านดอนเพชร	20	แม่สิน	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	5807F038	587410	1968261	1	1	1	16.00	40.00	32.00	150	70,080				แล้วเสร็จ
513	09007C1001410513	บ้านหัวนา	4	เนินเพิ่ม	นครไทย	พิษณุโลก	5807B039	700272	1893170	1	1	1	6.00	42.00	42.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
514	09007C1001410514	บ้านห้วยทรายทอง	7	บ้านพร้าว	นครไทย	พิษณุโลก	5807B037	680551	1895825	1	1	1	8.00	50.00	50.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
515	09007C1001410515	บ้านนาเหนือ	11	บ้านนา	วชิรบารมี	พิจิตร	5807F037	624430	1825667	1	1	1	18.00	80.00	74.00	150	78,840				แล้วเสร็จ
516	09007C1001410516	บ้านหนองสนวนเหนือ	2	ห้วยร่วม	ดงเจริญ	พิจิตร	5807E015	664512	1767689	1	1	1	5.00	70.00	63.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
517	09007C1001410517	บ้านไดรังใต้	5	ห้วยร่วม	ดงเจริญ	พิจิตร	5807E014	658384	1805430	1	1	1	1.00	98.00	98.00	150	4,380			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
518	09007C1001410518	บ้านเนิน	1	หนองชุมพล	เขาย้อย	เพชรบุรี	5808C058	588038	1468324	1	1	1	10.00	50.00	48.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
519	09007C1001410519	บ้านพุหวาย	6	ห้วยทรายเหนือ	ชะอำ	เพชรบุรี	5808C064	591866	1407883	1	1	1	10.00	74.00	42.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
520	09007C1001410520	บ้านสหกรณ์	10	ท่ายาง	ท่ายาง	เพชรบุรี												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
521	09007C1001410521	บ้านทุ่งแจง	2	แก้มอ้น	จอมบึง	ราชบุรี	5808B070	549735	1516920	1	1	1	5.00	70.00	70.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
522	09007C1001410522	บ้านคลองเสาธง	12	บางเสาธง	บางเสาธง	สมุทรปราการ												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
523	09007C1001410523	บ้านแสงทอง	13	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	5809B039	817889	1434880	1	1	1	3.00	92.00	80.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
524	09007C1001410524	บ้านคลองเรือ	15	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	5809C067	816864	1436014	1	1	1	3.00	92.00	90.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
525	09007C1001410525	บ้านคลองพริก	13	ขุนซ่อง	แก่งหางแมว	จันทบุรี	5809C068	175338	1440765	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
526	09007C1001410526	บ้านตกปก-ตาลึง	6	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	5809D043	209403	1385261	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
527	09007C1001410527	บ้านหนองกวาง	8	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	5809F036	205373	1390322	1	1	1	10.00	65.00	65.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
528	09007C1001410528	บ้านตกปก	9	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	5809F035	207073	1388063	1	1	1	4.00	95.00	95.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
529	09007C1001410529	บ้านคลองเหล็กบน	7	เขาแก้ว	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809E050	821234	1425446	1	1	1	10.00	72.00	72.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
530	09007C1001410530	บ้านเนินพุลศิลป์	6	พุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809A027	819732	1411661	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
531	09007C1001410531	บ้านไร่โอ่	1	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809F040	178409	1394891	1	1	1	10.00	86.00	86.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
532	09007C1001410532	บ้านหมู่	3	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809B044	178158	1393964	1	1	1	10.00	68.00	68.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
533	09007C1001410533	บ้านโรงน้ำมัน	4	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809B041	177382	1394828	1	1	1	5.00	62.00	62.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
534	09007C1001410534	บ้านทุ่งเพล	8	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	5809D045	183892	1410131	1	1	1	2.50	92.00	92.00	150	10,950				แล้วเสร็จ
535	09007C1001410535	บ้านโป่งวัว	6	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	5809B036	814550	1436466	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
536	09007C1001410536	บ้านน้ำเป็น	7	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	5809B038	819299	131434	1	1	1	5.00	92.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
537	09007C1001410537	บ้านคลองตาชิง	8	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	5809B037	816703	1431434	1	1	1	5.00	92.00	92.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
538	09007C1001410538	บ้านวังใหม่	14	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	5809B040	811899	1430789	1	1	1	10.00	74.00	74.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
539	09007C1001410539	บ้านนาบุญ	18	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	5809C066	813297	1433691	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
540	09007C1001410540	บ้านตะปอนใหญ่	1	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี	5809A024	193028	138076	1	1	1	3.00	72.00	60.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
541	09007C1001410541	บ้านตะปอนใหญ่	2	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี	5809A023	193208	1380988	1	1	1	3.00	72.00	60.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
542	09007C1001410542	บ้านหนองสมัด	4	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี	5809A025	190792	1382823	1	1	1	6.00	62.00	62.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
543	09007C1001410543	บ้านเนินมะหาด	3	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5809F033	179939	1418401	1	1	1	5.00	92.00	92.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
544	09007C1001410544	บ้านเนินมะหาดมูซู	5	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5809G038	179479	1416374	1	1	1	6.00	75.00	75.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
545	09007C1001410545	บ้านเขารูปช้าง	6	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5809G039	180607	1419708	1	1	1	5.00	68.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
546	09007C1001410546	บ้านคลองหินลอย	7	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5809G040	183237	1410607	1	1	1	3.00	74.00	74.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
547	09007C1001410547	บ้านว่านเหลือง	8	ชากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5809G037	183380	1416296	1	1	1	5.00	60.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
548	09007C1001410548	บ้านคลองกระสือ	7	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5809G041	184821	1424066	1	1	1	3.00	74.00	74.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
549	09007C1001410549	บ้านตะพง	1	เขาแก้ว	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809E048	821972	1420305	1	1	1	5.00	74.00	74.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
550	09007C1001410550	บ้านท่าปก	3	เขาแก้ว	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809E049	817910	1415268	1	1	1	10.00	74.00	74.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
551	09007C1001410551	บ้านตาเลียว	8	เขาแก้ว	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809E051	824167	1426900	1	1	1	5.00	74.00	74.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
552	09007C1001410552	บ้านโป่งกวาง	1	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809E052	176416	1403369	1	1	1	5.00	62.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
553	09007C1001410553	บ้านไร่ป่า	2	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809C072	176667	1399192	1	1	1	5.00	92.00	92.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
554	09007C1001410554	บ้านเขาบายศรี	4	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809C073	175897	1398856	1	1	1	5.00	92.00	92.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
555	09007C1001410555	บ้านเขาบายศรี	5	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809C071	174530	1398872	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
556	09007C1001410556	บ้านหนองบัว	8	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809G046	825856	1400901	1	1	1	5.00	80.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
557	09007C1001410557	บ้านยางระหง	10	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5609G042	180276	1409765	1	1	1	5.00	92.00	92.00	150	21,900				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
558	09007C1001410558	บ้านมาบโอน	11	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809G045	181352	1412155	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
559	09007C1001410559	บ้านเขาสุกิม	12	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809G047	179504	1414392	1	1	1	5.00	90.00	90.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
560	09007C1001410560	บ้านเขาลูกช้าง	8	พุงเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809A029	825548	1420010	1	1	1	4.00	74.00	74.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
561	09007C1001410561	บ้านเขายายเปลื่อง	10	พุงเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809A030	822181	1414916	1	1	1	8.00	72.00	72.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
562	09007C1001410562	บ้านพุงใหญ่	12	พุงเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809F039	822094	1417651	1	1	1	10.00	75.00	75.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
563	09007C1001410563	บ้านวัดลาด	2	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809F043	176818	1394828	1	1	1	9.00	70.00	70.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
564	09007C1001410564	บ้านวัดกลาง	7	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809B043	176837	1394345	1	1	1	5.00	68.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
565	09007C1001410565	บ้านวัดบน	8	บ่อพุ	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809B042	177365	1394258	1	1	1	5.00	62.00	62.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
566	09007C1001410566	บ้านสะท้อน	4	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5909G064	178117	1439266	1	1	1	3.00	120.00	120.00	150	13,140			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
567	09007C1001410567	บ้านคลิ้งชัน	5	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	5809D046	199263	1412716	1	1	1	2.00	84.00	84.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
568	09007C1001410568	บ้านแถวคลอง	1	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	5809E043	192840	1395448	1	1	1	5.00	84.00	84.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
569	09007C1001410569	บ้านทุ่งว่าเหลือง	2	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	5809E046	192355	1395435	1	1	1	15.00	62.00	62.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
570	09007C1001410570	บ้านโป่งล่าง	4	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	5809E044	191646	1394366	1	1	1	15.00	62.00	62.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
571	09007C1001410571	บ้านบ่อลึก	5	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	5809E045	192225	1394341	1	1	1	15.00	54.00	54.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
572	09007C1001410572	บ้านหนองฉวี	6	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809C074	178121	1403396	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
573	09007C1001410573	บ้านหนองฉวี	7	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809C075	175478	1401140	1	1	1	5.00	84.00	84.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
574	09007C1001410574	บ้านคลองกะพง	9	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809G043	180045	1407734	1	1	1	18.00	62.00	62.00	150	78,840				แล้วเสร็จ
575	09007C1001410575	บ้านหนองปรือ	8	เขาวัว	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809A026	177221	1398936	1	1	1	5.00	80.00	80.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
576	09007C1001410576	บ้านหนองเคล้า	1	แสลง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	5809E042	188564	1400128	1	1	1	10.00	62.00	62.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
577	09007C1001410577	บ้านเขากระแจะ	8	แสลง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	5809D044	183892	1410131	1	1	1	4.00	80.00	80.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
578	09007C1001410578	บ้านตรอกนองกลาง	3	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี	5809C069	205388	1386681	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
579	09007C1001410579	บ้านตรอกนองกลาง	4	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี	5809C070	203975	1388537	1	1	1	5.00	92.00	92.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
580	09007C1001410580	บ้านตรอกนองล่าง	5	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี	5809A022	204688	1388366	1	1	1	5.00	84.00	78.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
581	09007C1001410581	บ้านคลองขาง	6	ตรอกนอง	ขลุง	จันทบุรี	5809A021	204786	1385938	1	1	1	4.00	86.00	80.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
582	09007C1001410582	บ้านสะโทย	1	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	5809D040	202622	1391474	1	1	1	3.00	50.00	50.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
583	09007C1001410583	บ้านจังกื้น	2	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	5809D038	204353	1392593	1	1	1	10.00	74.00	74.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
584	09007C1001410584	บ้านตอน	4	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	5809D041	206954	1393195	1	1	1	5.00	74.00	74.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
585	09007C1001410585	บ้านร้อยรู	5	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	5809D042	205829	1389131	1	1	1	7.00	55.00	55.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
586	09007C1001410586	บ้านทุ่งสะพาน	1	ซากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5809F034	187156	1413513	1	1	1	16.00	62.00	62.00	150	70,080				แล้วเสร็จ
587	09007C1001410587	บ้านซากไทย	4	ซากไทย	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	5809F037	185163	1411664	1	1	1	5.00	75.00	75.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
588	09007C1001410588	บ้านเนินดินแดง	7	พุงเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809A028	178329	1416458	1	1	1	6.00	72.00	72.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
589	09007C1001410589	บ้านน้ำใส	11	พุงเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809F042	175465	1415055	1	1	1	9.00	116.00	116.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
590	09007C1001410590	บ้านบึงบอน	14	พุงเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	5809F041	175393	1415344	1	1	1	3.00	92.00	92.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
591	09007C1001410591	บ้านบ่อหิน	14	ตะพง	เมืองระยอง	ระยอง	5809D049	759273	1402511	1	1	1	2.50	92.00	92.00	150	10,950				แล้วเสร็จ
592	09007C1001410592	บ้านหนองน้ำดำ	5	หนองไร่	ปลวกแดง	ระยอง	5809D048	749213	1441840	1	1	1	2.50	92.00	92.00	150	10,950				แล้วเสร็จ
593	09007C1001410593	บ้านทดน้อย	7	ผักขะ	วัฒนานคร	สระแก้ว	5809D047	221742	1520831	1	1	1	8.00	92.00	92.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
594	09007C1001410594	บ้านกลางน้อย	11	นาแก	นาแก	นครพนม	5810G088	448459	1873160	1	1	1	10.00	30.00	24.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
595	09007C1001410595	บ้านหาดกวน	5	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	5810G086	436069	1947357	1	1	1	4.00	42.00	42.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
596	09007C1001410596	บ้านนาทมใต้	4	นาทม	นาทม	นครพนม	5810G085	400153	1972293	1	1	1	8.00	42.00	42.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
597	09007C1001410597	บ้านขามเตี้ยเหนือ	16	นาขมิ้น	โพนสวรรค์	นครพนม	5810G087	445496	1934546	1	1	1	10.00	42.00	42.00	150	43,800				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
598	09007C1001410598	บ้านโชคชัย	10	ดงมอน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	5810D054	446586	1842742	1	1	1	3.00	122.00	122.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
599	09007C1001410599	บ้านสงเปือย	3	ดงมอน	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	5810D055	447151	1842670	1	1	1	4.00	66.00	66.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
600	09007C1001410600	บ้านโพนธาตุ	6	บ้านว่าน	ท่าบ่อ	หนองคาย	5810B033	237475	1966085	1	1	1	2.00	48.00	36.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
601	09007C1001410601	บ้านดงเวร	5	สีกาย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	5810B034	274438	1986531	1	1	1	3.00	60.00	60.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
602	09007C1001410602	บ้านสังคมพัฒนา	8	สีกาย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	5810B041	278778	1987601	1	1	1	10.00	45.00	28.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
603	09007C1001410603	บ้านโนนแสงทอง	13	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	5810G089	319033	1996653	1	1	1	4.00	54.00	54.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
604	09007C1001410604	บ้านหนองนาแพง	3	วังหลวง	เฝ้าไร่	หนองคาย	5810G090	316041	2001801	1	1	1	4.00	48.00	48.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
605	09007C1001410605	บ้านไทยรุ่งเรือง	7	นางัว	น้ำโสม	อุดรธานี	5810D052	202251	1965658	1	1	1	10.00	50.00	50.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
606	09007C1001410606	บ้านนางัว	1	นางัว	น้ำโสม	อุดรธานี	5810D053	201997	1965555	1	1	1	10.00	56.00	56.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
607	09007C1001410607	บ้านดงสง่า	4	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	5810D051	328594	1946556	1	1	1	5.00	44.00	44.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
608	09007C1001410608	บ้านป่าเป้า	2	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	5810D050	328381	1950870	1	1	1	6.00	50.00	50.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
609	09007C1001410609	บ้านทุ่งพัฒนา	12	ทุ่งฝน	ทุ่งฝน	อุดรธานี	5810D056	312785	1933722	1	1	1	3.00	56.00	56.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
610	09007C1001410610	บ้านหนองเม็ก	7	หนองเม็ก	หนองหาน	อุดรธานี												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
611	09007C1001410611	บ้านหนองเม็ก	15	หนองเม็ก	หนองหาน	อุดรธานี												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
612	09007C1001410612	บ้านท่าสวรรค์	7	ปังไฮ	เซกา	บึงกาฬ	5810B039	382773	1987256	1	1	1	7.00	52.00	40.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
613	09007C1001410613	บ้านกลาง	4	ศรีชมภู	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	5810B036	336599	2016111	1	1	1	6.00	48.00	48.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
614	09007C1001410614	บ้านไทยเสรี	13	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	5810B040	389895	1991350	1	1	1	9.00	60.00	56.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
615	09007C1001410615	บ้านเหล่าเงิน	10	เหล่าทอง	โซ่พิสัย	บึงกาฬ	6010H025	333310	2004013	1	1	1	10.00	62.00	62.00	150	43,800			ไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
616	09007C1001410616	บ้านห้วยอีแอด	2	คำนาดี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	5810B038	355773	2013433	1	1	1	8.00	52.00	52.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
617	09007C1001410617	บ้านคำแสน	10	โคสี	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	5810B037	345475	2036145	1	1	1	3.00	56.00	48.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
618	09007C1001410618	บ้านนามน	11	ก่อเอ้	เขื่องใน	อุบลราชธานี	5811G046	462615	1700813	1	1	1	4.00	90.00	28.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
619	09007C1001410619	บ้านนาห้วยแคน	9	นาส่วง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	5911C009	494455	1658184	1	1	1	5.00	39.00	39.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
620	09007C1001410620	บ้านคำประเสริฐ	12	นากระแซง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	5911C007	485757	1643088	1	1	1	3.00	57.00	57.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
621	09007C1001410621	บ้านผือ	9	นาเลิง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	6111C043	459548	1720301	1	1	1	20.00	30.00	30.00	150	87,600			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
622	09007C1001410622	บ้านกุดกลอยเหนือ	17	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	5911C014	502488	1755553	1	1	1	8.00	24.00	24.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
623	09007C1001410623	บ้านกุดกลอย	20	โนนสวาง	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	5911C013	502463	1755299	1	1	1	4.00	60.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
624	09007C1001410624	บ้านหลักชัย	11	เหล่าบก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	5811G060	464421	1731938	1	1	1	5.00	20.00	20.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
625	09007C1001410625	บ้านหนองยอ	5	หนองไข่นก	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	5811G047	476689	1703368	1	1	1	4.00	48.00	42.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
626	09007C1001410626	บ้านไผ่ใหญ่	8	ไผ่ใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	5811G048	460910	1725727	1	1	1	15.00	30.00	20.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
627	09007C1001410627	บ้านแจ้งสว่าง	15	เมืองเดช	เดชอุดม	อุบลราชธานี	5911C008	510316	1643872	1	1	1	4.00	75.00	75.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
628	09007C1001410628	บ้านคอนสาย	3	โนนโหนน	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	5911C001	480617	1669951	1	1	1	5.00	30.00	30.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
629	09007C1001410629	บ้านวังคู่	16	กุศชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911H009	525833	1684521	1	1	1	15.00	45.00	22.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
630	09007C1001410630	บ้านโนนโพธิ์	18	กุศชมภู	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911C010	525290	1678964	1	1	1	7.00	42.00	42.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
631	09007C1001410631	บ้านโคกสะอาด	15	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911H004	531226	1669385	1	1	1	4.00	40.00	24.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
632	09007C1001410632	บ้านบ่วงงาม	18	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911H008	531615	1678069	1	1	1	3.00	48.00	16.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
633	09007C1001410633	บ้านทุ่งแสงตะวัน	19	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911H006	532560	1675791	1	1	1	4.00	42.00	16.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
634	09007C1001410634	บ้านใหม่ผาสุข	21	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911H005	533407	1672547	1	1	1	5.00	48.00	16.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
635	09007C1001410635	บ้านแก่งเจริญสุข	22	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911H007	531450	1674927	1	1	1	3.00	60.00	16.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
636	09007C1001410636	บ้านทุ่งเทวา	23	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911H003	529886	1671824	1	1	1	4.00	42.00	16.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
637	09007C1001410637	บ้านผักหย่าไค้	2	โรไค้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911C011	515656	1678719	1	1	1	10.00	24.00	24.00	150	43,800				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
638	09007C1001410638	บ้านโนนสร้างคำ	15	ไร่ใต้	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	5911C012	509976	1675315	1	1	1	5.00	36.00	36.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
639	09007C1001410639	บ้านนาห่อม	9	หนองฮาง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	6111G051	462711	1715392	1	1	1	35.00	32.00	32.00	150	153,300			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
640	09007C1001410640	บ้านหนองไฮน้อย	12	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	5911C003	478244	1647278	1	1	1	8.00	30.00	30.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
641	09007C1001410641	บ้านพรสวรรค์	17	ค้อน้อย	สำโรง	อุบลราชธานี	5911C002	482587	1652145	1	1	1	4.00	63.00	63.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
642	09007C1001410642	บ้านประชาสรรค์	12	ตาดทอง	เมืองยโสธร	ยโสธร	5811G050	413087	1742484	1	1	1	5.00	36.00	33.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
643	09007C1001410643	บ้านเหล่าโป่	2	ทุ่งมน	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	5811G049	422578	1740285	1	1	1	15.00	42.00	30.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
644	09007C1001410644	บ้านเหล่าตำแย	6	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	5911E011	343317	1785273	1	1	1	4.00	90.00	90.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
645	09007C1001410645	บ้านโนน	9	สีแก้ว	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	5911E010	341551	1785757	1	1	1	3.00	60.00	60.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
646	09007C1001410646	บ้านหนองบัวแดงน้อย	13	สระบัว	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	5911E001	323172	1723104	1	1	1	5.00	42.00	32.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
647	09007C1001410647	บ้านหนองกระเดา	9	โคกล่าม	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	5911E006	342531	1761868	1	1	1	5.00	110.00	110.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
648	09007C1001410648	บ้านกุดแคน	2	ดงกลาง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	5911E005	350000	1747656	1	1	1	5.00	68.00	68.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
649	09007C1001410649	บ้านดงยาง	1	ตู้น้อย	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	5911E004	335859	1742672	1	1	1	6.00	32.00	32.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
650	09007C1001410650	บ้านธวัชชัย	14	นิเวศน์	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	5911E007	365382	1774450	1	1	1	5.00	78.00	78.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
651	09007C1001410651	บ้านก้างปลา	6	หนองไผ่	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	5911E008	363010	1769158	1	1	1	5.00	74.00	74.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
652	09007C1001410652	บ้านโนนสมบูรณ์	5	ค้อใหญ่	พนมไพร	ร้อยเอ็ด	5911E018	407329	1725062	1	1	1	10.00	33.00	22.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
653	09007C1001410653	บ้านหนองบัว	7	ขามเปี้ย	โพธิ์ชัย	ร้อยเอ็ด	5911E012	365512	1837957	1	1	1	5.00	60.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
654	09007C1001410654	บ้านแก้ง	2	โคกสว่าง	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	5911E014	420673	1797131	1	1	1	2.00	50.00	50.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
655	09007C1001410655	บ้านคอนน้ำสร้าง	4	เมืองไพร	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	5911E016	391873	1770631	1	1	1	7.00	48.00	48.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
656	09007C1001410656	บ้านหนองไผ่	11	ศรีวิลัย	เสลภูมิ	ร้อยเอ็ด	5911E015	401871	1782503	1	1	1	12.00	56.00	56.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
657	09007C1001410657	บ้านหนองจอก	3	นาใหญ่	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	5811H034	368762	1737945	1	1	1	6.00	36.00	18.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
658	09007C1001410658	บ้านหนองนกเขียน	2	เมยวดี	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	6111F041	408749	1812021	1	1	1	6.00	42.00	42.00	150	26,280			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
659	09007C1001410659	บ้านโพนดวน	1	ศรีสว่าง	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	5911E019	376586	1716655	1	1	1	4.00	42.00	42.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
660	09007C1001410660	บ้านบาก	6	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	5811G051	340528	1788661	1	1	1	7.00	31.00	31.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
661	09007C1001410661	บ้านดงเค็ง	9	ผักแว่น	จังหาร	ร้อยเอ็ด	5811G052	344268	1790277	1	1	1	15.00	24.00	20.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
662	09007C1001410662	บ้านสะอาดสามัคคี	3	ชมสะอาด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	6111F040	402926	1810519	1	1	1	5.00	45.00	45.00	150	21,900			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
663	09007C1001410663	บ้านหวายหลีม	6	มะบ้า	ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	5911E017	380243	1772682	1	1	1	8.00	36.00	20.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
664	09007C1001410664	บ้านหนองแข้	13	ขำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5811E044	425955	1660955	1	1	1	10.00	42.00	42.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
665	09007C1001410665	บ้านซ่องชาด	6	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5811B035	435850	1656743	1	1	1	7.00	42.00	26.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
666	09007C1001410666	บ้านลิงโอ	11	จาน	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5811B034	434647	1657138	1	1	1	7.00	42.00	26.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
667	09007C1001410667	บ้านวังไฮ	4	หญ้าปล้อง	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5811E049	426554	1673723	1	1	1	10.00	32.00	32.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
668	09007C1001410668	บ้านหนองทามใหญ่	6	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811C033	458139	1664281	1	1	1	4.00	45.00	45.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
669	09007C1001410669	บ้านปุข้าวคอ	4	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5811E048	425042	1679440	1	1	1	4.00	42.00	42.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
670	09007C1001410670	บ้านน้ำคำ	6	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5811E046	424339	1679168	1	1	1	8.00	38.00	38.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
671	09007C1001410671	บ้านอีลอก	2	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5811E041	433941	1671998	1	1	1	7.00	36.00	32.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
672	09007C1001410672	บ้านโนนจาน	3	โพธิ์	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	5811E043	433878	1672687	1	1	1	7.00	38.00	38.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
673	09007C1001410673	บ้านตอนเหมือดแอ่	7	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	5811E050	427315	1686422	1	1	1	10.00	30.00	16.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
674	09007C1001410674	บ้านทุ่งพาย	3	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811G042	460399	1666466	1	1	1	4.00	66.00	24.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
675	09007C1001410675	บ้านหนองหัวช้าง	5	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811G036	460633	1662831	1	1	1	4.00	54.00	20.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
676	09007C1001410676	บ้านลือชัย	6	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811G037	463074	1659698	1	1	1	7.00	42.00	42.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
677	09007C1001410677	บ้านโนนสีโคล	8	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811G038	461871	1660313	1	1	1	20.00	42.00	24.00	150	87,600				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
678	09007C1001410678	บ้านร่องน้ำคำ	10	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811G040	462601	1660885	1	1	1	6.00	42.00	24.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
679	09007C1001410679	บ้านหนองตุม	2	หนองหัวช้าง	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811G033	459504	1665545	1	1	1	8.00	60.00	24.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
680	09007C1001410680	บ้านหมัด	3	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811H028	457831	1680885	1	1	1	10.00	48.00	20.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
681	09007C1001410681	บ้านผึ้ง	4	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811H030	455503	1685817	1	1	1	8.00	39.00	28.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
682	09007C1001410682	บ้านเจี๊ย	6	ทาม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811H029	459208	1682590	1	1	1	7.00	42.00	24.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
683	09007C1001410683	บ้านละทาย	9	ละทาย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811G041	455024	1679749	1	1	1	15.00	24.00	24.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
684	09007C1001410684	บ้านหนองมุข	5	เมืองน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811H027	452272	1683984	1	1	1	6.00	54.00	30.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
685	09007C1001410685	บ้านหนองไฮ	3	อีปาด	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811H026	448613	1685505	1	1	1	6.00	60.00	36.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
686	09007C1001410686	บ้านแวง	1	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811H024	440152	1676944	1	1	1	5.00	48.00	27.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
687	09007C1001410687	บ้านพันลำ	5	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811H025	444671	1677746	1	1	1	8.00	45.00	24.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
688	09007C1001410688	บ้านโนนปอ	7	บัวน้อย	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811C038	446304	1677250	1	1	1	15.00	33.00	33.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
689	09007C1001410689	บ้านหนองเม่	3	คู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811C037	444315	1667036	1	1	1	5.00	40.00	40.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
690	09007C1001410690	บ้านเหมือดแอ่	4	คู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811C036	447371	1669639	1	1	1	5.00	42.00	42.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
691	09007C1001410691	บ้านประอาง	3	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5811D041	430671	1636720	1	1	1	4.00	70.00	50.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
692	09007C1001410692	บ้านโนนสมบูรณ์	12	จาน	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811C034	448649	1656435	1	1	1	5.00	45.00	45.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
693	09007C1001410693	บ้านหนองอีกว่าง	5	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5811C032	457352	1664148	1	1	1	4.00	48.00	48.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
694	09007C1001410694	บ้านน้ำขวบ	2	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5811G059	465907	1606128	1	1	1	30.00	42.00	28.00	150	131,400				แล้วเสร็จ
695	09007C1001410695	บ้านศรีสะอาด	15	บึงมะลู	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5811G058	470036	1604452	1	1	1	5.00	72.00	28.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
696	09007C1001410696	บ้านณรงค์	4	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5811G056	481627	1617387	1	1	1	10.00	60.00	28.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
697	09007C1001410697	บ้านโนนพิทักษ์	16	กุดเสลา	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5811G057	482381	1624262	1	1	1	25.00	42.00	28.00	150	109,500				แล้วเสร็จ
698	09007C1001410698	บ้านจานเลียว	4	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5911B039	462761	1610348	1	1	1	7.00	44.00	26.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
699	09007C1001410699	บ้านโนนเปือย	6	เมือง	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5911B038	463598	1614162	1	1	1	10.00	44.00	26.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
700	09007C1001410700	บ้านตาสุ	6	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	6111D047	406388	1631806	1	1	1	5.00	60.00	60.00	150	21,900			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
701	09007C1001410701	บ้านชำนะกลาง	10	ห้วยเหนือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	6111D048	418560	1628826	1	1	1	7.00	42.00	42.00	150	30,660			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
702	09007C1001410702	บ้านโคก	1	ตระกาจ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5811G054	459238	1631062	1	1	1	6.00	60.00	28.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
703	09007C1001410703	บ้านโนนขาม	12	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5811G055	462750	1630866	1	1	1	25.00	48.00	24.00	150	109,500				แล้วเสร็จ
704	09007C1001410704	บ้านหนองตาสา	14	จานใหญ่	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5811G053	461088	1631763	1	1	1	15.00	42.00	30.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
705	09007C1001410705	บ้านสว่าง	6	พุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	6111G048	411358	1662082	1	1	1	18.00	42.00	42.00	150	78,840			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
706	09007C1001410706	บ้านราษีพัฒนา	2	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	6111E049	410689	1626232	1	1	1	5.00	30.00	30.00	150	21,900			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
707	09007C1001410707	บ้านหนองผักไหม	15	พุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	6111G048	411358	1662082	1	1	1	18.00	42.00	42.00	150	78,840			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
708	09007C1001410708	บ้านใจดี	1	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911H010	410500	1630637	1	1	1	4.00	50.00	24.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
709	09007C1001410709	บ้านพะเยียว	2	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911H011	408030	1631127	1	1	1	3.00	60.00	24.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
710	09007C1001410710	บ้านทะลอก	3	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D045	410018	1633296	1	1	1	7.00	72.00	50.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
711	09007C1001410711	บ้านอังกุล	7	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D046	405331	1629648	1	1	1	5.00	67.00	50.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
712	09007C1001410712	บ้านใจดีเหนือ	10	ใจดี	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D047	410497	1630970	1	1	1	7.00	66.00	43.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
713	09007C1001410713	บ้านตราด	7	ดองกำเม็ด	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D043	414555	1636775	1	1	1	7.00	66.00	37.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
714	09007C1001410714	บ้านสวาย	7	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D050	400958	1617533	1	1	1	4.00	80.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
715	09007C1001410715	บ้านสี่เยกนาเจริญ	9	โสน	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D051	402164	1617867	1	1	1	7.00	72.00	55.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
716	09007C1001410716	บ้านปรือคันตะวันตก	7	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D052	414826	1616863	1	1	1	4.00	86.00	72.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
717	09007C1001410717	บ้านสำโรงสูง	3	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D010	419624	1627738	1	1	1	5.00	66.00	37.00	150	21,900				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
718	09007C1001410718	บ้านจะลง	9	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D009	422488	1628072	1	1	1	4.00	72.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
719	09007C1001410719	บ้านหนองดินไต้	15	สะเดาใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D011	425237	1627261	1	1	1	4.00	72.00	50.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
720	09007C1001410720	บ้านโนนสามัคคี	18	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	5911D040	410703	1641902	1	1	1	4.00	61.00	20.00	150	17,520			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
721	09007C1001410721	บ้านตาหึง	11	หัวเสือ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D048	411697	1627792	1	1	1	6.00	72.00	50.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
722	09007C1001410722	บ้านกวางขาว	7	นิคมพัฒนา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D015	416193	1618217	1	1	1	5.00	80.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
723	09007C1001410723	บ้านเสลา	6	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D002	407608	1639473	1	1	1	7.00	66.00	43.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
724	09007C1001410724	บ้านระกาน้อย	9	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D001	410183	1635776	1	1	1	5.00	72.00	50.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
725	09007C1001410725	บ้านสุขเกษม	11	โคกเพชร	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D003	407205	1639935	1	1	1	7.00	60.00	37.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
726	09007C1001410726	บ้านนาก๊อกตะวันออก	7	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D049	406635	1628069	1	1	1	5.00	80.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
727	09007C1001410727	บ้านแพรงเหนือ	11	ห้วยสำราญ	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D003	407205	1639935	1	1	1	7.00	60.00	37.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
728	09007C1001410728	บ้านทุ่งศักดิ์	1	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D044	423677	1633035	1	1	1	5.00	73.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
729	09007C1001410729	บ้านอาทิ	2	ลมศักดิ์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811H033	424181	1634012	1	1	1	15.00	48.00	42.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
730	09007C1001410730	บ้านเคาะ	1	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D007	424225	1618280	1	1	1	8.00	70.00	50.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
731	09007C1001410731	บ้านละเบิก	4	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911D008	423033	1619774	1	1	1	10.00	66.00	43.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
732	09007C1001410732	บ้านตาอิง	5	ศรีตระกูล	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5911H012	423369	1618214	1	1	1	12.00	42.00	24.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
733	09007C1001410733	บ้านสวาย	2	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911C004	431866	1632355	1	1	1	6.00	30.00	30.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
734	09007C1001410734	บ้านสนวน	18	ไพรบึง	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911C005	432437	1632814	1	1	1	7.00	30.00	30.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
735	09007C1001410735	บ้านชะยอม	9	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	6111B041	414186	1671352	1	1	1	4.00	26.00	26.00	150	17,520			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
736	09007C1001410736	บ้านน้อยผักหม	14	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	6111B042	412976	1668970	1	1	1	4.00	32.00	32.00	150	17,520			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
737	09007C1001410737	บ้านตาดวด	16	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
738	09007C1001410738	บ้านเตร็ียะ	5	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5811D040	431564	1635475	1	1	1	4.00	80.00	73.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
739	09007C1001410739	บ้านประอางเหนือ	11	ปราสาทเยอ	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5811D042	430597	1636845	1	1	1	5.00	70.00	43.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
740	09007C1001410740	บ้านสะเดาน้อย	3	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911C006	426367	1621366	1	1	1	4.00	69.00	69.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
741	09007C1001410741	บ้านไม้แก่น	12	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911H015	427515	1626082	1	1	1	7.00	42.00	20.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
742	09007C1001410742	บ้านสำโรงธรรม	13	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911H016	430327	1625969	1	1	1	12.00	48.00	16.00	150	52,560				แล้วเสร็จ
743	09007C1001410743	บ้านตาโมกข์	14	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911H013	426120	1622296	1	1	1	3.00	48.00	16.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
744	09007C1001410744	บ้านตาตุม	17	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911H014	426565	1624392	1	1	1	8.00	40.00	16.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
745	09007C1001410745	บ้านระหาร	10	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911D005	426971	1640131	1	1	1	10.00	66.00	43.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
746	09007C1001410746	บ้านสุขสวัสดิ์	11	สุขสวัสดิ์	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911D006	430878	1643240	1	1	1	5.00	55.00	33.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
747	09007C1001410747	บ้านหนองระเยียว	2	โนนปูน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	5911D004	425839	1644144	1	1	1	5.00	72.00	55.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
748	09007C1001410748	บ้านละเอิง	11	พิมาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804G035	393835	1639442	1	1	1	5.00	42.00	36.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
749	09007C1001410749	บ้านกำแมด	3	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804F036	405809	1646759	1	1	1	4.00	36.00	30.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
750	09007C1001410750	บ้านมัดกา	4	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804F028	401645	1642285	1	1	1	5.00	42.00	42.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
751	09007C1001410751	บ้านแขม	9	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804F032	399499	1641725	1	1	1	8.00	42.00	42.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
752	09007C1001410752	บ้านหนองแต้	11	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804F033	400273	1644457	1	1	1	5.00	74.00	74.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
753	09007C1001410753	บ้านป่าบาก	17	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804F030	405598	1646565	1	1	1	6.00	38.00	38.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
754	09007C1001410754	บ้านทางโค้ง	18	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804F035	404635	1644909	1	1	1	6.00	44.00	42.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
755	09007C1001410755	บ้านแจนแลน	19	หนองเชียงทูน	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804C032	405958	1647662	1	1	1	6.00	48.00	42.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
756	09007C1001410756	บ้านกระโพธิ์	2	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5811H031	388429	1646268	1	1	1	3.00	75.00	65.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
757	09007C1001410757	บ้านรงระ	8	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5811C039	393460	1649635	1	1	1	5.00	45.00	45.00	150	21,900				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
758	09007C1001410758	บ้านตรอก	10	ดูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804C028	394910	1646875	1	1	1	9.00	36.00	30.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
759	09007C1001410759	บ้านนาเวียง	1	สมอ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804C029	402222	1637010	1	1	1	9.00	32.00	28.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
760	09007C1001410760	บ้านกอกหวาน	1	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804D033	401699	1633477	1	1	1	5.00	44.00	44.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
761	09007C1001410761	บ้านหนองบัวบัลลังก์	6	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804D035	405062	1634037	1	1	1	6.00	40.00	38.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
762	09007C1001410762	บ้านดงตาดทอง	10	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804D034	402825	1635008	1	1	1	10.00	38.00	36.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
763	09007C1001410763	บ้านกอกหวานใต้	12	โพธิ์ศรี	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804D032	401468	1633145	1	1	1	5.00	44.00	44.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
764	09007C1001410764	บ้านดอนชุมป่ายาง	20	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	5810A050	411758	1706823	1	1	1	3.00	24.00	24.00	150	13,140			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
765	09007C1001410765	บ้านท่าคอยนาง	5	สวาย	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804C027	385694	1647338	1	1	1	7.00	42.00	36.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
766	09007C1001410766	บ้านเหล็ก	4	พิมายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804G033	395791	1644618	1	1	1	5.00	42.00	40.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
767	09007C1001410767	บ้านชุมค่า	22	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	6111E048	407421	1653277	1	1	1	5.00	36.00	36.00	150	21,900			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
768	09007C1001410768	บ้านโพธิ์สามัคคี	8	พิมายเหนือ	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	5804G034	397607	1647399	1	1	1	5.00	54.00	54.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
769	09007C1001410769	บ้านห้วย	7	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	5911D013	441244	1617109	1	1	1	10.00	50.00	31.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
770	09007C1001410770	บ้านโนนศรีทอง	11	สิ	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	5911D014	440476	1617824	1	1	1	10.00	48.00	28.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
771	09007C1001410771	บ้านกระหวัน	4	กระหวัน	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	5911D012	435694	1620343	1	1	1	6.00	60.00	37.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
772	09007C1001410772	บ้านกระเดา	12	คู่	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	5810A050	411758	1706823	1	1	1	3.00	24.00	24.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
773	09007C1001410773	บ้านหนองคูน้อย	10	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	5810A051	404238	1692974	1	1	1	8.00	42.00	38.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
774	09007C1001410774	บ้านกอก	12	บัวหุ่ง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	5810A052	405922	1689696	1	1	1	6.00	36.00	30.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
775	09007C1001410775	บ้านสองห้อง	8	กำแพง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5810E045	408844	1671010	1	1	1	3.00	32.00	32.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
776	09007C1001410776	บ้านสระภูน้อย	9	กำแพง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5810E046	409986	1668773	1	1	1	3.00	32.00	32.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
777	09007C1001410777	บ้านสำโรง	1	สำโรง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5810E048	408683	1673100	1	1	1	3.00	26.00	24.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
778	09007C1001410778	บ้านหนองฉ่ม	8	คู่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	5810E047	408913	1674694	1	1	1	4.00	42.00	38.00	150	17,520			ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
779	09007C1001410779	บ้านโนนเค็ง	6	หนองไฮ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5804C030	399421	1672678	1	1	1	10.00	36.00	32.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
780	09007C1001410780	บ้านห่องไหล	8	ขะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5804C031	418875	1670282	1	1	1	5.00	36.00	30.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
781	09007C1001410781	บ้านตาเกษ	1	ตาเกษ	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5810A053	412501	1674493	1	1	1	3.00	60.00	60.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
782	09007C1001410782	บ้านกลาง	9	หัวช้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5810A054	406996	1687240	1	1	1	4.00	36.00	30.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
783	09007C1001410783	บ้านตู่	4	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5810E043	414761	1670636	1	1	1	4.00	26.00	26.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
784	09007C1001410784	บ้านฝาง	5	ปะอาว	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5810E044	414747	1668831	1	1	1	3.00	42.00	32.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
785	09007C1001410785	บ้านหลักป้าย	8	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5804G037	403403	1664215	1	1	1	7.00	26.00	26.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
786	09007C1001410786	บ้านสำโรงน้อย	16	หนองห้าง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5804G036	402865	1668821	1	1	1	9.00	26.00	26.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
787	09007C1001410787	บ้านเหมี่ยง	6	โคกหล่าม	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5804G038	410847	1684689	1	1	1	8.00	26.00	26.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
788	09007C1001410788	บ้านโปร่งสามัคคี	5	โคกจาน	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ	5811B041	403422	1653838	1	1	1	8.00	32.00	22.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
789	09007C1001410789	บ้านค้อ	6	เป๊าะ	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ	5810A055	401274	1692766	1	1	1	5.00	36.00	30.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
790	09007C1001410790	บ้านหนองเมย	9	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	5811G043	396436	1661144	1	1	1	6.00	42.00	24.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
791	09007C1001410791	บ้านหว้า	6	ปราสาท	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ	5811E045	397052	1672640	1	1	1	5.00	42.00	42.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
792	09007C1001410792	บ้านหนองกระดัน	8	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	6111A049	422521	1654383	1	1	1	5.00	29.00	29.00	150	21,900			ซ้ำซ้อน	เปลี่ยนแปลงพื้นที่
793	09007C1001410793	บ้านโนนสว่าง	3	บก	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	5811F039	464622	1658672	1	1	1	5.00	60.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
794	09007C1001410794	บ้านทุ่งรวงทอง	5	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	5811F037	461978	1650033	1	1	1	6.00	30.00	30.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
795	09007C1001410795	บ้านหนองแก	9	โพธิ์	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	5811F036	461916	1649985	1	1	1	6.00	42.00	42.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
796	09007C1001410796	บ้านนาฆ่อง	2	เหล่ากวาง	โนนคูณ	ศรีสะเกษ	5811F035	461913	1643084	1	1	1	8.00	36.00	36.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
797	09007C1001410797	บ้านสะพุงน้อย	4	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	5811A047	440864	1636654	1	1	1	7.00	36.00	26.00	150	30,660				แล้วเสร็จ

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
798	09007C1001410798	บ้านพิงพวย	7	พิงพวย	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	5811A048	440134	1631601	1	1	1	7.00	42.00	26.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
799	09007C1001410799	บ้านชุมกระแซงราษฎร์	9	ดูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	5811A044	446111	1642369	1	1	1	6.00	42.00	29.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
800	09007C1001410800	บ้านสามสิบเอ็ดพัฒนา	10	ดูม	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	5811A045	440820	1641917	1	1	1	5.00	40.00	26.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
801	09007C1001410801	บ้านนาเจริญ	13	สะพุง	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	5811A046	441665	1640010	1	1	1	5.00	36.00	20.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
802	09007C1001410802	บ้านบางกระวาน	15	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D053	416028	1615429	1	1	1	4.00	80.00	60.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
803	09007C1001410803	บ้านหนองนาเวียง	7	น้ำเกลี้ยง	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	5811F033	447895	1651348	1	1	1	8.00	48.00	32.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
804	09007C1001410804	บ้านหนองอาสร	16	ปรือใหญ่	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	5811D054	421717	1610849	1	1	1	7.00	60.00	36.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
805	09007C1001410805	บ้านยางน้อย	2	ตองปิด	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	5811C035	443493	1653621	1	1	1	3.00	75.00	75.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
806	09007C1001410806	บ้านโนนสว่าง	6	เขิน	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	5811F032	457192	1638872	1	1	1	8.00	75.00	50.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
807	09007C1001410807	บ้านสบายใต้	1	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	5811A043	448728	1644899	1	1	1	10.00	40.00	26.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
808	09007C1001410808	บ้านสบาย	3	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	5811A042	450656	1645037	1	1	1	6.00	40.00	32.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
809	09007C1001410809	บ้านสบายเหนือ	14	รุ่งระวี	น้ำเกลี้ยง	ศรีสะเกษ	5811F031	448436	1645094	1	1	1	4.00	42.00	20.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
810	09007C1001410810	บ้านหนองหว้า	12	บุสูง	วังหิน	ศรีสะเกษ	5811A049	407462	1654595	1	1	1	7.00	40.00	26.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
811	09007C1001410811	บ้านหนองม่วง	4	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	5811D035	420089	1654087	1	1	1	7.00	66.00	55.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
812	09007C1001410812	บ้านโนนคู่	7	ดวนใหญ่	วังหิน	ศรีสะเกษ	5811D036	421463	1653893	1	1	1	7.00	50.00	31.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
813	09007C1001410813	บ้านหนองพุ่มน้อย	3	ศรีสำราญ	วังหิน	ศรีสะเกษ	5811F034	413213	1647515	1	1	1	5.00	52.00	52.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
814	09007C1001410814	บ้านเจ้าพุ่ง	9	พุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	5811D033	416232	1660199	1	1	1	5.00	66.00	55.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
815	09007C1001410815	บ้านท่าสำราญ	10	พุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	5811D039	413326	1662842	1	1	1	5.00	42.00	18.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
816	09007C1001410816	บ้านน้ำท่วม	12	พุ่งสว่าง	วังหิน	ศรีสะเกษ	5811D032	413821	1659802	1	1	1	6.00	60.00	50.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
817	09007C1001410817	บ้านหลักป้าย	7	วังหิน	วังหิน	ศรีสะเกษ	5811D034	424145	1650708	1	1	1	7.00	54.00	36.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
818	09007C1001410818	บ้านบก	1	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	5804A032	395325	1676386	1	1	1	4.00	54.00	42.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
819	09007C1001410819	บ้านหนองโน	14	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	5804A023	398893	1674755	1	1	1	5.00	43.00	43.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
820	09007C1001410820	บ้านหนองเรือ	25	เมืองจันทร์	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	5804A024	399041	1676450	1	1	1	30.00	44.00	32.00	150	131,400				แล้วเสร็จ
821	09007C1001410821	บ้านหนองตาด	6	ตาโกน	เมืองจันทร์	ศรีสะเกษ	5804A026	391020	1682125	1	1	1	15.00	31.00	31.00	150	65,700				แล้วเสร็จ
822	09007C1001410822	บ้านหนองไผ่	12	พยุห์	พยุห์	ศรีสะเกษ	5811B039	432471	1649620	1	1	1	9.00	54.00	38.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
823	09007C1001410823	บ้านป่าไร่	8	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	5811B037	439115	1640621	1	1	1	10.00	48.00	30.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
824	09007C1001410824	บ้านโนนสว่าง	15	พรหมสวัสดิ์	พยุห์	ศรีสะเกษ	5811B038	436236	1640743	1	1	1	9.00	54.00	38.00	150	39,420				แล้วเสร็จ
825	09007C1001410825	บ้านอะลาง	6	ตำแย	พยุห์	ศรีสะเกษ	5811B036	438179	1645795	1	1	1	10.00	42.00	32.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
826	09007C1001410826	บ้านโคกเพ็ก	9	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	5811D037	431230	1650280	1	1	1	10.00	54.00	37.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
827	09007C1001410827	บ้านโพธิ์ศรี	10	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	5811D038	427079	1649688	1	1	1	10.00	48.00	31.00	150	43,800				แล้วเสร็จ
828	09007C1001410828	บ้านยางปอ	11	โนนเพ็ก	พยุห์	ศรีสะเกษ	5811B040	426266	1652062	1	1	1	6.00	54.00	44.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
829	09007C1001410829	บ้านหนองไผ่	3	หนองม้า	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	5804A030	400359	1685661	1	1	1	4.00	30.00	30.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
830	09007C1001410830	บ้านหนองแวง	7	หนองม้า	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	5804A031	400933	1685279	1	1	1	5.00	50.00	30.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
831	09007C1001410831	บ้านแสง	1	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	5804D030	393690	1685917	1	1	1	7.00	32.00	32.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
832	09007C1001410832	บ้านห่องเปือย	8	อีเซ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	ศรีสะเกษ	5804D031	393731	1686200	1	1	1	6.00	52.00	50.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
833	09007C1001410833	บ้านคำสร้างบ่อ	4	น้ำปลีก	เมือง ศักดิ์ชาเจริญ	อำนาจเจริญ	5811H032	449205	1746760	1	1	1	4.00	45.00	24.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
834	09007C1001410834	บ้านหนองหินใต้	11	หนองมะแซว	เมือง ศักดิ์ชาเจริญ	อำนาจเจริญ												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
835	09007C1001410835	บ้านบาลา	5	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
836	09007C1001410836	บ้านสาวอ	8	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
837	09007C1001410837	บ้านเจ๊ะยอ	3	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อบ่อ	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./ชม.	ความลึก (เมตร) ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	ครัวเรือน รับประโยชน์	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./ปี	ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
838	09007C1001410838	บ้านเขาสามสิบ	6	โละจูด	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
839	09007C1001410839	บ้านตำเสา	6	ยอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
840	09007C1001410840	บ้านผ่านศึก	5	ยอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
841	09007C1001410841	บ้านกะดูนง	2	ยอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
842	09007C1001410842	บ้านบางทุด	1	ยอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
843	09007C1001410843	บ้านจะมาแก๊ะ	3	ยอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
844	09007C1001410844	บ้านกีแยมัส	4	ยอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
845	09007C1001410845	บ้านบูเกะ	5	มูโนะ	สุไหงโก-ลก	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
846	09007C1001410846	บ้านปลักปลา	5	ไพบิต	ตากใบ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
847	09007C1001410847	บ้านโคกเมือบา	4	ไพบิต	ตากใบ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
848	09007C1001410848	บ้านปะลุกา	3	ไพบิต	ตากใบ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
849	09007C1001410849	บ้านสะหริง	1	ไพบิต	ตากใบ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
850	09007C1001410850	บ้านบูเกะกือจิ	12	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
851	09007C1001410851	บ้านบูเกะตาโมง	7	บูกิต	เจาะไอร้อง	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
852	09007C1001410852	บ้านบูเก๊ะบูแย	11	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส	5832N011	801435	693901	1	1	1	5.00	79.00	76.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
853	09007C1001410853	บ้านตันหยงมัส	1	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส	5832N010	803303	693438	1	1	1	2.00	76.00	74.00	150	8,760				แล้วเสร็จ
854	09007C1001410854	บ้านโต๊ะเปาะยะ	10	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส	5832N008	800113	697462	1	1	1	4.00	78.00	78.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
855	09007C1001410855	บ้านร่อน	2	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส	5832N006	802814	697869	1	1	1	5.00	74.00	74.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
856	09007C1001410856	บ้านไทย	3	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส	5832N007	802158	698095	1	1	1	6.00	77.00	77.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
857	09007C1001410857	บ้านบาตง	3	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
858	09007C1001410858	บ้านแกแม	4	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส	5832N009	804316	698529	1	1	1	6.00	75.00	75.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
859	09007C1001410859	บ้านแกแมเก้า	9	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
860	09007C1001410860	บ้านบูเก๊ะมูนิง	4	มะรือโบตก	ระแงะ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
861	09007C1001410861	บ้านบลูกาอีเลตะวันตก	8	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
862	09007C1001410862	บ้านบลูกาอีเล	6	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
863	09007C1001410863	บ้านบาโงอาแซ	6	ตันหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
864	09007C1001410864	บ้านบริจัะ	7	ลาโละ	รือเสาะ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
865	09007C1001410865	บ้านอาแว	6	มะรือโบตก	ระแงะ	นราธิวาส												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
866	09007C1001410866	บ้านสันติสุข	2	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
867	09007C1001410867	บ้านฮีนอ	3	ลาโละ	รือเสาะ	นราธิวาส												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
868	09007C1001410868	บ้านตะแม็ง	1	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
869	09007C1001410869	บ้านบูเก๊ะ	7	บาตง	รือเสาะ	นราธิวาส												1	ซ้ำซ้อน		ยกเลิก
870	09007C1001410870	บ้านลุโบะบือซา	1	ลุโบะบือซา	ยี่งอ	นราธิวาส	5832N003	799433	710567	1	1	1	3.00	73.00	73.00	150	13,140				แล้วเสร็จ
871	09007C1001410871	บ้านบือเระ	1	บาเระใต้	บาเจาะ	นราธิวาส	5832N001	797063	722989	1	1	1	5.00	72.00	72.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
872	09007C1001410872	บ้านตันหยง	4	บาเระใต้	บาเจาะ	นราธิวาส	5832N002	796386	723462	1	1	1	6.00	72.00	72.00	150	26,280				แล้วเสร็จ
873	09007C1001410873	บ้านออก	3	ตาชี	ยะหา	ยะลา												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
874	09007C1001410874	บ้านไร่	4	ตาชี	ยะหา	ยะลา												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก
875	09007C1001410875	บ้านบาโด	3	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา	5832N005	751456	727856	1	1	1	5.00	75.00	75.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
876	09007C1001410876	บ้านบ่อเจ็ดลูก	6	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา	5832N004	749271	728343	1	1	1	8.00	75.00	75.00	150	35,040				แล้วเสร็จ
877	09007C1001410877	บ้านเกาะหม้อแกง	6	ท่ากำชำ	หนองจิก	ปัตตานี												1	ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่		ยกเลิก

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หมายเลขบ่อ	พิกัด E-W	พิกัด N-S	เจาะบ่อ	ติดตั้ง	ก่อสร้างระบบ	ปริมาณน้ำ	ความลึก (เมตร)		ครัวเรือน	ปริมาณน้ำ	ไม่บรรลุ	เหตุผลความจำเป็น	เหตุผลที่ปรับแผน	หมายเหตุ
										บ่อ	เครื่องสูบน้ำ	ประปาบาดาล	ลบ.ม./ชม.	ความลึกเจาะ	ความลึกพัฒนา	รับประโยชน์	ลบ.ม./ปี	วัตถุประสงค์			
878	09007C1001410878	กองพลพหารราบที่15 บ้านบ่อทอง		บ่อทอง	หนองจิก	ปัตตานี	5912D036	737398	750071	1	1	1	7.00	90.00	90.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
879	09007C1001410879	บ้านบางมวง	3	ฝาละมี	ปากพะยูน	พัทลุง	5812A028	640770	815636	1	1	1	5.00	58.00	58.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
880	09007C1001410880	บ้านสวน	6	มะกอกเหนือ	ควนขนุน	พัทลุง	5812A027	616002	855535	1	1	1	7.00	90.00	52.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
881	09007C1001410881	บ้านทะเลน้อย	13	พนางตุง	ควนขนุน	พัทลุง	5812A029	623698	859654	1	1	1	5.00	60.00	60.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
882	09007C1001410882	บ้านตีนนา	1	เขามีเกียรติ	สะเดา	สงขลา	5812B031	664475	752485	1	1	1	7.00	65.00	65.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
883	09007C1001410883	บ้านหาร	4	บ้านหาร	บางกล่ำ	สงขลา	5812B030	660284	782182	1	1	1	7.00	72.00	72.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
884	09007C1001410884	บ้านคู	1	บ้านหาร	บางกล่ำ	สงขลา	5812B029	661632	782207	1	1	1	7.00	52.00	52.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
885	09007C1001410885	บ้านเลียบ	1	ท่าช้าง	บางกล่ำ	สงขลา	5812B028	658778	784805	1	1	1	7.00	80.00	80.00	150	30,660				แล้วเสร็จ
886	09007C1001410886	บ้านปากช่อง	1	ชะแล้	สิงหนคร	สงขลา	5812C023	660557	807353	1	1	1	4.00	87.00	87.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
887	09007C1001410887	บ้านท่าหิน	6	ท่าหิน	สทิงพระ	สงขลา	5812C024	657059	817702	1	1	1	4.00	96.00	96.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
888	09007C1001410888	บ้านพรวน	8	ท่าหิน	สทิงพระ	สงขลา	5812C025	656424	820245	1	1	1	4.00	96.00	96.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
889	09007C1001410889	บ้านโต๊ะล๊ะ	1	ควนสตอ	ควนโดน	สตูล	5912D020	620795	743750	1	1	1	4.00	74.00	74.00	150	17,520				แล้วเสร็จ
890	09007C1001410890	บ้านบ่อเจ็ดลูก	1	ปากน้ำ	ละงู	สตูล	5912D019	576790	761224	1	1	1	5.00	22.00	22.00	150	21,900				แล้วเสร็จ
891	09007C1001410891	บ้านหนองยูง	8	น้ำผุด	ละงู	สตูล												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
892	09007C1001410892	บ้านทุ่งทะนาน	3	ทุ่งบุหลัง	ทุ่งหว้า	สตูล												1	ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล		ยกเลิก
										800	800	800				120,000.00	24,224,422.20				

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
